

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	20 feb '23							27 feb '23							06 mar '23					
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1		1 Elaboración del reporte de contexto institucional	55 días	lun 27/02/23	vie 19/05/23																					
2		1.1 Elaborar ficha de validación	5 días	lun 27/02/23	vie 03/03/23	3;21																				
3		1.2 Validar instrumentos	10 días	lun 06/03/23	vie 17/03/23	4																				
4		1.3 Ajustar instrumentos	5 días	lun 20/03/23	vie 24/03/23	5																				
5		1.4 Aplicar instrumentos	10 días	lun 27/03/23	vie 14/04/23	6																				
6		1.5 Analizar la información	15 días	lun 17/04/23	vie 05/05/23	7																				
7		1.6 Elaborar reporte (borrador)	15 días	lun 08/05/23	vie 26/05/23	8																				
8		1.7 Revisar reporte	5 días	lun 29/05/23	vie 02/06/23	10;11;22;23;24																				
9		1.8 Publicación de reporte	0 días	lun 05/06/23	lun 05/06/23																					
10		1.9 Presentar reporte a la comunidad educativa.	10 días	lun 05/06/23	vie 16/06/23	37																				
11		1.10 Incluir como capítulo del documento del PEI	5 días	lun 05/06/23	vie 09/06/23	87;86																				
12		2 Diseño y elaboración del organigrama del proyecto de actualización del PEI	27 días	lun 27/02/23	mar 11/04/23																					
13		2.1 Definir las características, número y tamaño de los equipos de trabajo.	10 días	lun 27/02/23	vie 10/03/23	15																				
14		2.2 Definir las funciones de cada equipo.	10 días	lun 27/02/23	vie 10/03/23	15																				
15		2.3 Socializar las funciones de los equipos con la comunidad educativa.	5 días	lun 13/03/23	vie 17/03/23	16																				
16		2.4 Conformar equipos	10 días	lun 20/03/23	vie 31/03/23	17																				
17		2.5 Elaborar organigrama	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	19																				
18		2.6 Publicación del organigrama del Proyecto PEI	0 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23																					
19		2.7 Socializar con la comunidad	1 día	mar 11/04/23	mar 11/04/23	36																				
20		3 Reestructuración del capítulo de principios y fundamentos del PEI	86 días	lun 06/03/23	lun 24/07/23																					
21		3.1 Elaborar reseña histórica	10 días	lun 06/03/23	vie 17/03/23																					






















Proyecto: PROYECTO PEI
Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	20 feb '23							27 feb '23							06 mar '23						
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	
22		3.2 Complementar la identidad institucional	20 días	lun 05/06/23	vie 14/07/23	29																					
23		3.3 Revisar y replantear la misión y visión del IBTI	20 días	lun 05/06/23	vie 14/07/23	29																					
24		3.4 Revisar y complementar la filosofía y principios institucionales	20 días	lun 05/06/23	vie 14/07/23	29																					
25		3.5 Incluir los aspectos fundamentales de la política de calidad y sus objetivos	20 días	lun 05/06/23	vie 14/07/23	29																					
26		3.6 Definir el perfil del estudiante	20 días	lun 05/06/23	vie 14/07/23	29																					
27		3.7 Definir el perfil del docente y directivo docente del IBTI	20 días	lun 05/06/23	vie 14/07/23	29																					
28		3.8 Definir el perfil de las familias del IBTI	20 días	lun 05/06/23	vie 14/07/23	29																					
29		3.9 Recopilar información	5 días	lun 17/07/23	vie 21/07/23	30																					
30		3.10 Redactar capítulo	10 días	lun 24/07/23	vie 04/08/23	33;34																					
31		3.11 <i>Publicar informe de avances</i>	0 días	vie 04/08/23	vie 04/08/23																						
32		4 Definición de los objetivos generales y específicos del PEI.	5 días	lun 07/08/23	vie 11/08/23																						
33		4.1 Formular el objetivo general del PEI	5 días	lun 07/08/23	vie 11/08/23																						
34		4.2 Formular los objetivos específicos del PEI	5 días	lun 07/08/23	vie 11/08/23	102																					
35		5 Elaboración del capítulo que contenga el enfoque y modelo pedagógico del IBTI	80 días	lun 27/02/23	vie 23/06/23																						
36		5.1 Gestionar capacitación sobre enfoques y modelos pedagógicos.	48 días	mié 12/04/23	vie 16/06/23	37;38																					
37		5.2 Realizar capacitaciones	5 días	lun 19/06/23	vie 23/06/23	39																					
38		5.3 Construir documento orientador para la presentación de propuestas de enfoque y modelo pedagógico	5 días	lun 19/06/23	vie 23/06/23	39																					
39		5.4 Realizar convocatoria abierta para presentar propuestas de enfoque y modelo pedagógico	10 días	lun 10/07/23	vie 21/07/23	40																					
40		5.5 Presentar propuestas	10 días	lun 24/07/23	vie 04/08/23	41																					

Proyecto: PROYECTO PEI
Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	20 feb '23							27 feb '23							06 mar '23										
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X					
62		7.2 Revisión del formato de proyecto pedagógico de área (DIB-FO-03)	5 días	lun 11/09/23	vie 15/09/23	63																									
63		7.3 Revisar proyectos pedagógicos por cada área	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23	64;65																									
64		7.4 Ajustar proyectos	20 días	lun 25/09/23	vie 27/10/23	66																									
65		7.5 Formular proyectos pedagógicos obligatorios según lo estipulado en el artículo 14 de la ley 115.	20 días	lun 25/09/23	vie 27/10/23	66;91;92																									
66		7.6 Socializar con la comunidad	5 días	lun 30/10/23	vie 03/11/23																										
67		<u>7.7 Publicar informe de avances</u>	0 días	vie 03/11/23	vie 03/11/23																										
68		8 Elaboración del capítulo que contiene el Manual de Convivencia Escolar y el reglamento docente	60 días	lun 04/09/23	vie 01/12/23																										
69		8.1 Diseñar documento orientador para la revisión y ajustes del Manual de Convivencia escolar.	5 días	lun 04/09/23	vie 08/09/23	70;72;82;83;84																									
70		8.2 Revisar el Manual de Convivencia Escolar	15 días	lun 11/09/23	vie 29/09/23	71;97																									
71		8.3 Recopilar información	5 días	lun 02/10/23	vie 06/10/23	73;79;80																									
72		8.4 Recopilar la información que estará contenida en el reglamento docente.	20 días	lun 11/09/23	vie 06/10/23	73;79;80																									
73		8.5 Organizar información	15 días	lun 16/10/23	vie 03/11/23	74;75																									
74		8.6 Presentar al consejo académico	5 días	lun 06/11/23	vie 10/11/23	76																									
75		8.7 Presentar al consejo de dirección	5 días	lun 06/11/23	vie 10/11/23	76;96																									
76		8.8 Socializar con la comunidad	15 días	lun 13/11/23	vie 01/12/23																										
77		<u>8.9 Publicar informe de avances</u>	0 días	lun 13/11/23	lun 13/11/23																										
78		9 Elaboración del organigrama del gobierno escolar.	15 días	lun 16/10/23	vie 03/11/23																										
79		9.1 Diseñar organigrama	15 días	lun 16/10/23	vie 03/11/23	106																									
80		9.2 Incluir en el documento PEI	15 días	lun 16/10/23	vie 03/11/23	106																									
81		10 Inclusión de los costos educativos en el documento PEI	15 días	lun 11/09/23	vie 29/09/23																										
82		10.1 Recopilar información	15 días	lun 11/09/23	vie 29/09/23	106																									

Proyecto: PROYECTO PEI
Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	20 feb '23							27 feb '23							06 mar '23				
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
83		10.2 Organizar información	15 días	lun 11/09/23	vie 29/09/23	106																			
84		10.3 Incluir en el documento	15 días	lun 11/09/23	vie 29/09/23	106																			
85		11 Elaboración del capítulo sobre recursos institucionales	6 días	lun 12/06/23	lun 19/06/23																				
86		11.1 Recopilar información sobre los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos	5 días	lun 12/06/23	vie 16/06/23	88																			
87		11.2 Organizar información	5 días	lun 12/06/23	vie 16/06/23	88																			
88		11.3 Redactar capítulo	1 día	lun 19/06/23	lun 19/06/23																				
89		12 Elaboración del capítulo que contenga la información sobre la relación de la comunidad con otras organizaciones y sus estrategias de articulación a expresiones locales o regionales	96 días	lun 05/06/23	lun 06/11/23																				
90		12.1 Recopilar información relacionada con el tipo de relaciones que ha tenido la institución con otras organizaciones	5 días	lun 05/06/23	vie 09/06/23	93																			
91		12.2 Recopilar información relacionada con las relaciones que debe tener la institución con otras organizaciones	5 días	lun 30/10/23	vie 03/11/23	93																			
92		12.3 Recopilar información sobre las estrategias de articulación del PEI con expresiones locales y regionales	5 días	lun 30/10/23	vie 03/11/23	93																			
93		12.4 Redactar capítulo	1 día	lun 06/11/23	lun 06/11/23	106																			
94		12.5 Socializar avances con la comunidad educativa																							
95		13 Elaboración del capítulo que contenga la información sobre la organización administrativa y evaluación de la gestión	16 días	lun 13/11/23	lun 04/12/23																				
96		13.1 Obtener información sobre la organización administrativa y organigrama institucional	5 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23	97																			
97		13.2 Revisar los procedimientos que hacen parte del proceso misional docencia IBTI (documentos DIB-PC-01 (admisión y matrícula de estudiantes nuevos), DIB-PC-02 (diseño educativo) y DIB-PC-03 (seguimiento y	5 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23	98																			


Proyecto: PROYECTO PEI
Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	20 feb '23							27 feb '23							06 mar '23												
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							
98		13.3 Realizar ajustes de acuerdo con los objetivos planteados en el PEI	5 días	lun 27/11/23	vie 01/12/23	99																											
99		13.4 Organizar información del capítulo	1 día	lun 04/12/23	lun 04/12/23	106																											
100		13.5 Publicar avances	0 días	lun 04/12/23	lun 04/12/23																												
101		14 Elaboración del capítulo que contenga la información sobre la organización administrativa y evaluación de la gestión	20 días	lun 14/08/23	vie 08/09/23																												
102		14.1 Organizar información relacionada con los programas que operan actualmente	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23	103;104																											
103		14.2 Formular los programas orientados a padres y madres de familia del IBTI en función de los objetivos del PEI	15 días	lun 21/08/23	vie 08/09/23	106																											
104		14.3 Formular el programa permanente de formación docente	15 días	lun 21/08/23	vie 08/09/23	106																											
105		15 Organización y publicación del documento final del PEI	48 días	mar 05/12/23	jue 14/03/24																												
106		15.1 Organizar información	20 días	mar 05/12/23	lun 05/02/24	107																											
107		15.2 Revisar por parte del área jurídica	15 días	mar 06/02/24	lun 26/02/24	108																											
108		15.3 Presentar al consejo académico	5 días	mar 27/02/24	lun 04/03/24	109																											
109		15.4 Presentar al consejo de dirección	5 días	mar 05/03/24	lun 11/03/24	110																											
110		15.5 Aprobación y publicación	3 días	mar 12/03/24	jue 14/03/24																												

Proyecto: PROYECTO PEI
Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		Tarea manual		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Tareas externas			

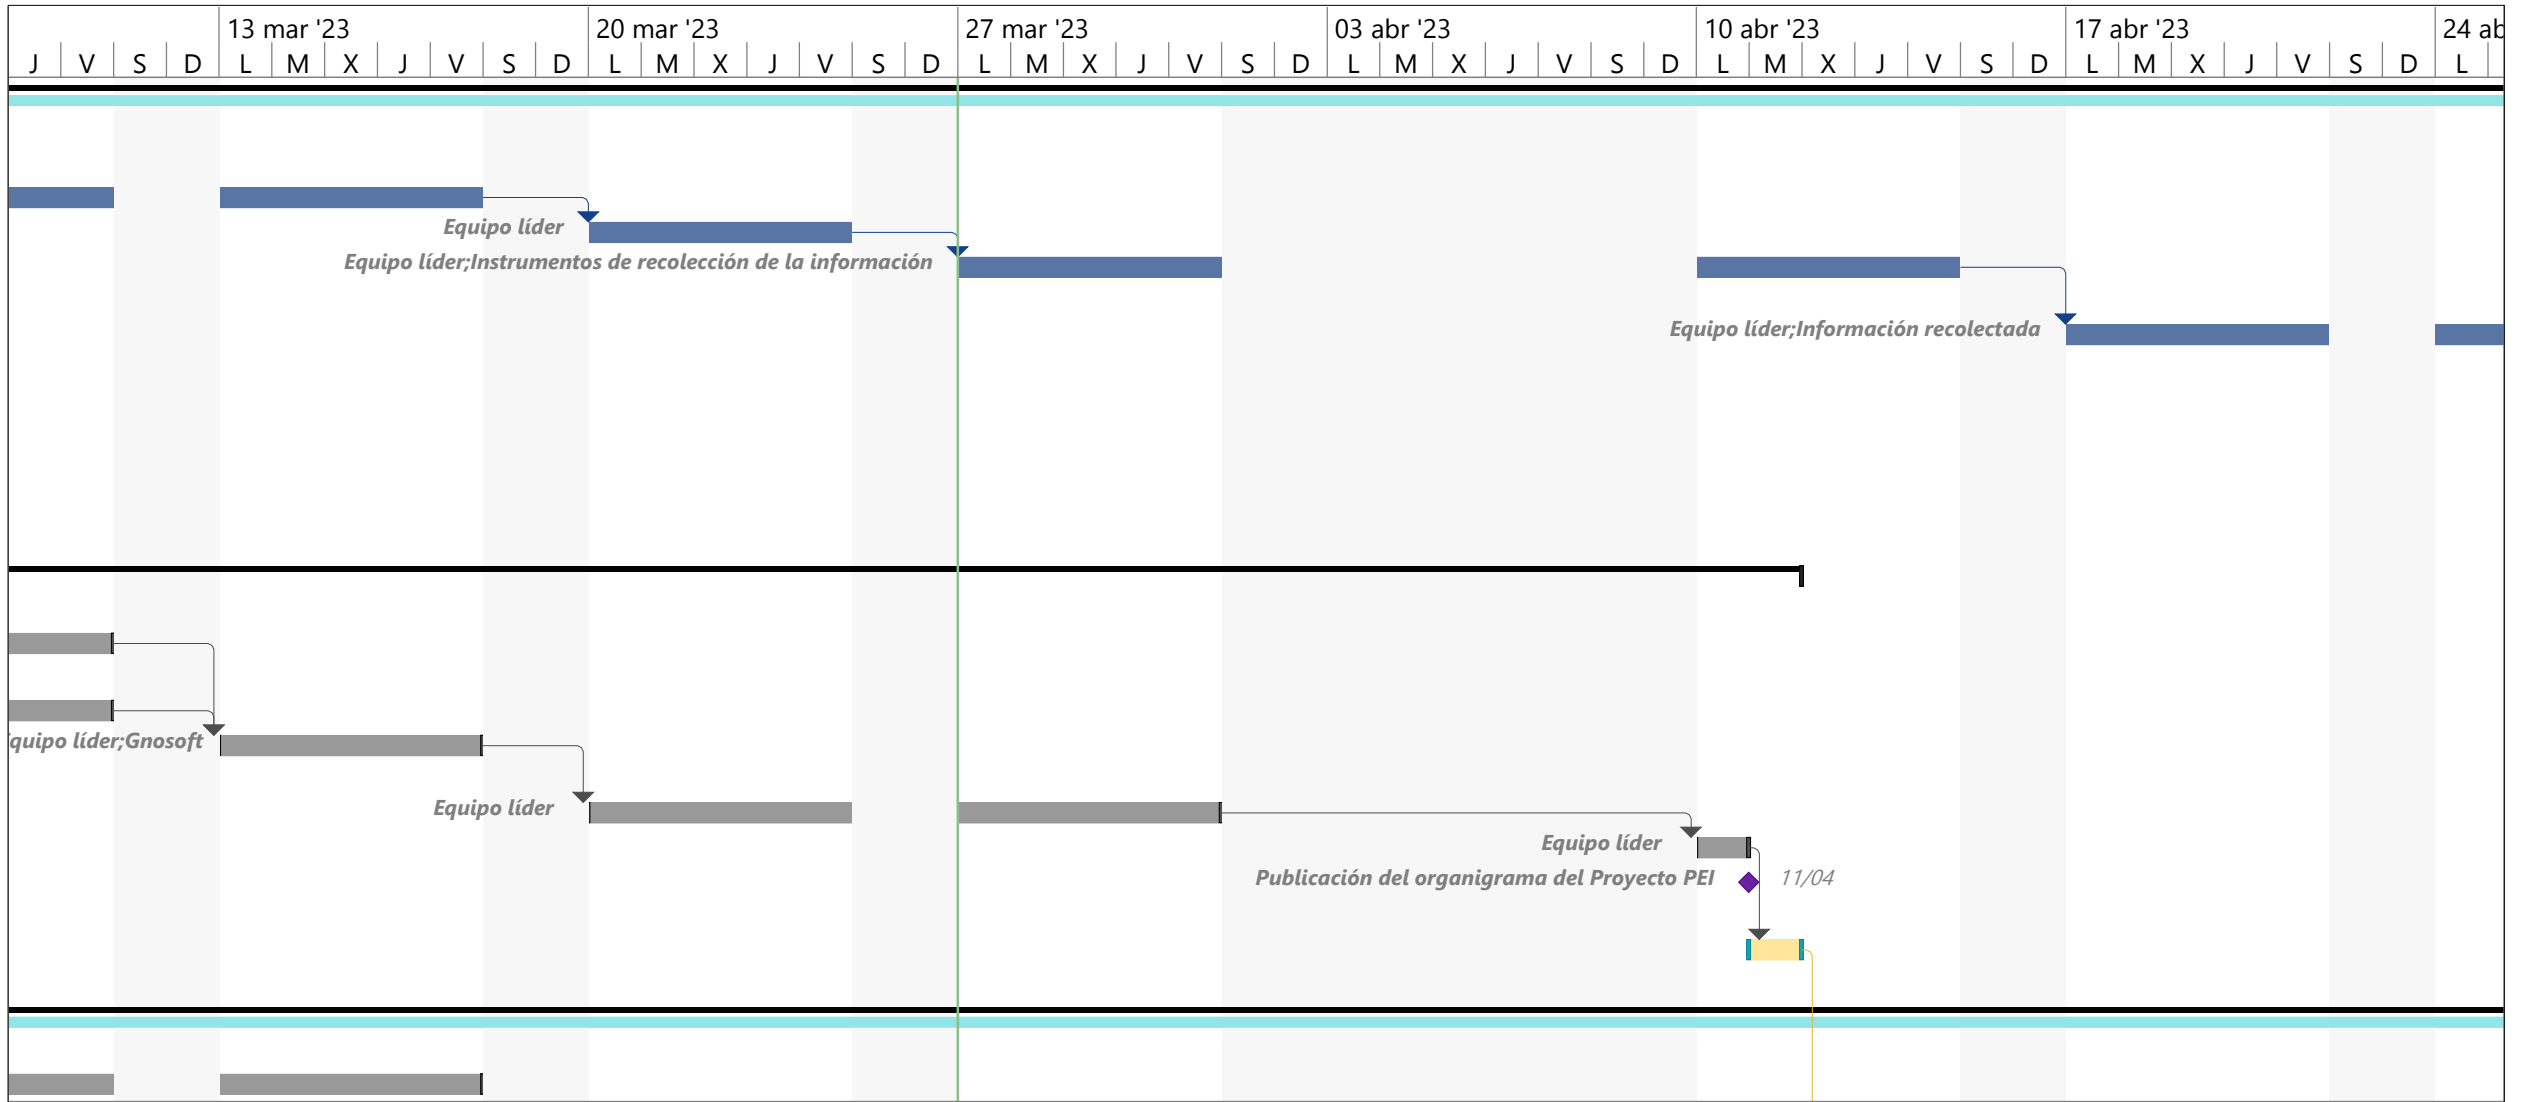

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			






















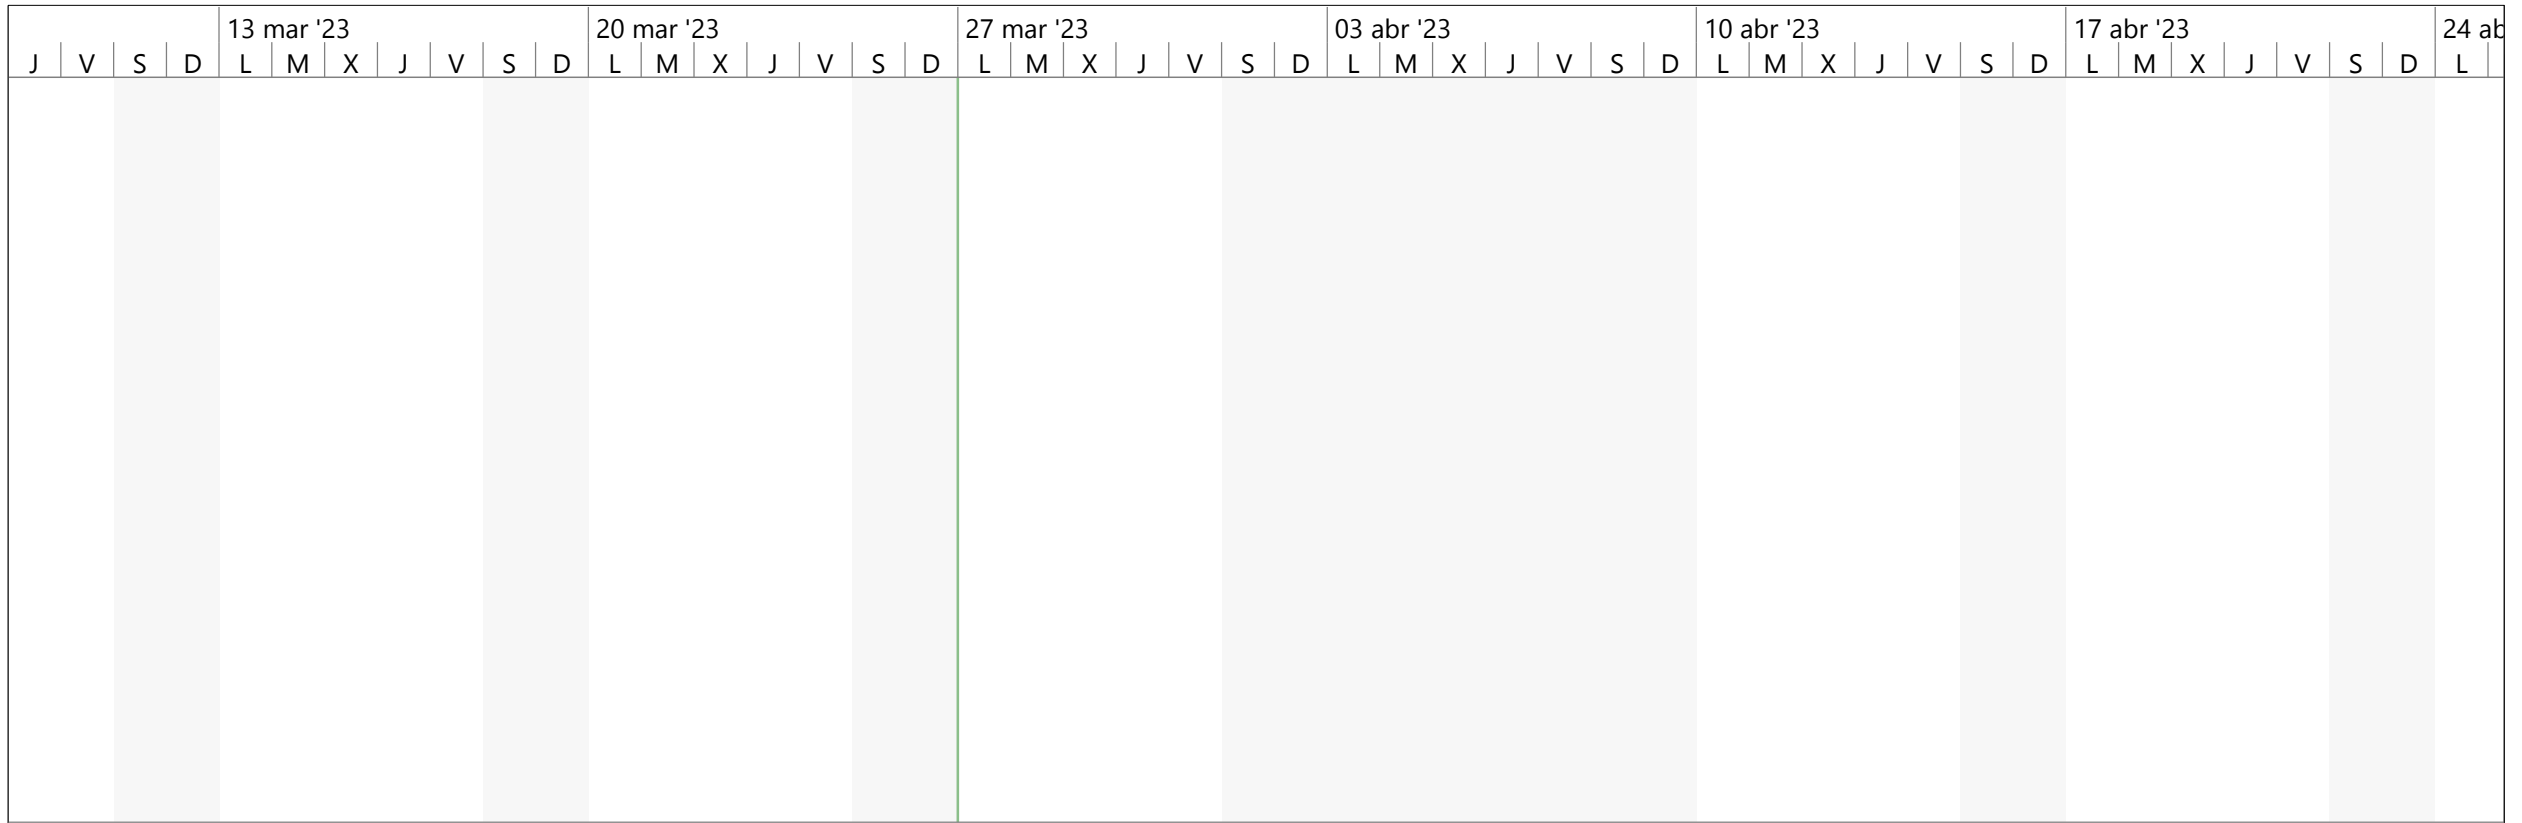
Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

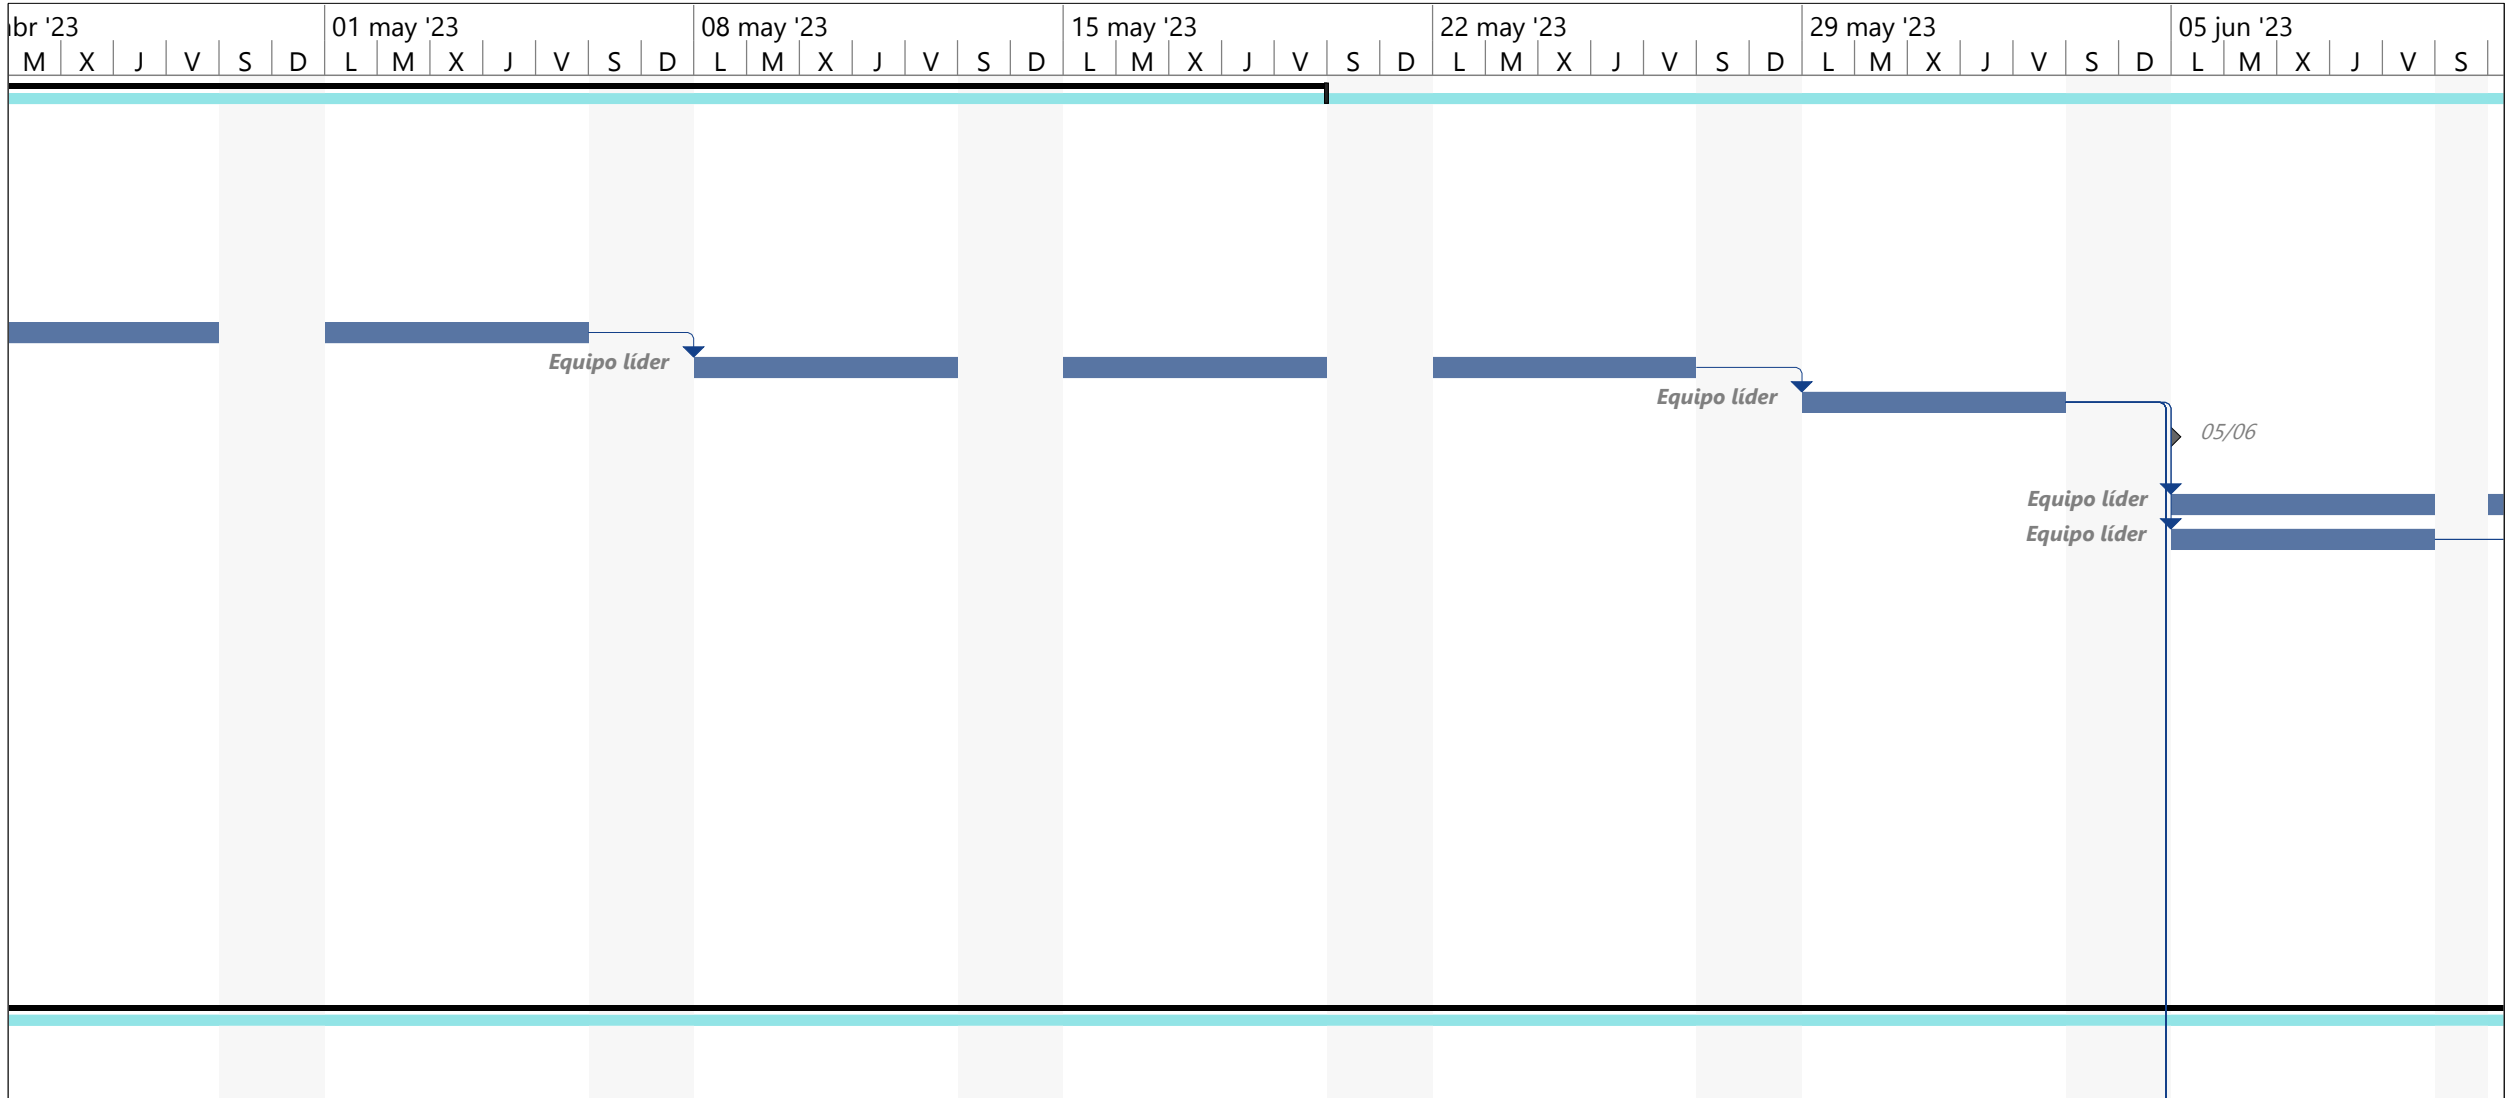


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

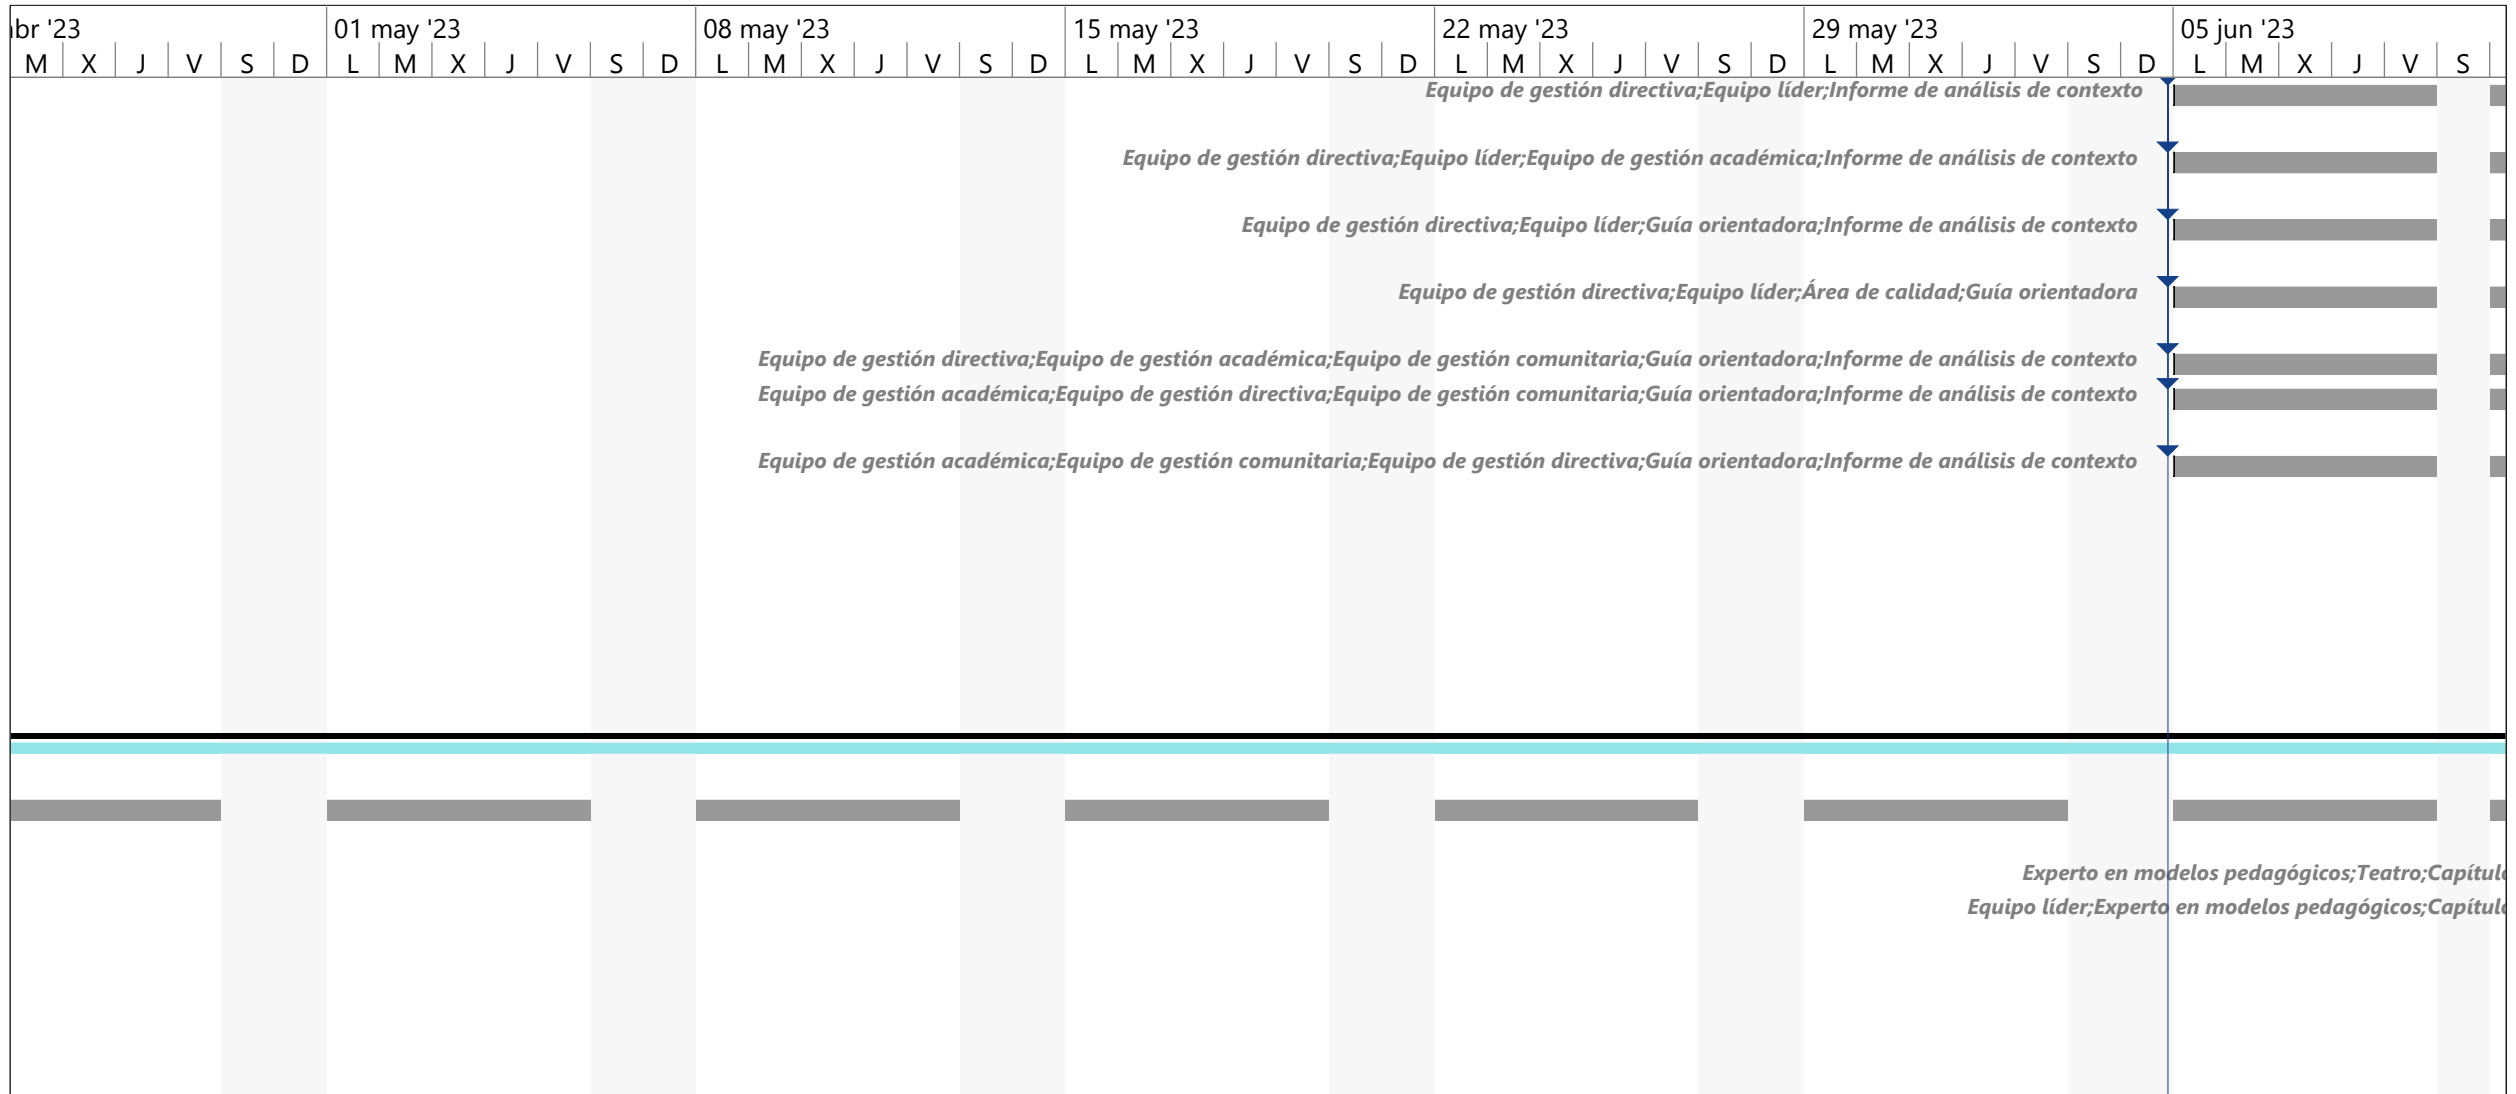


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

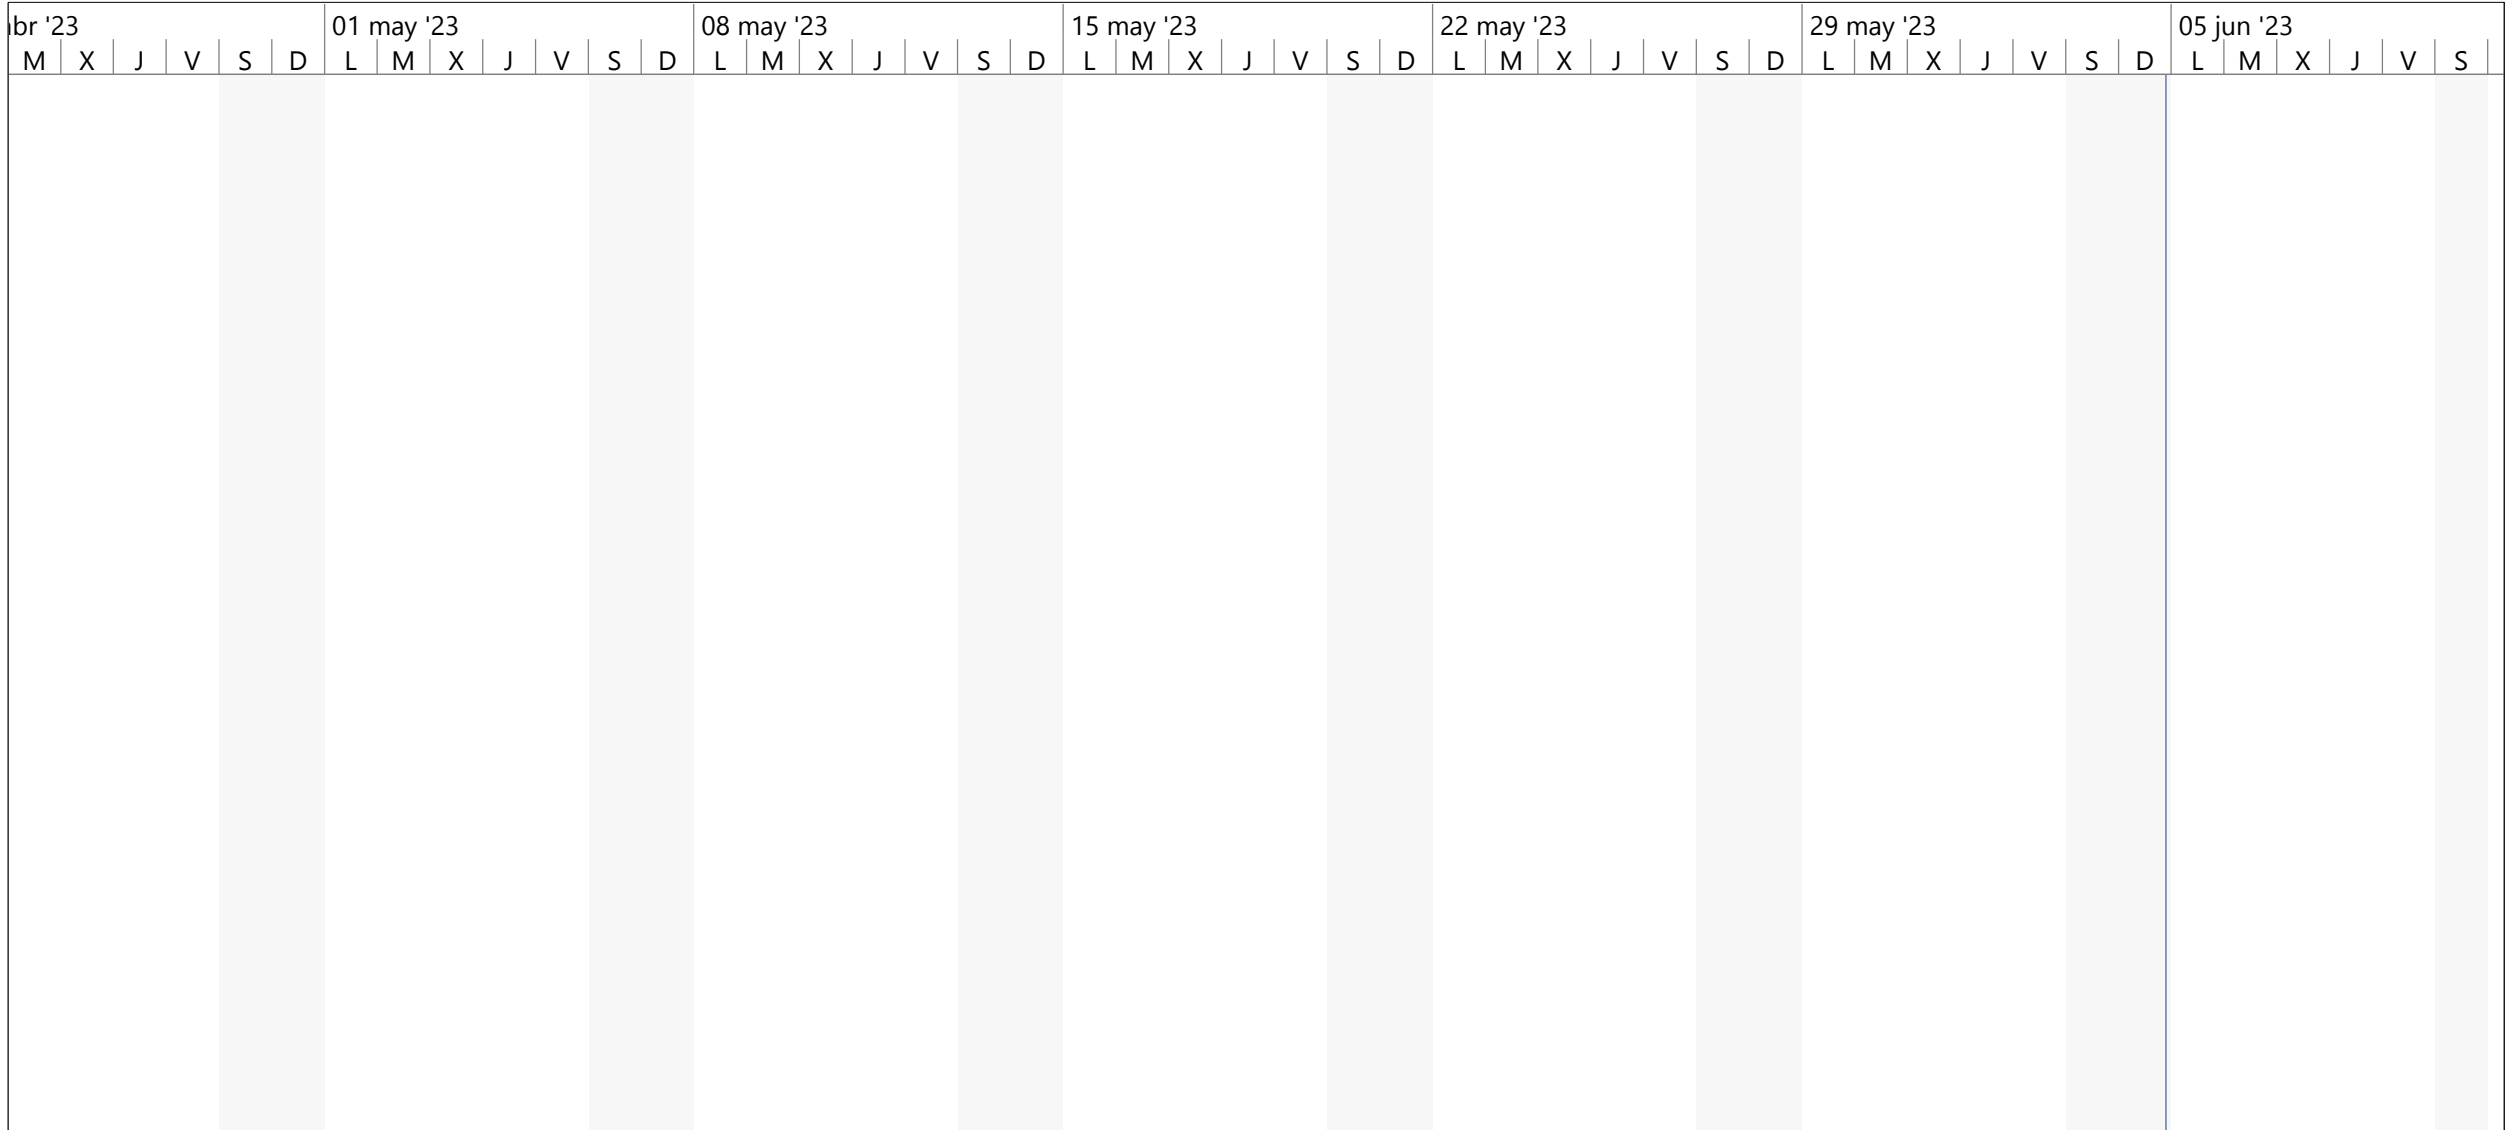


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

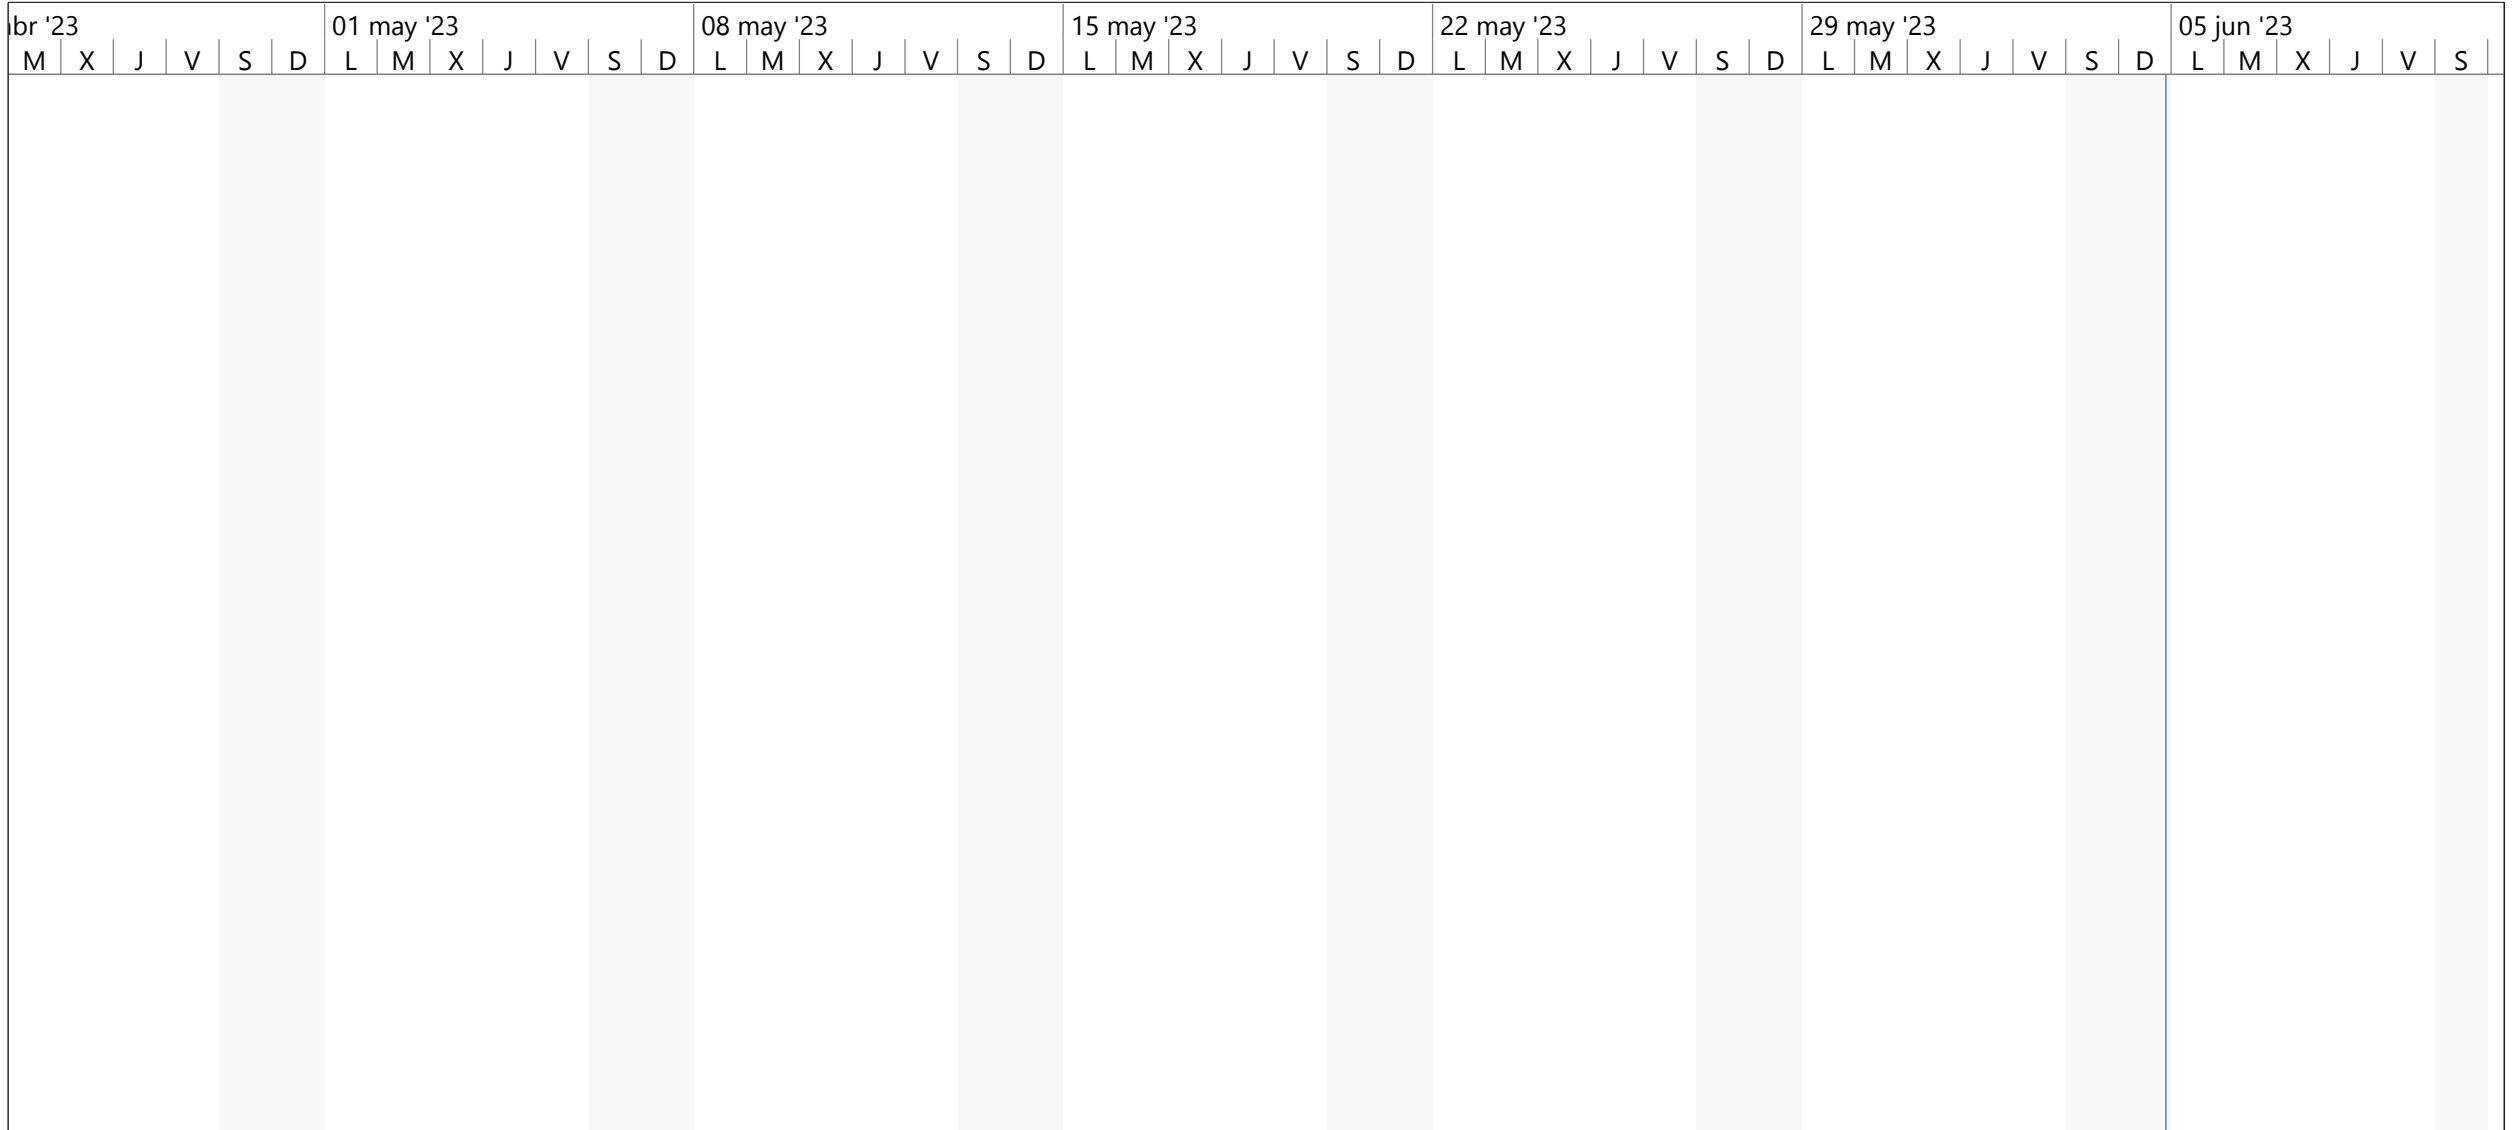


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

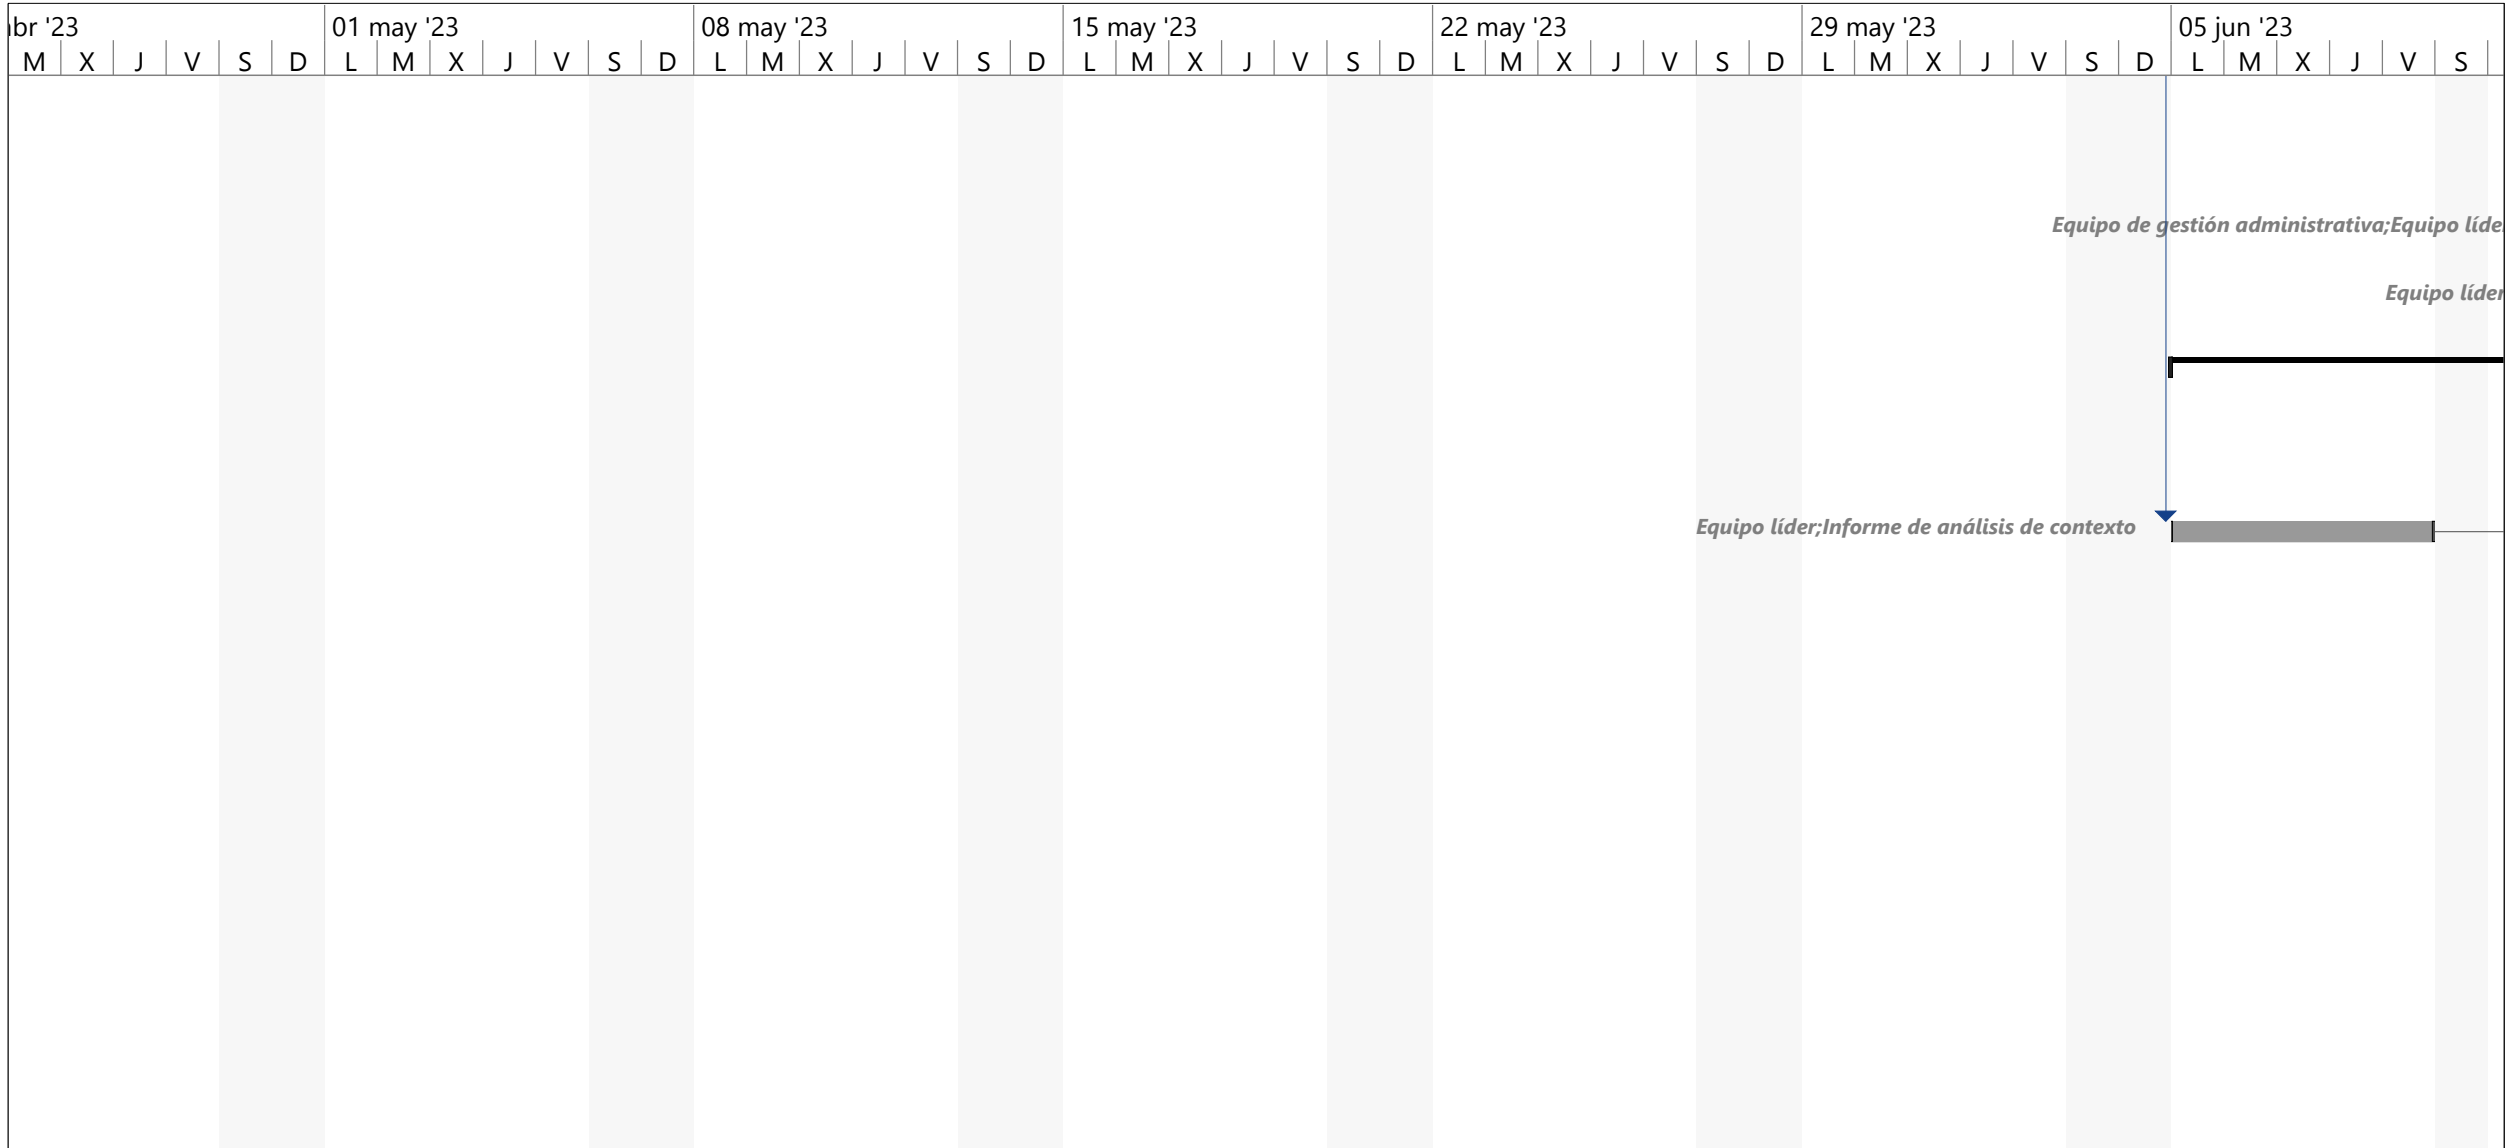


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

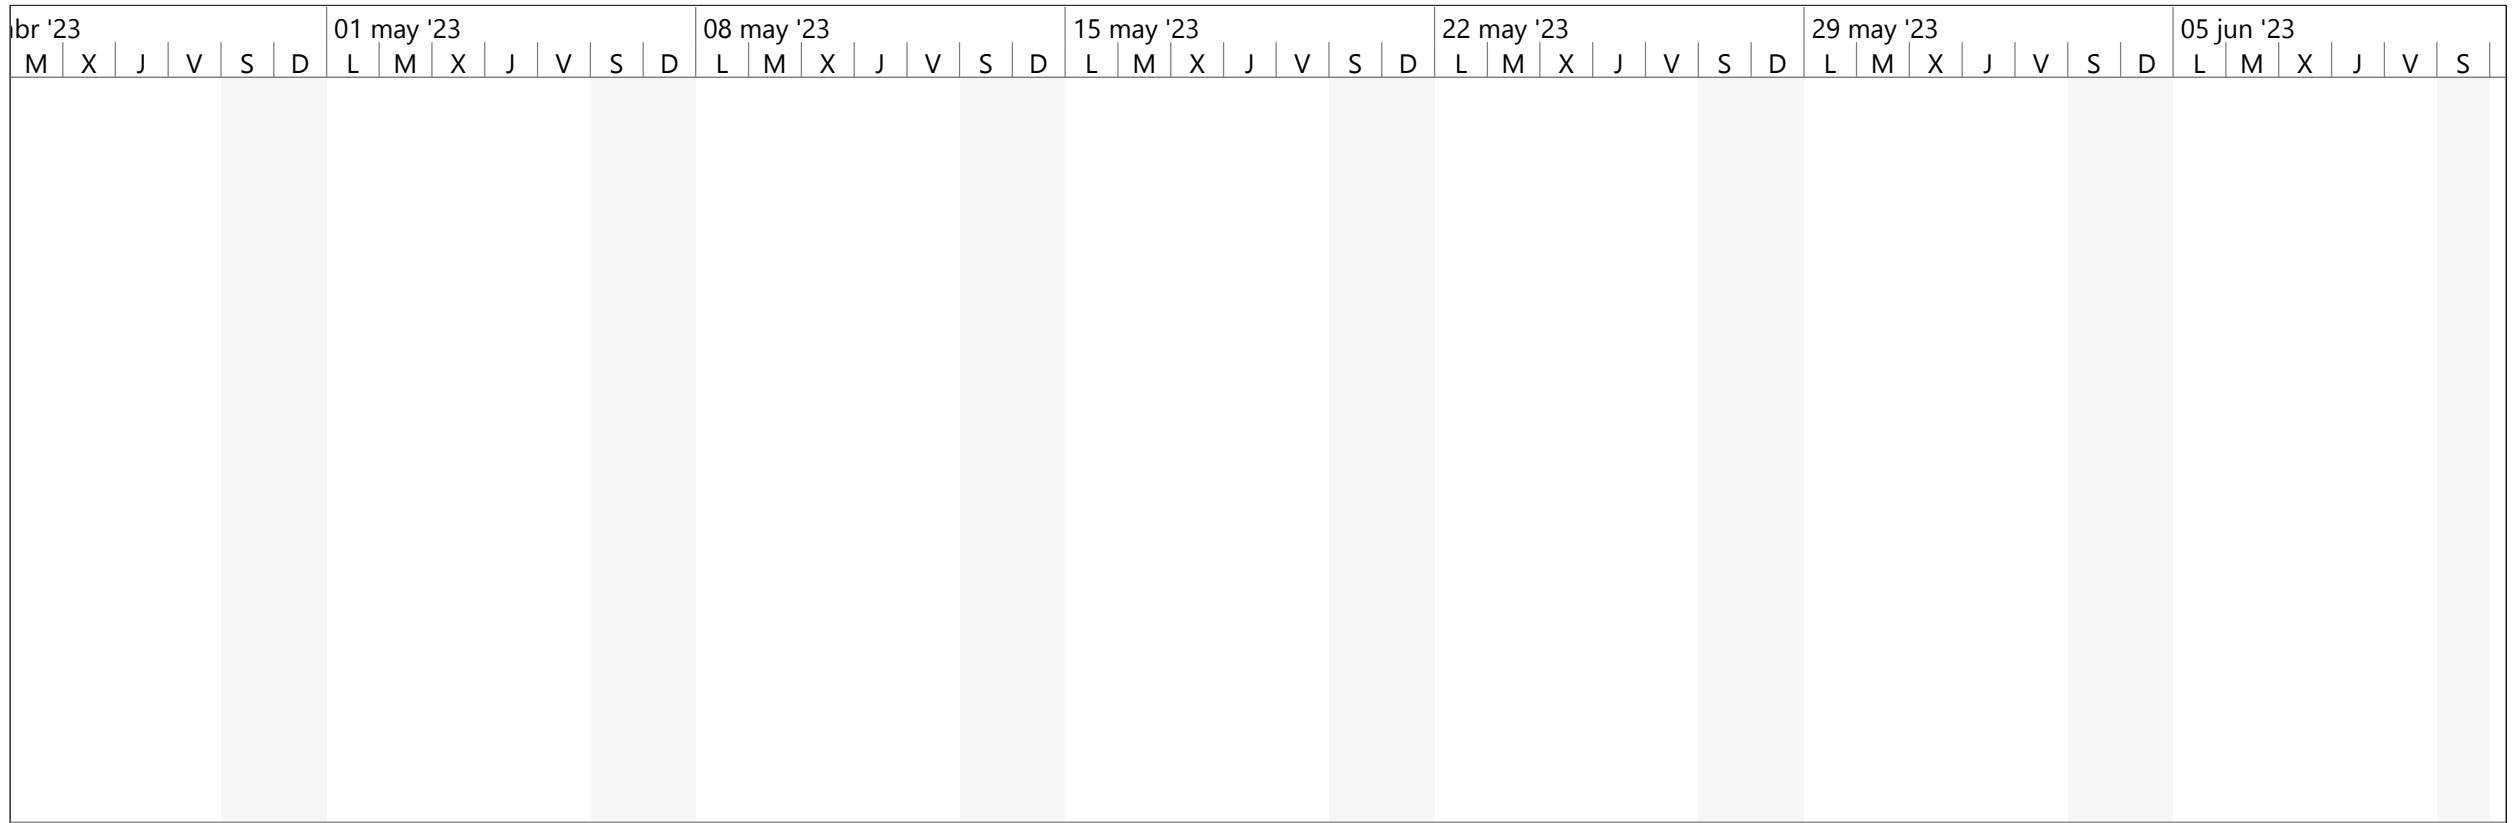


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

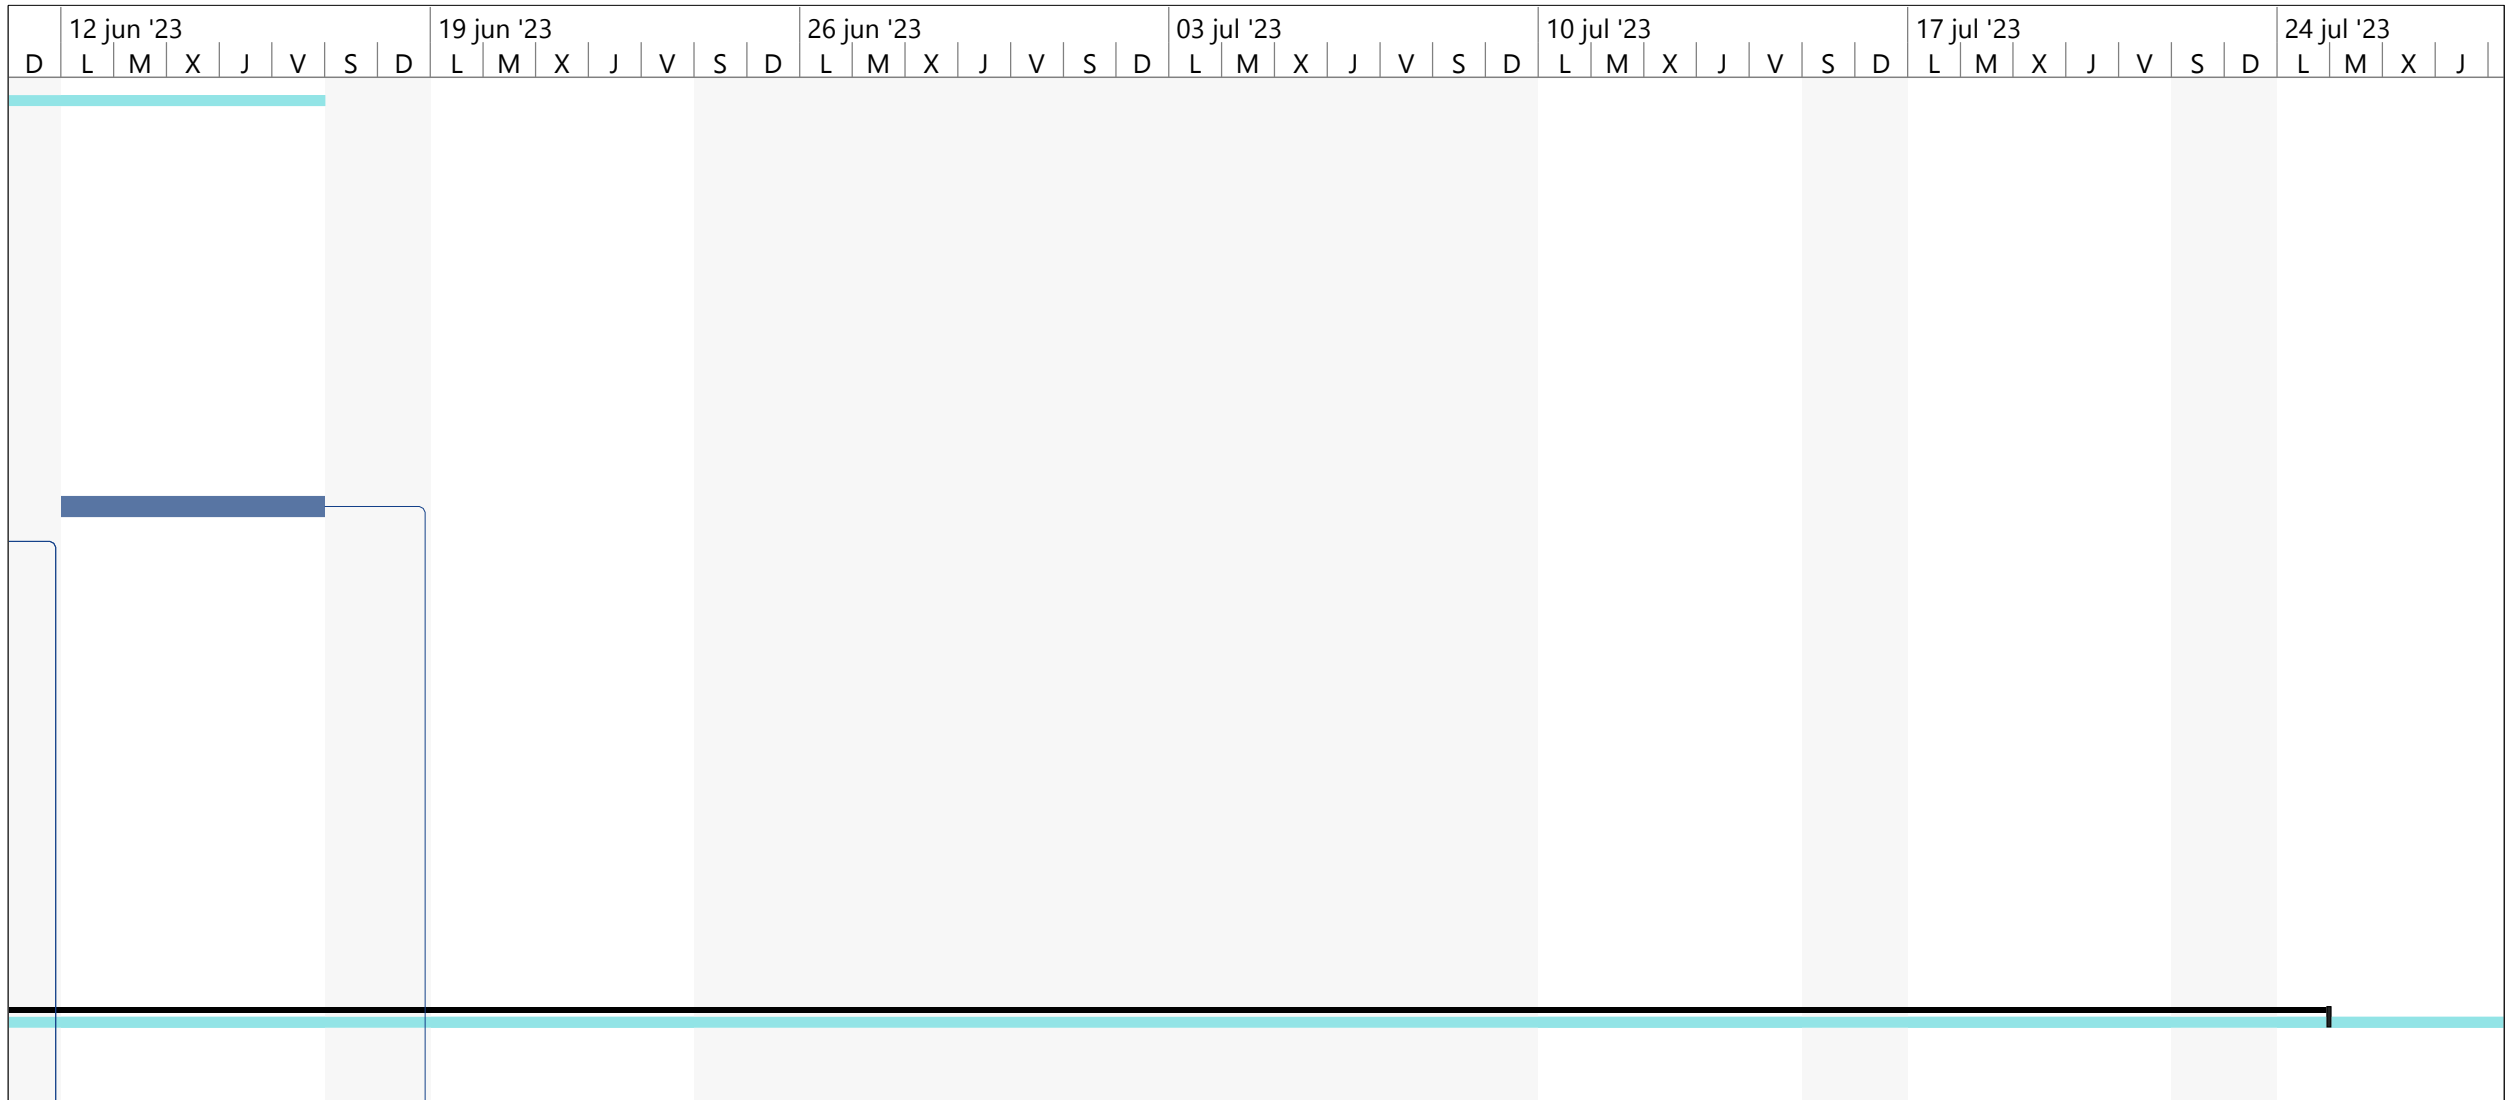


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

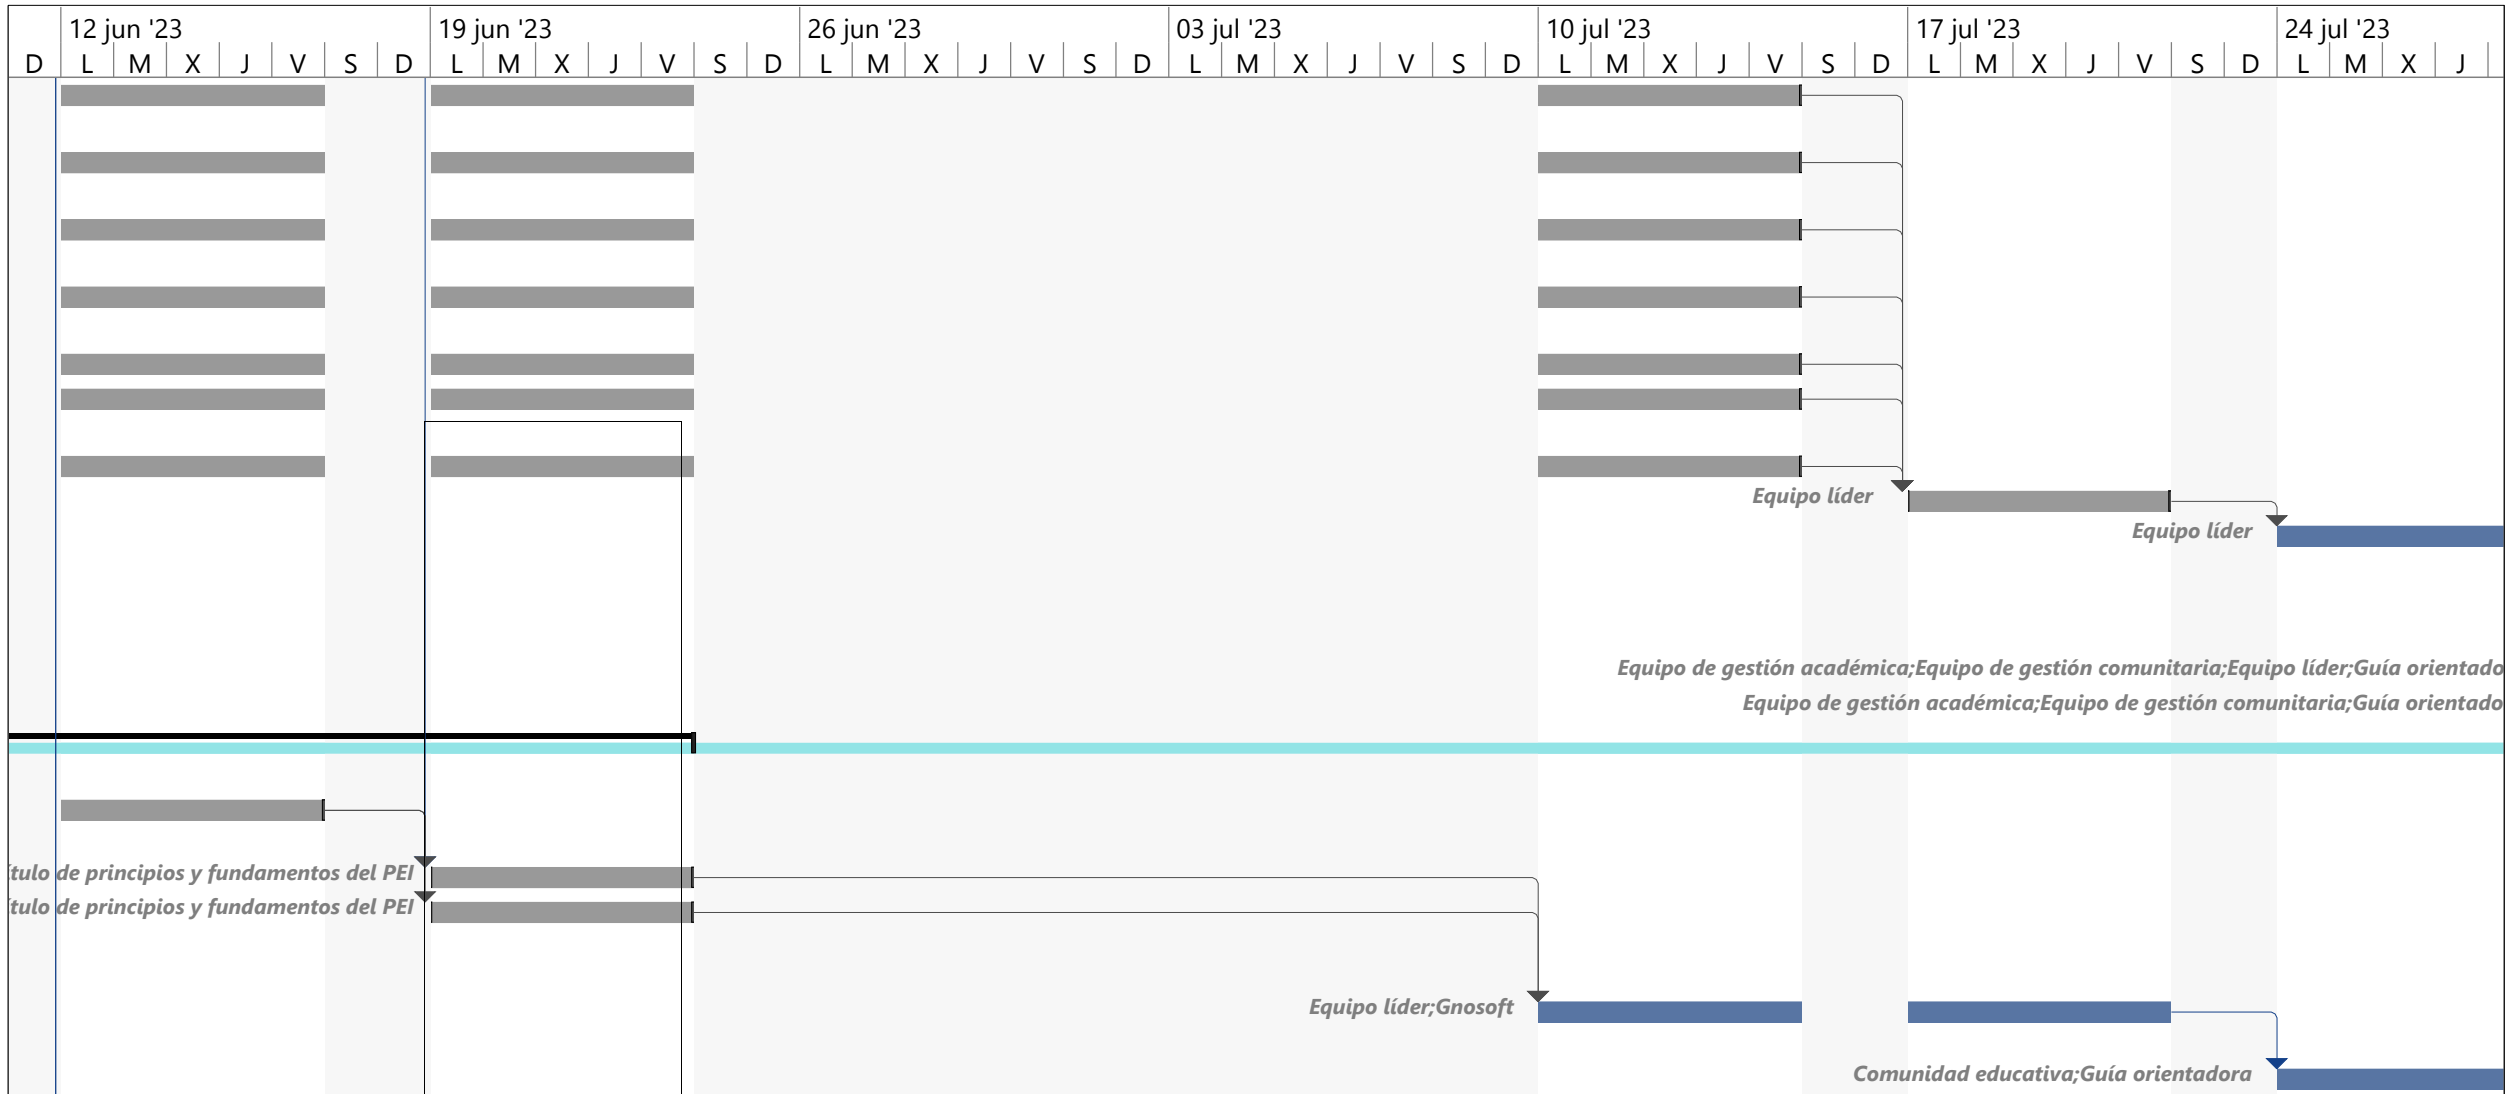

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23


Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

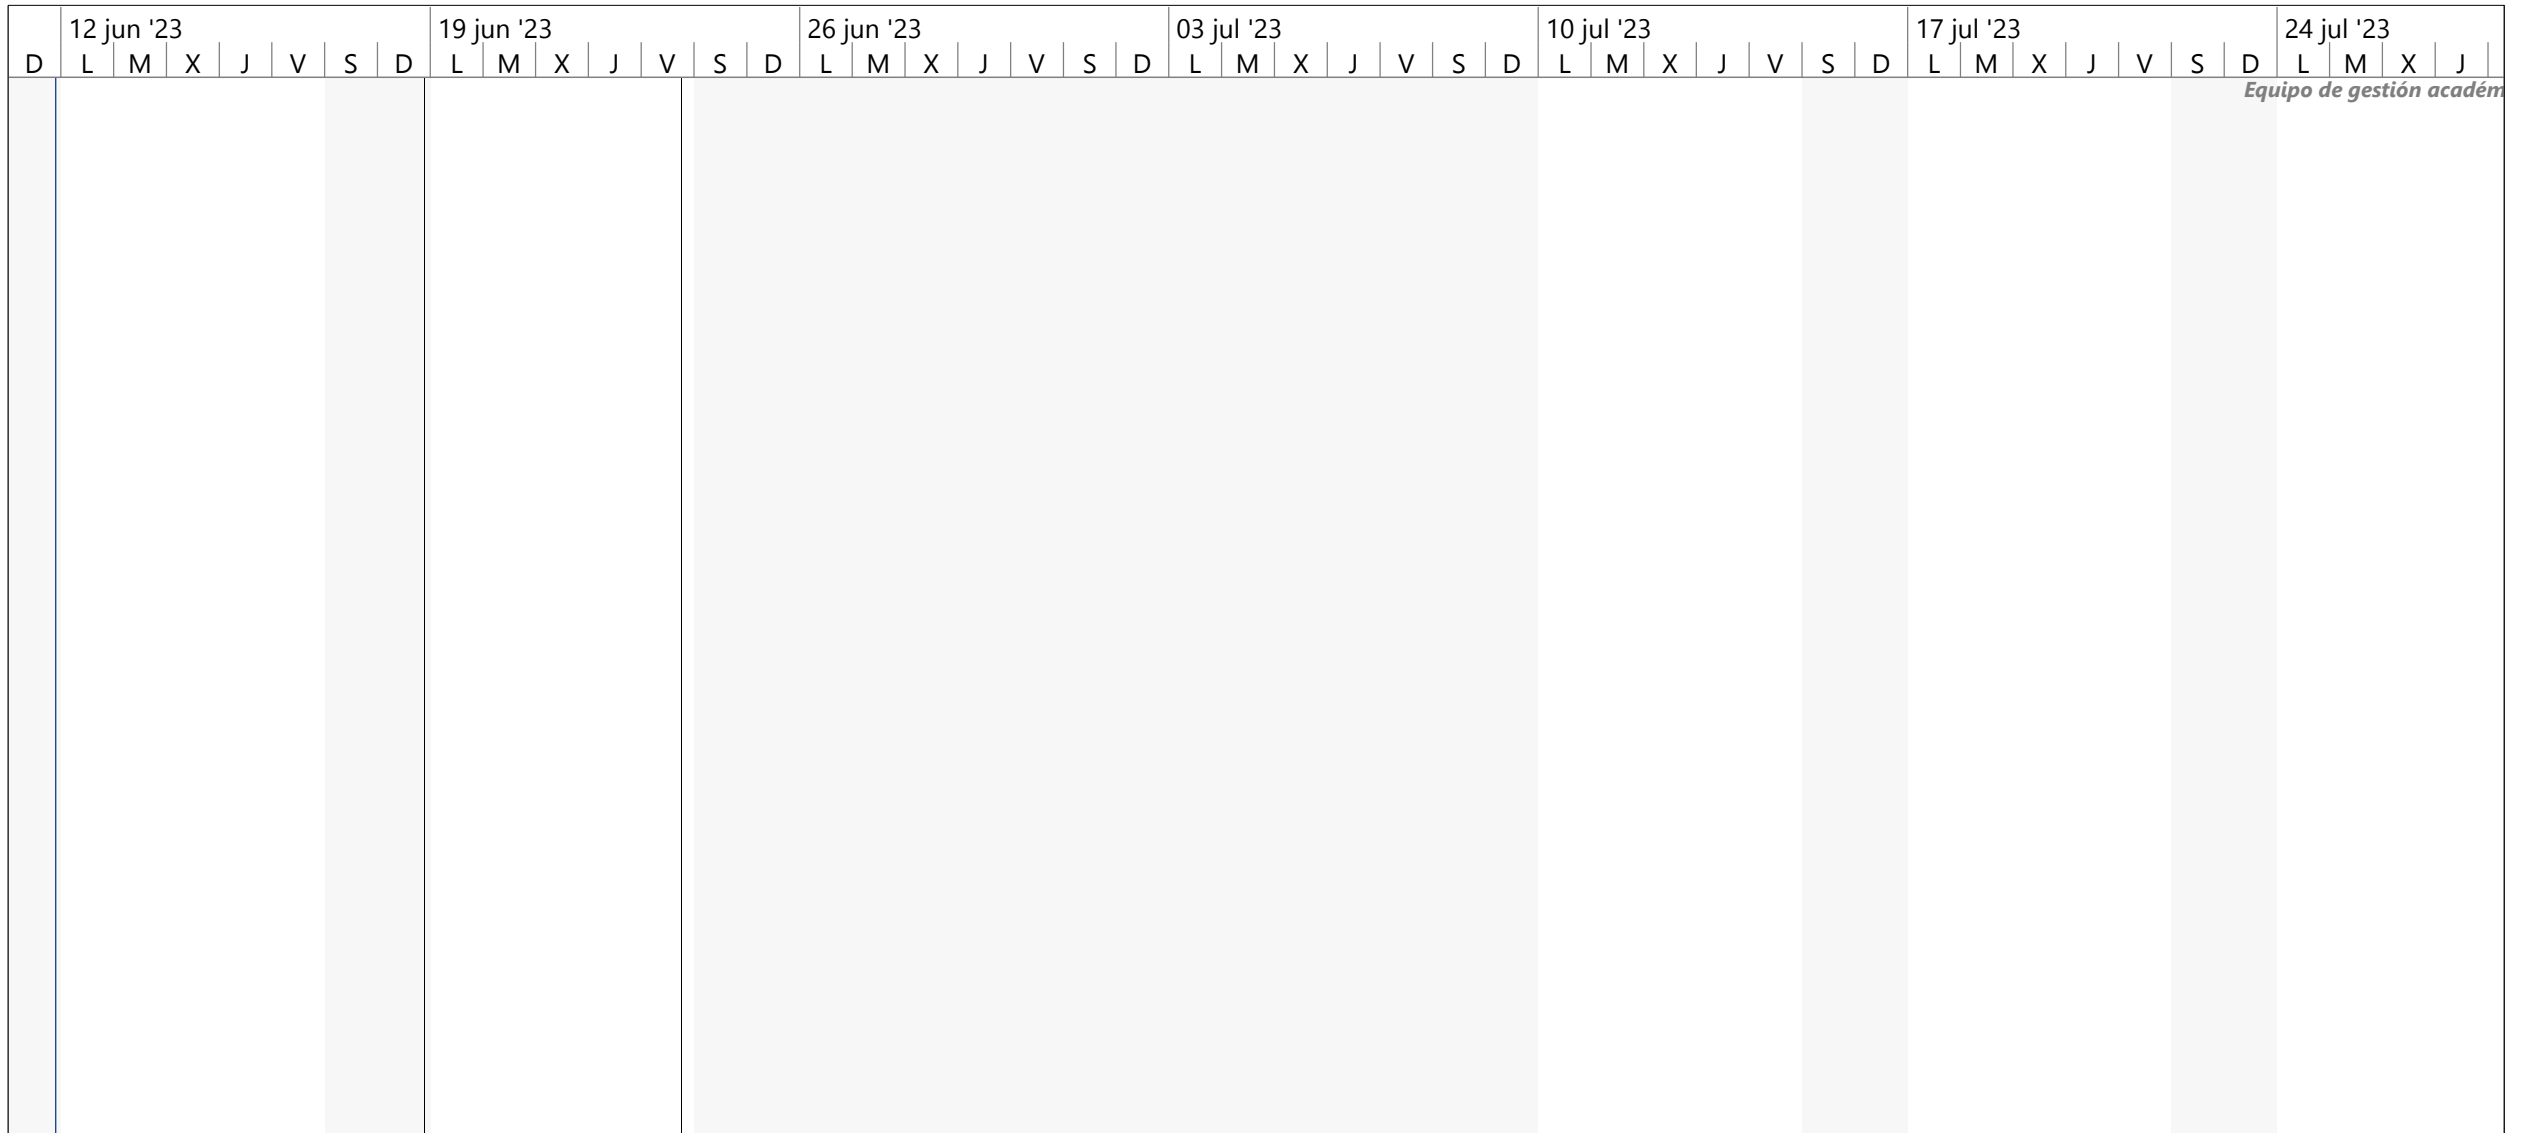

Equipo de gestión académ


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

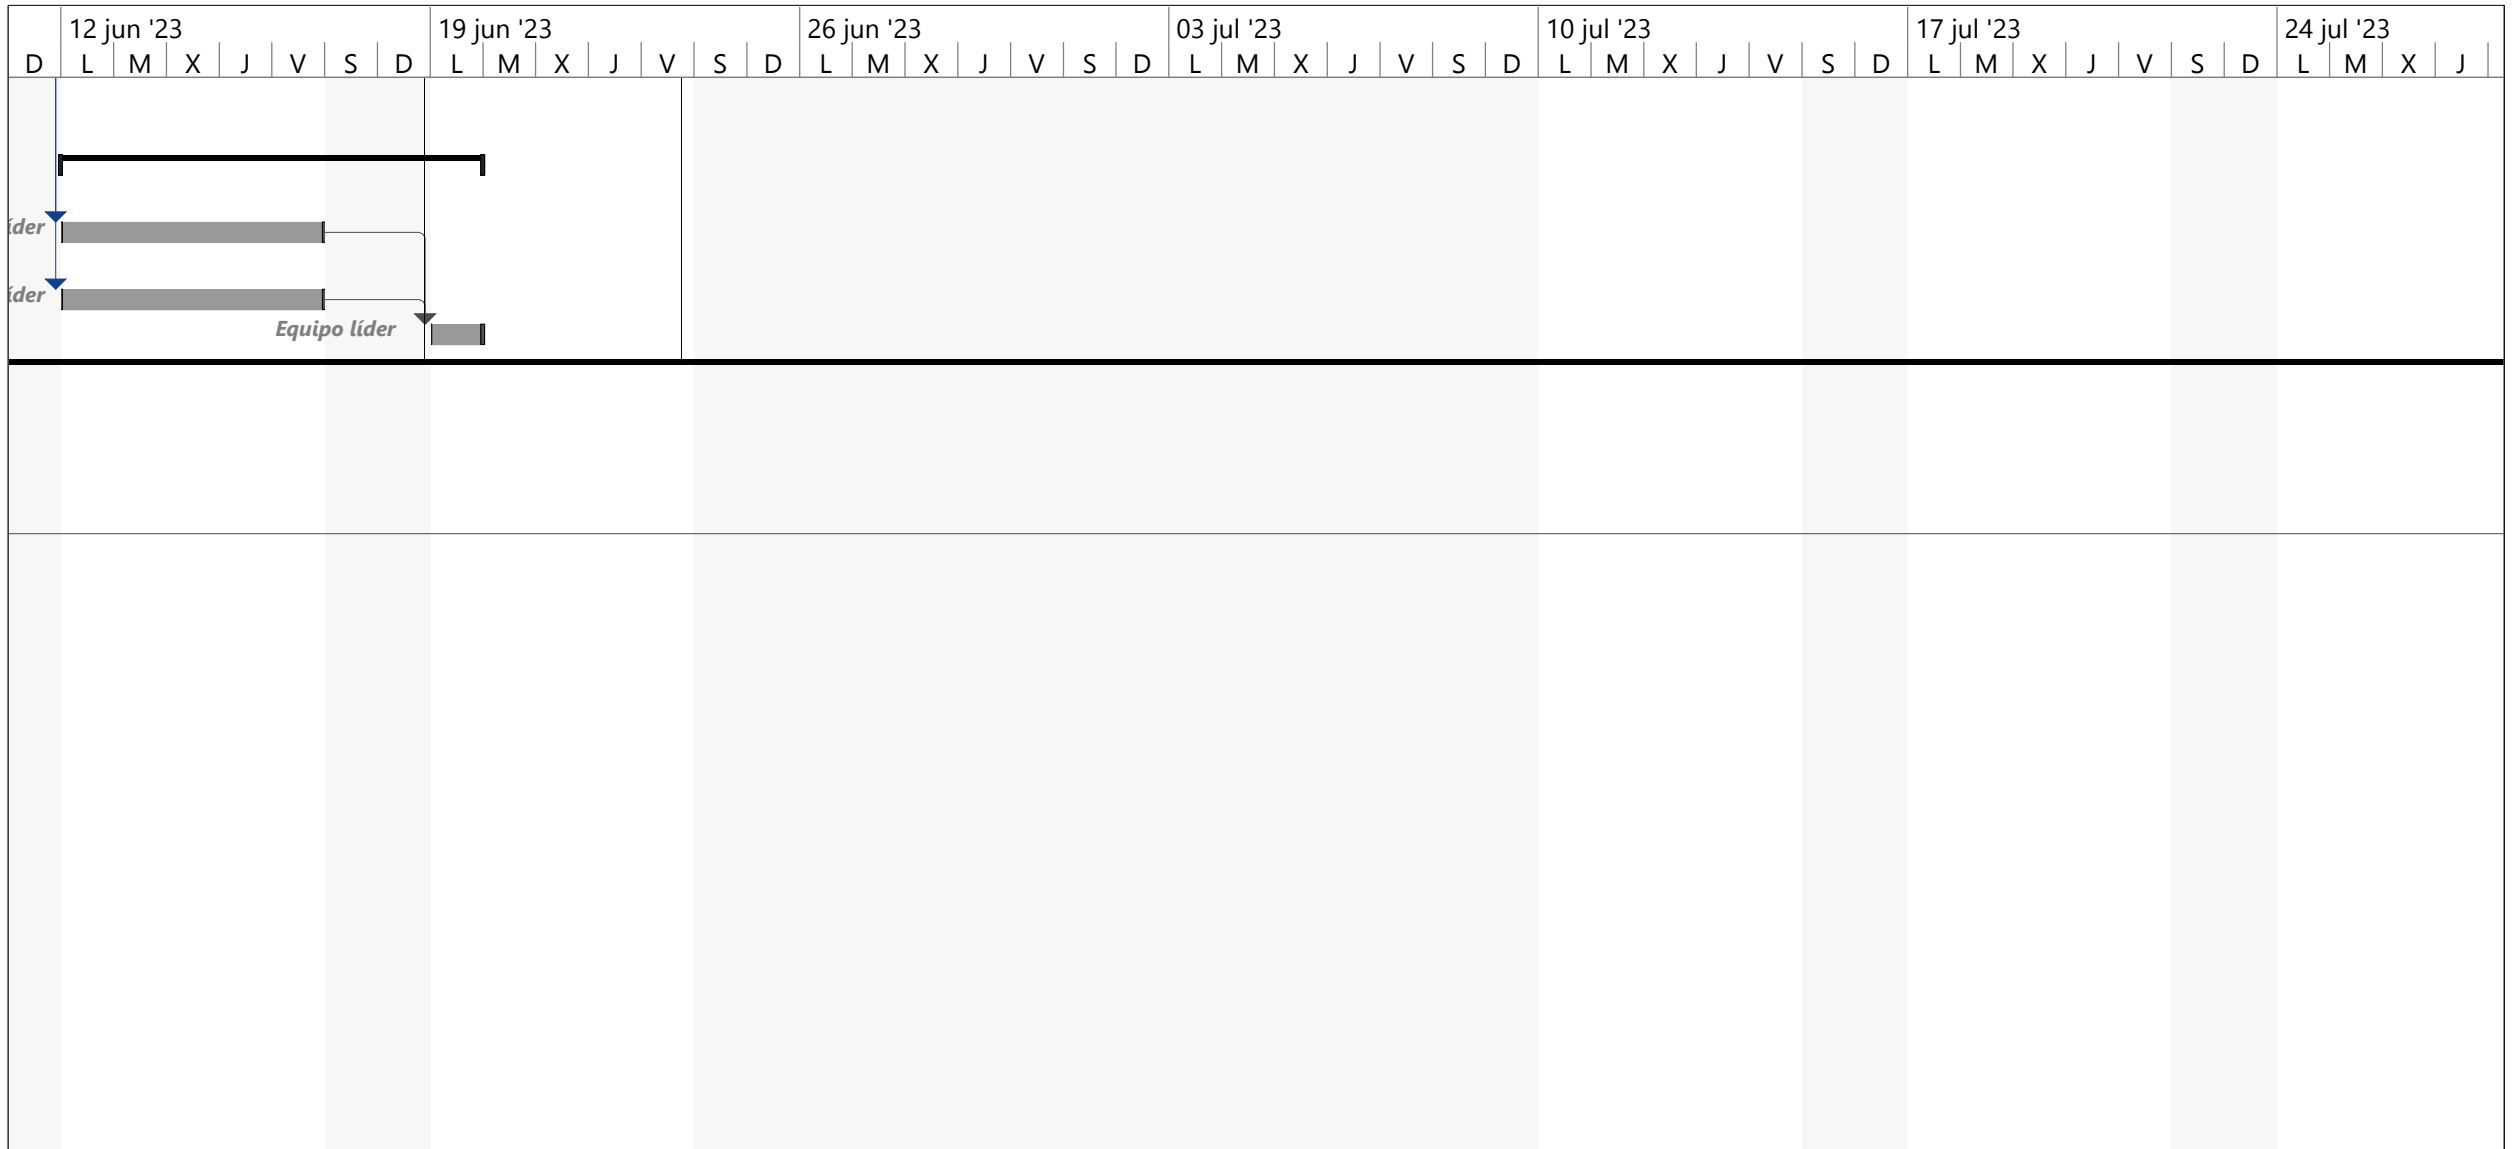


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

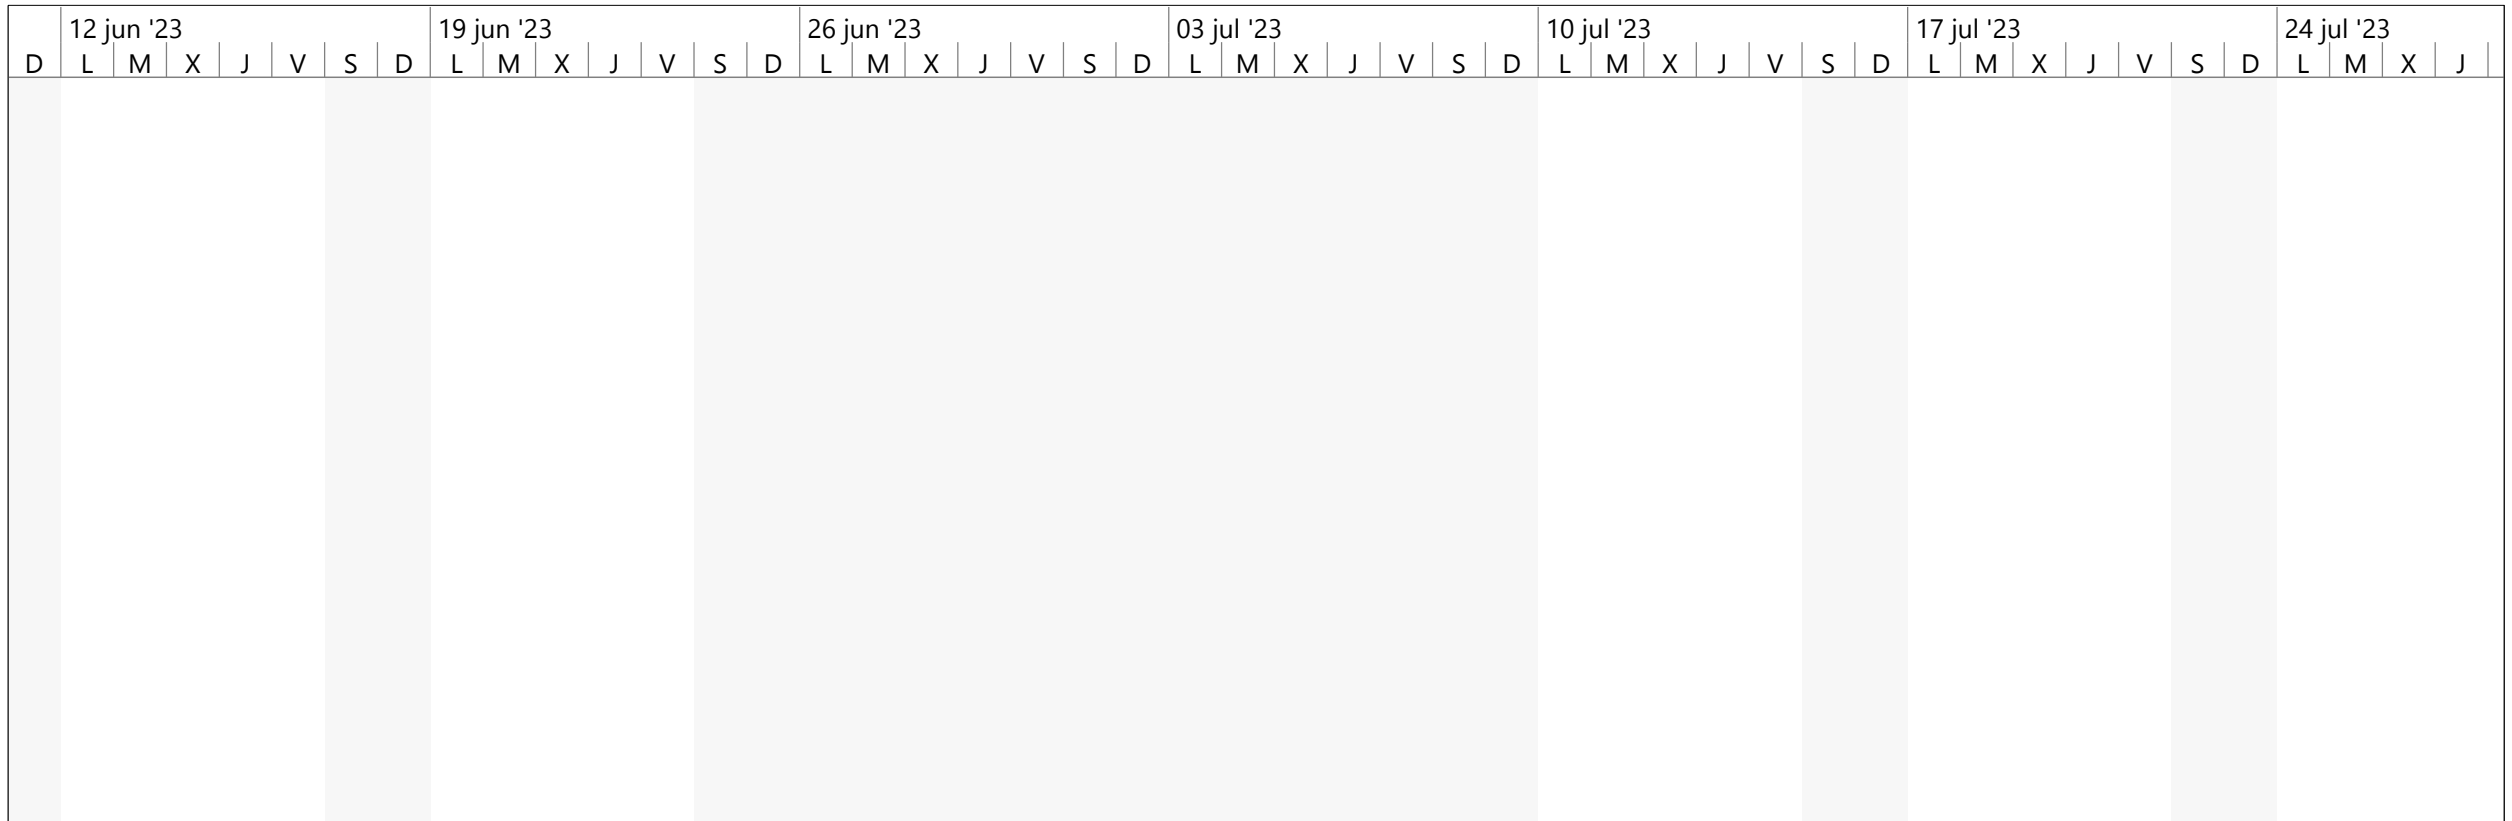


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

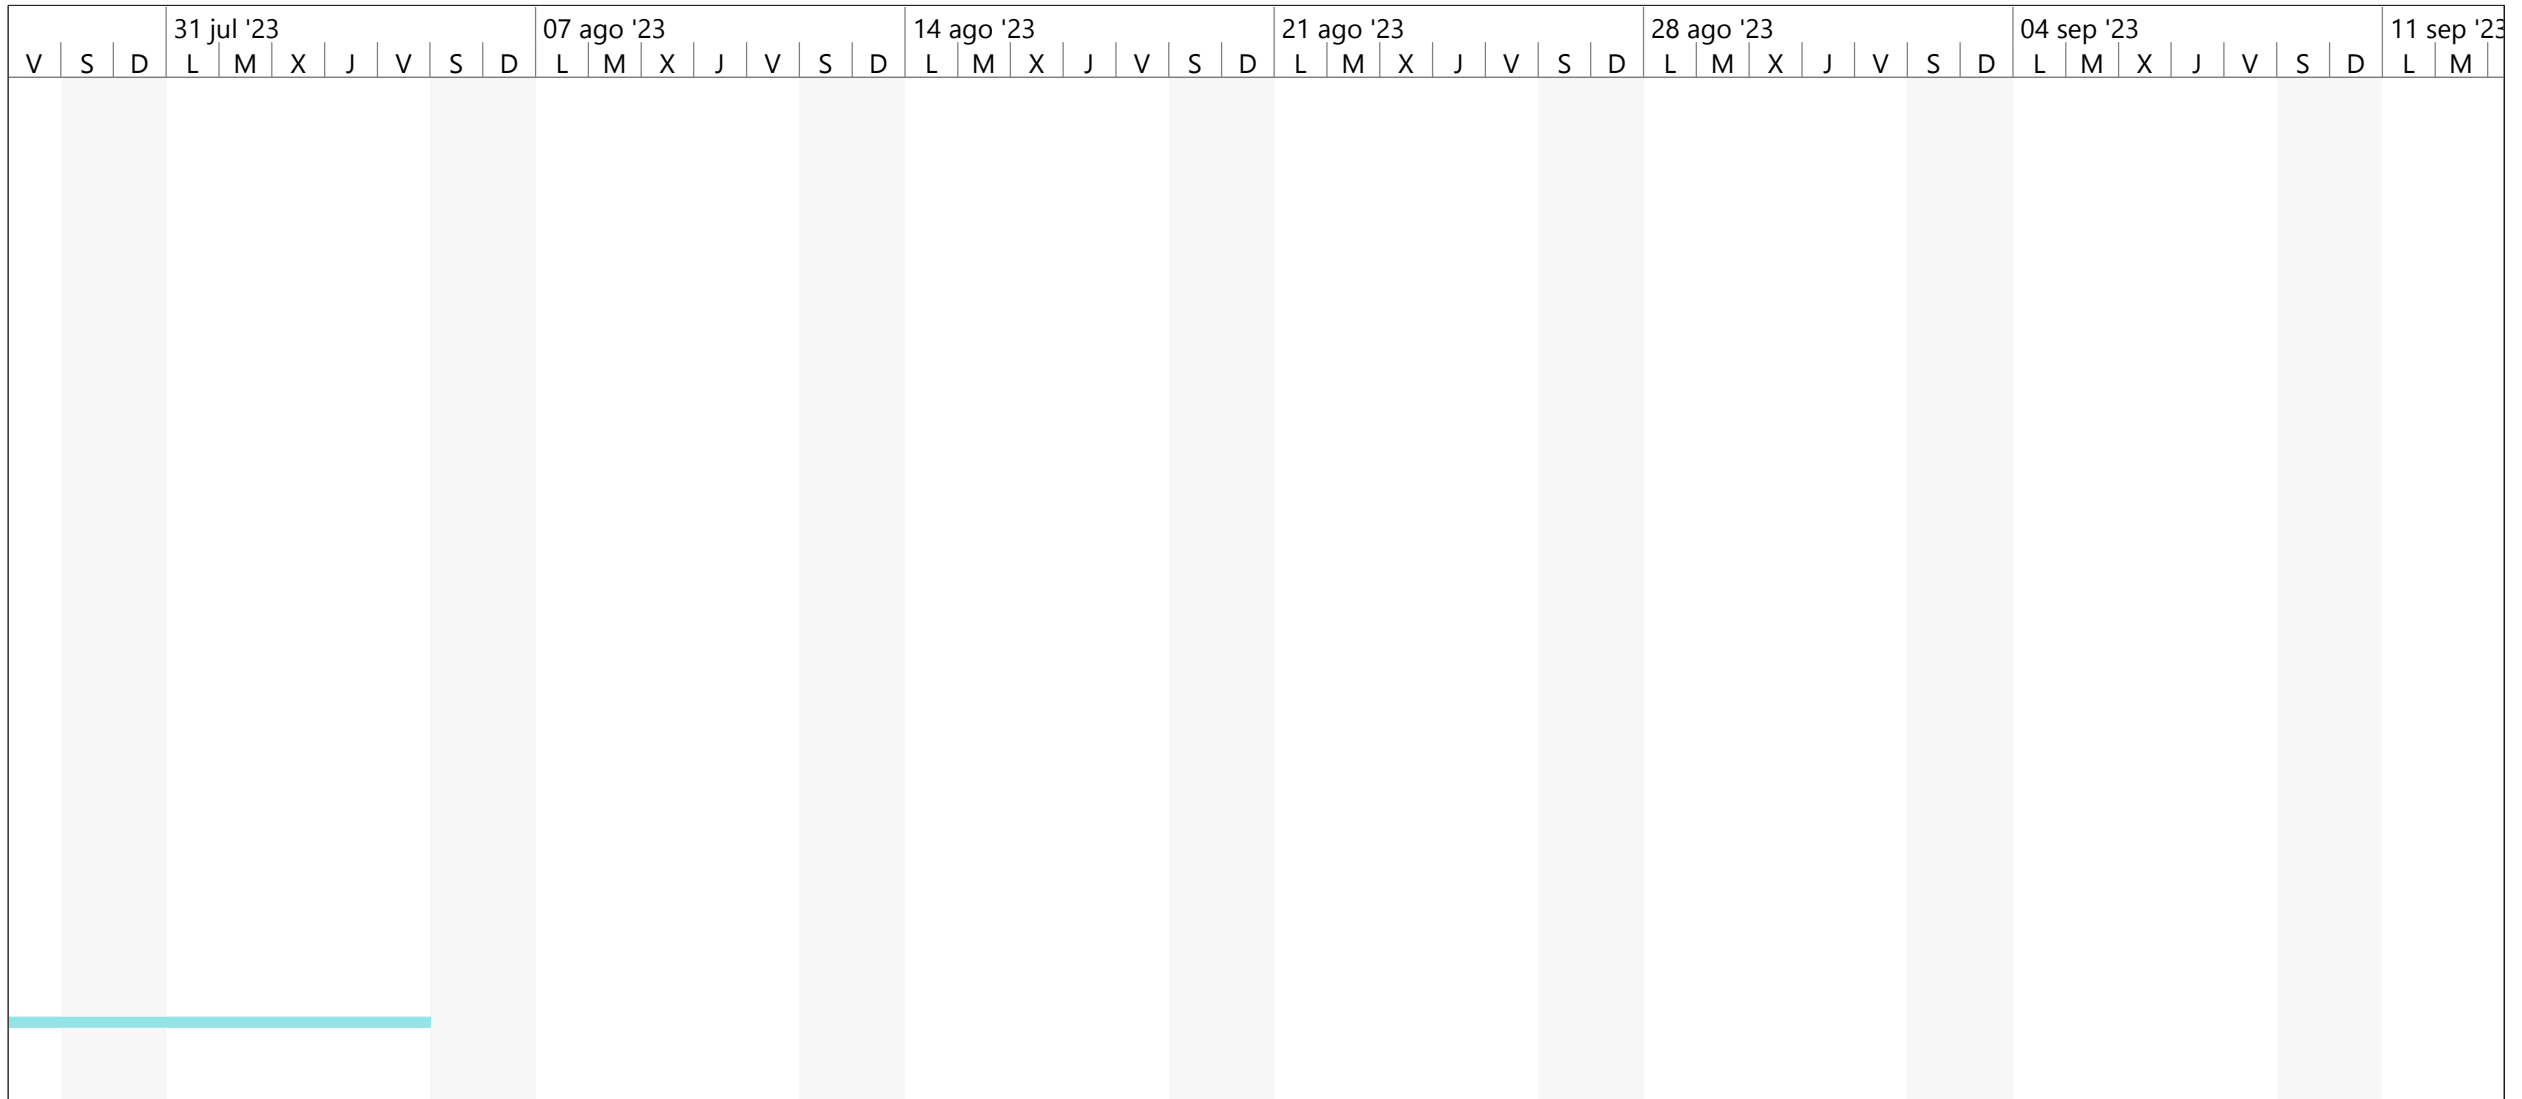


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

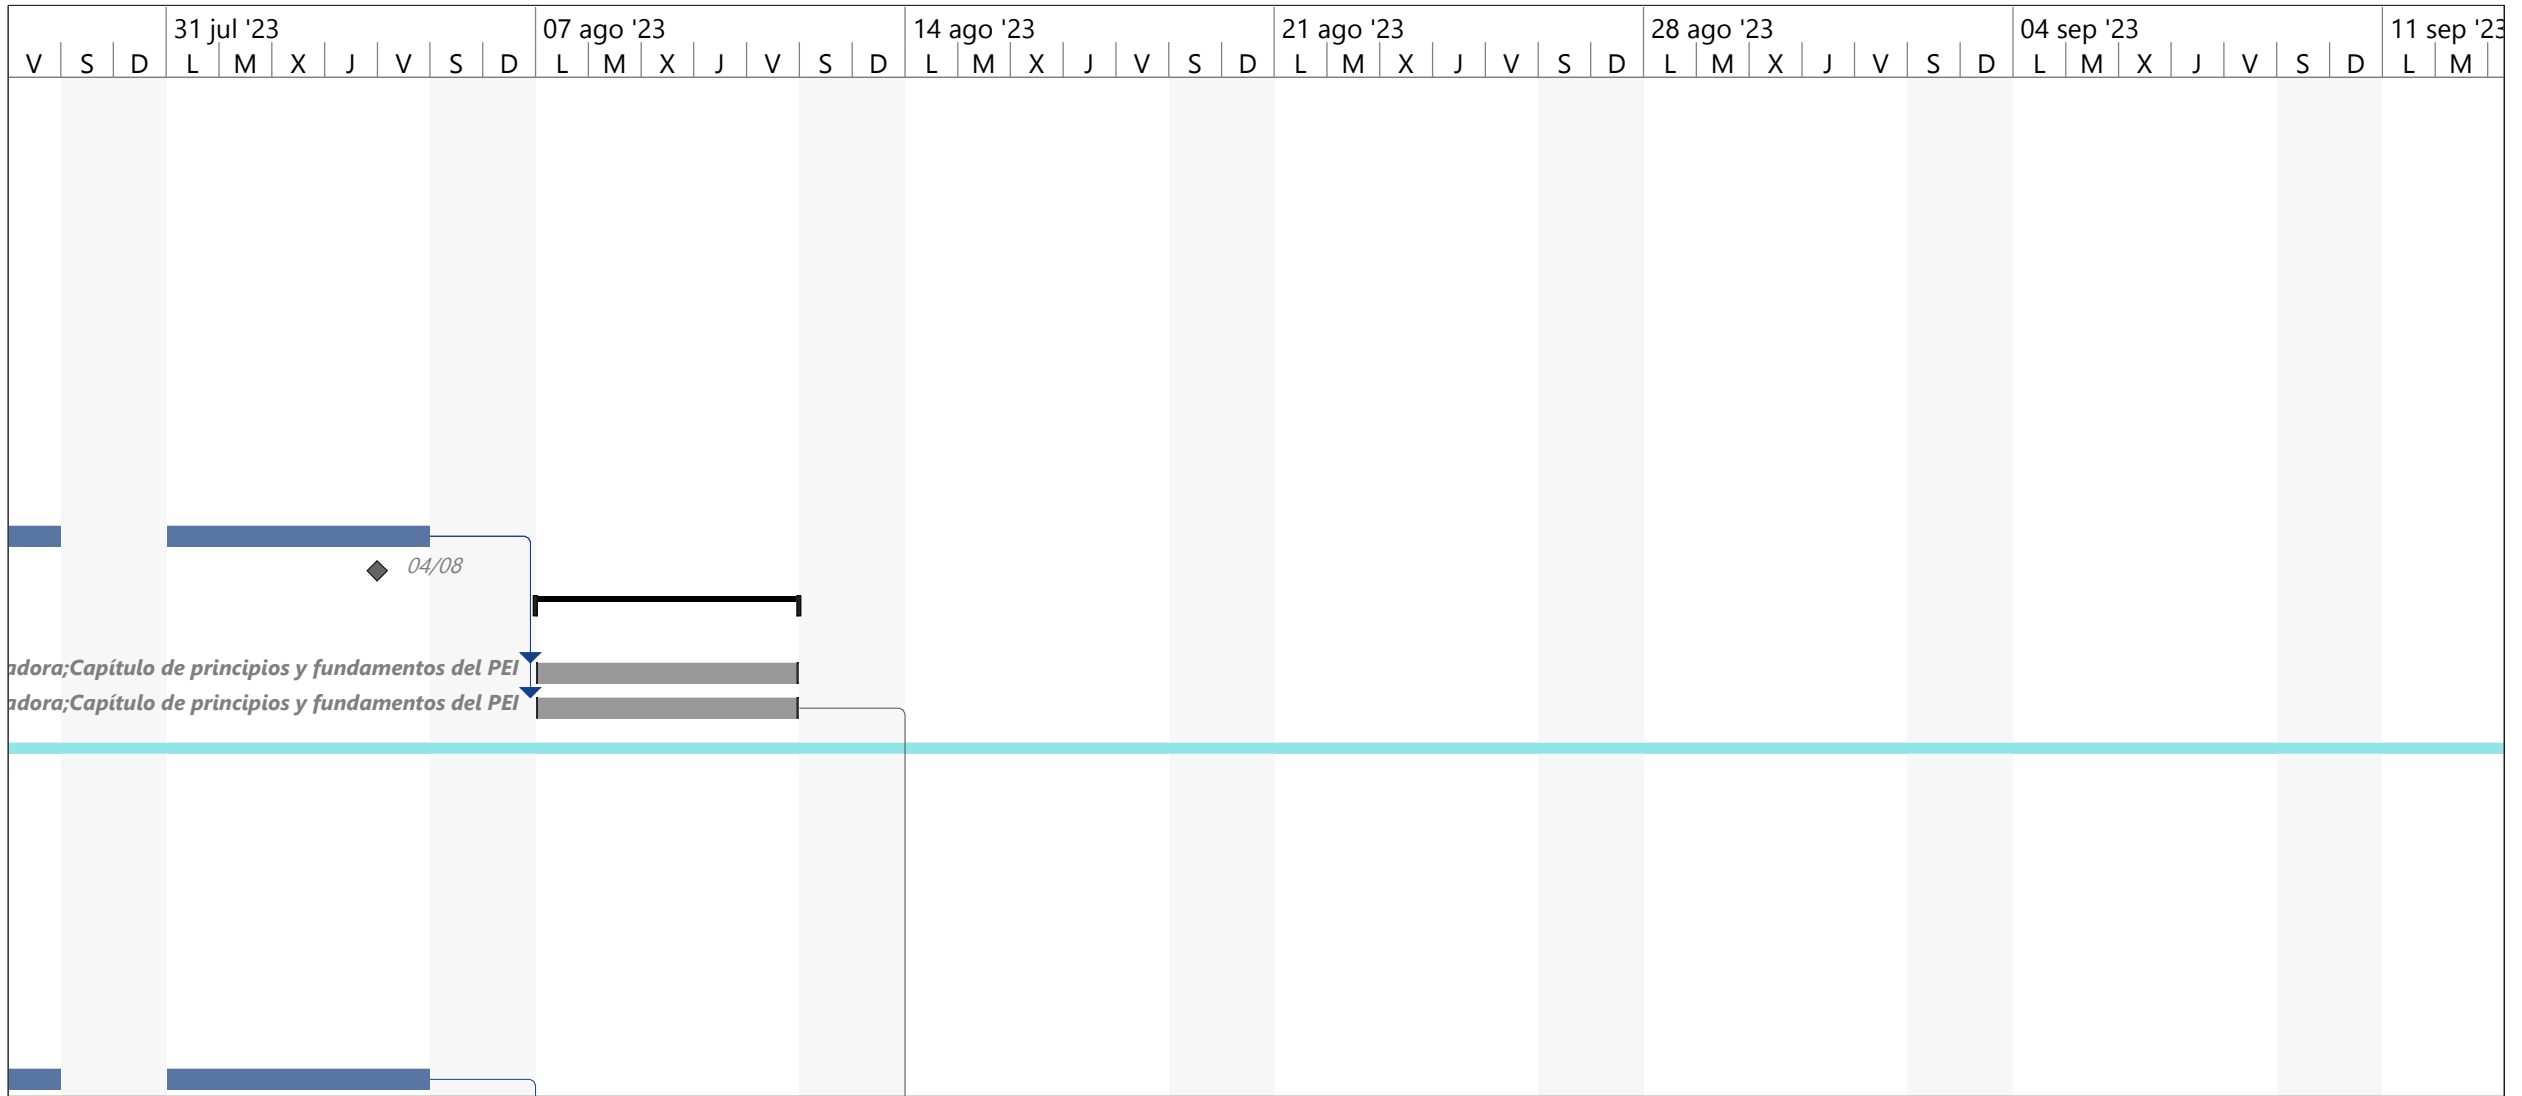

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23


Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

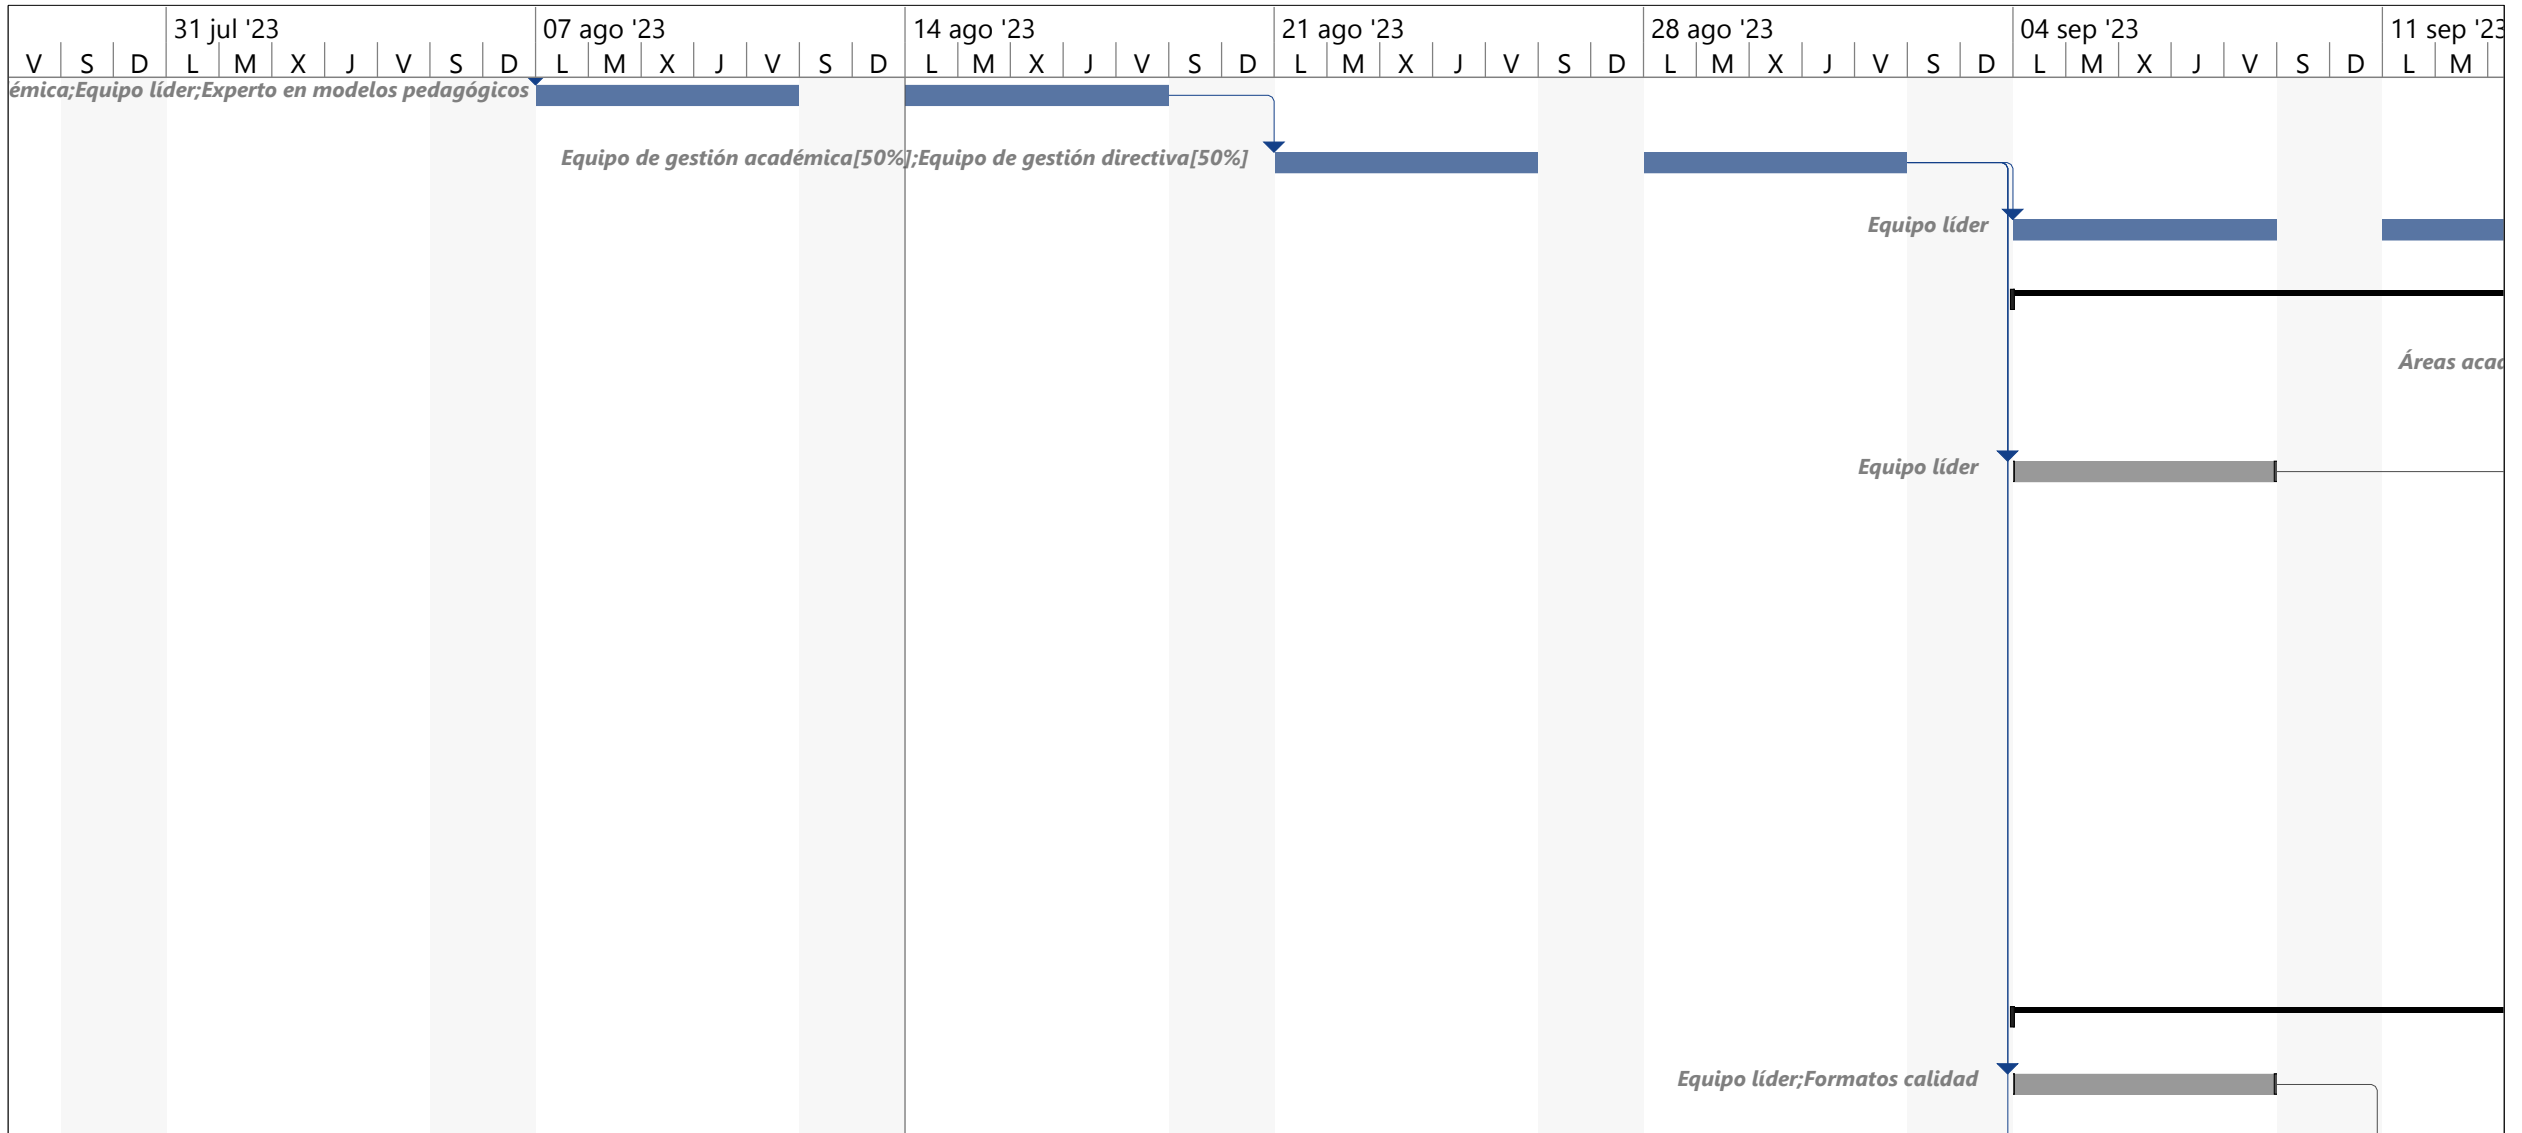

Proyecto: PROYECTO PEI Fecha: lun 27/03/23	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

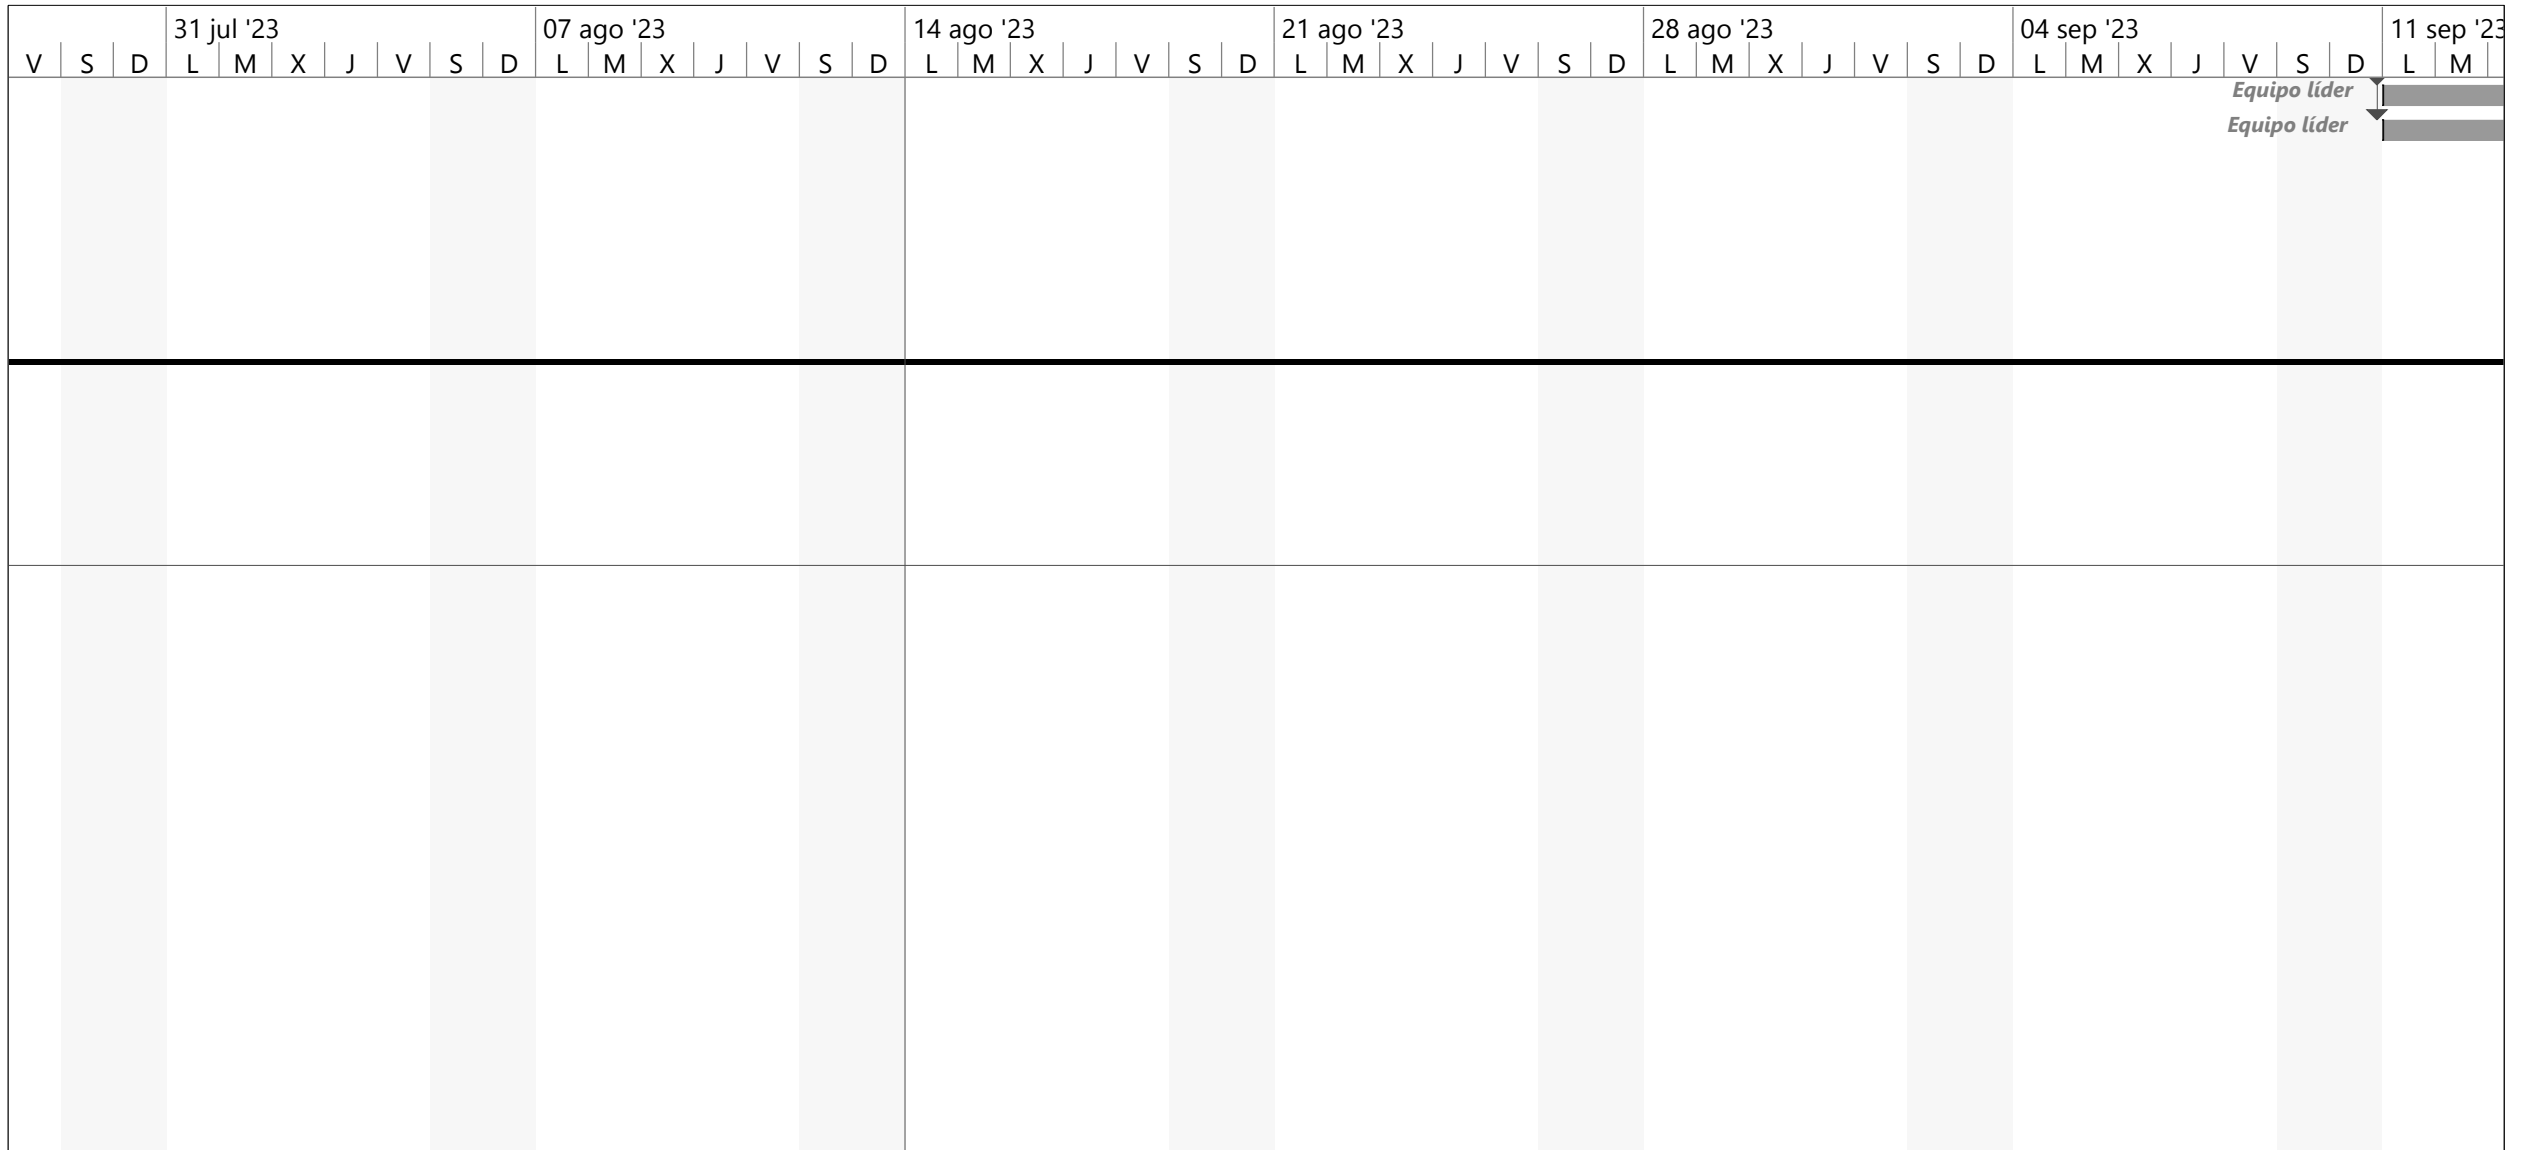

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

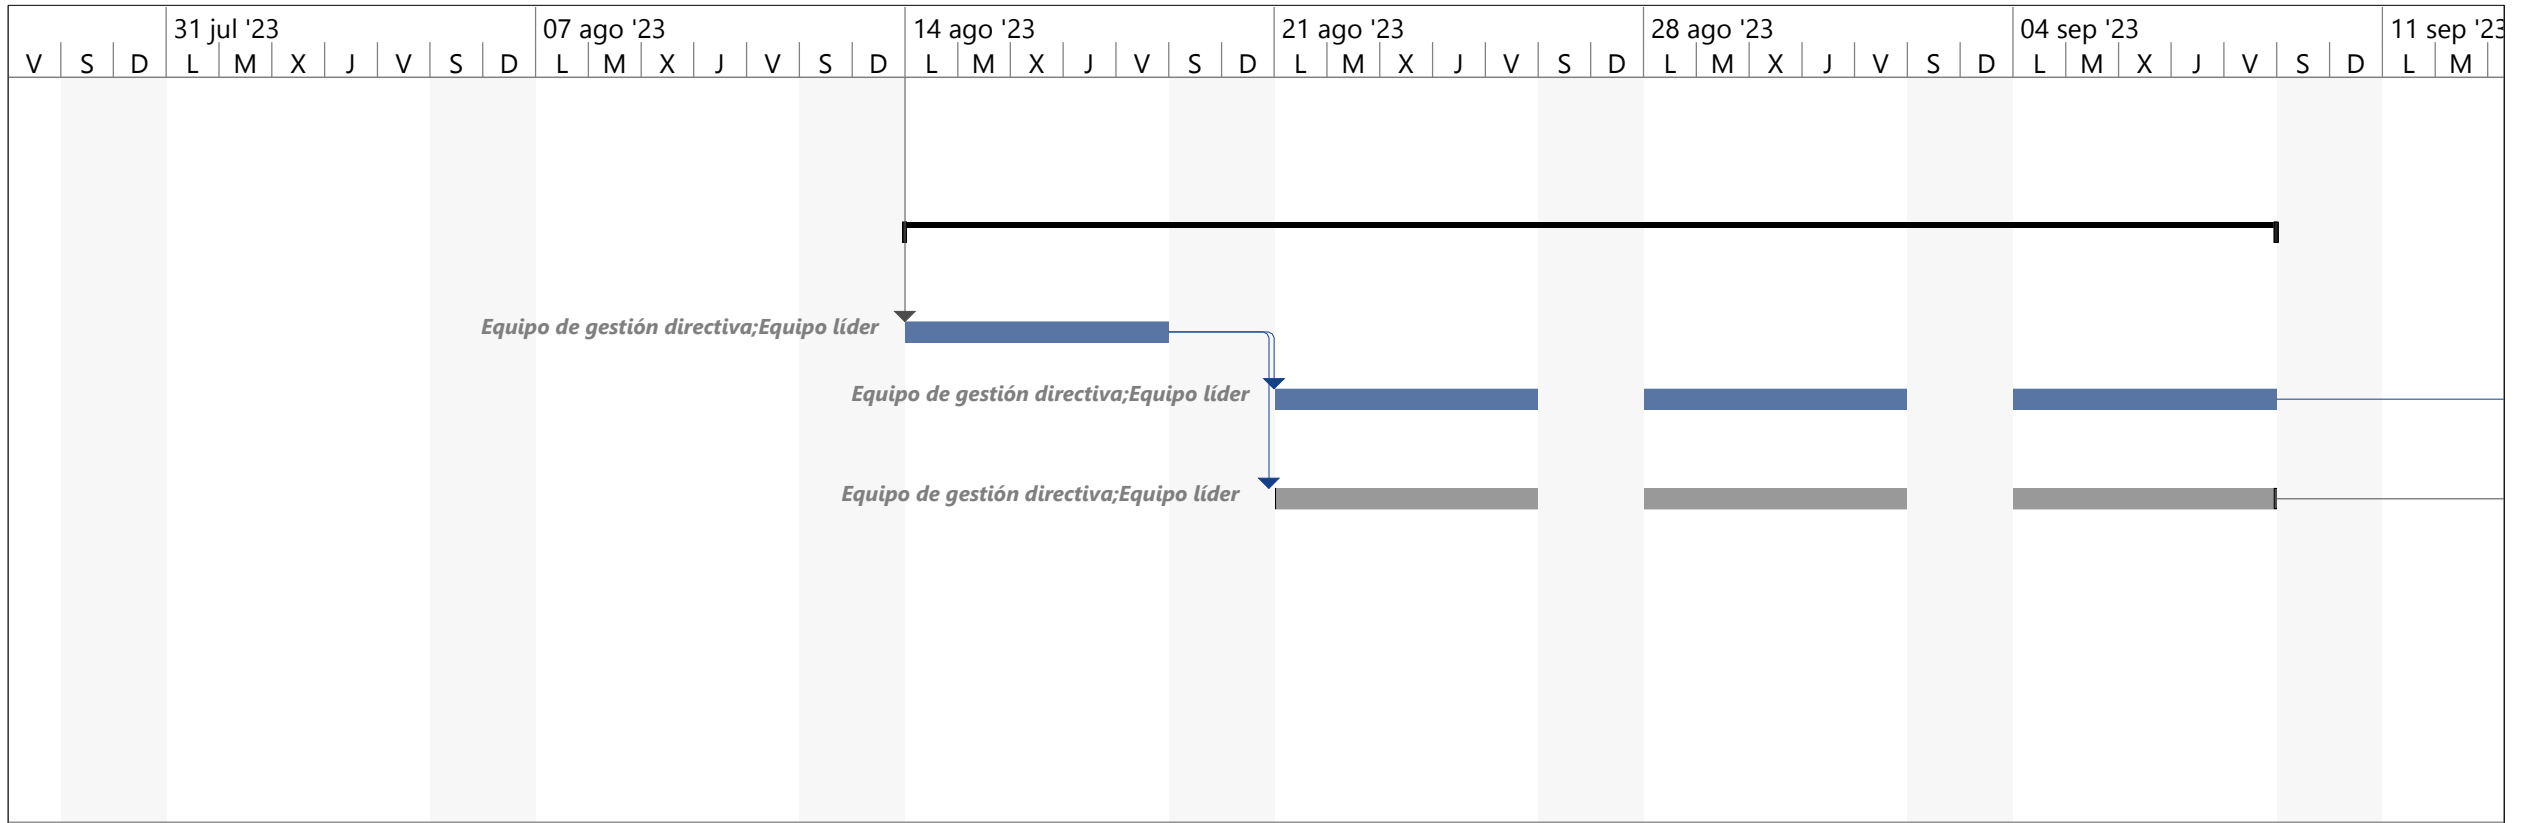

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23


Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

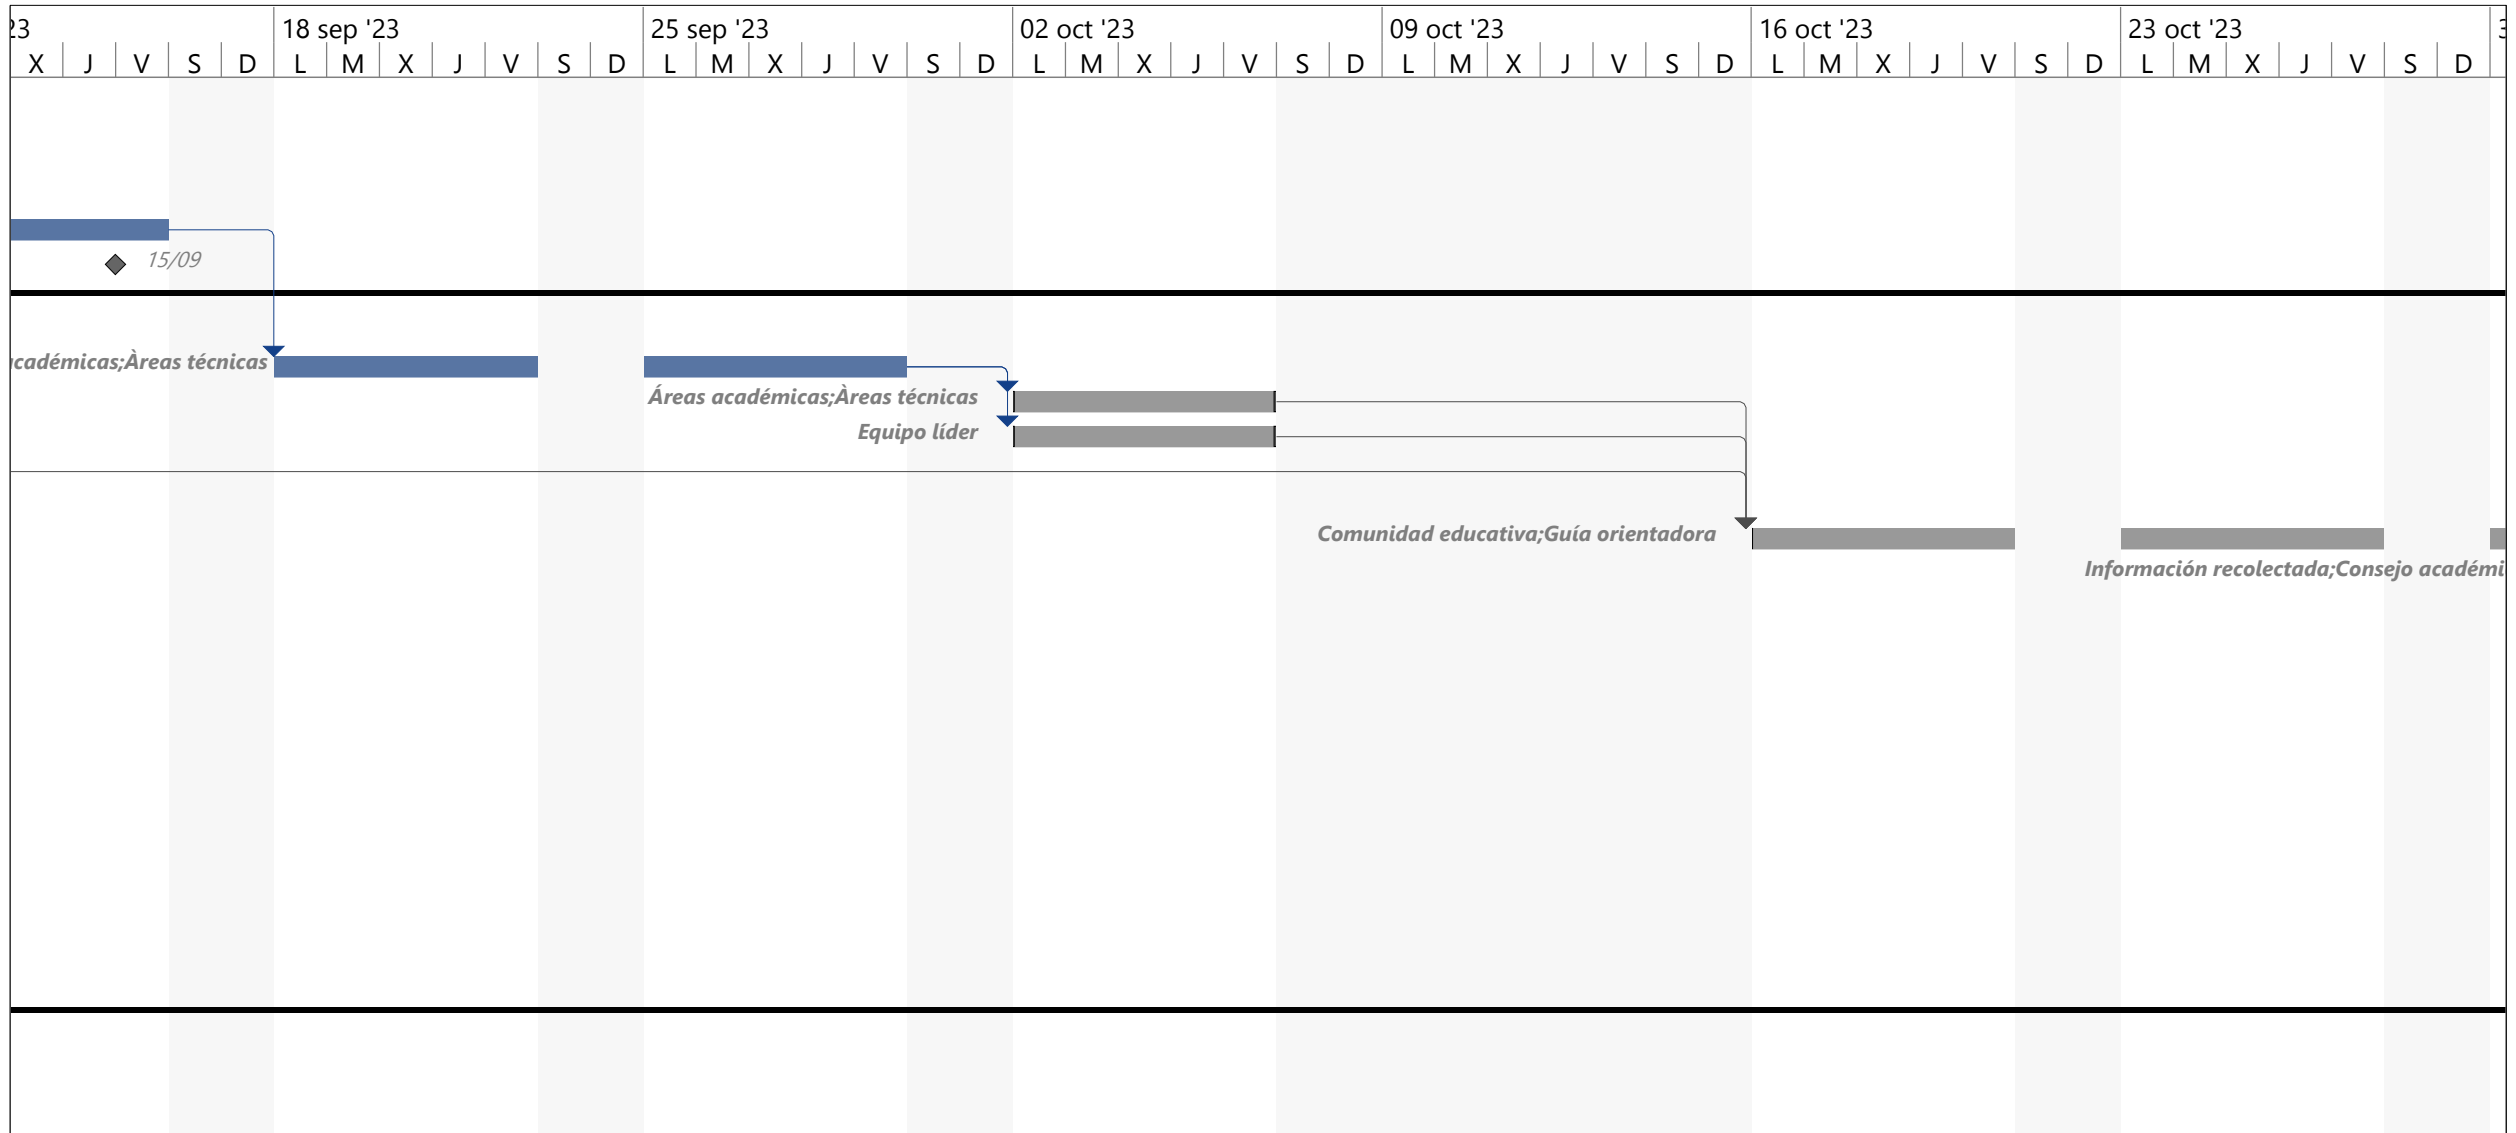


Proyecto: PROYECTO PEI Fecha: lun 27/03/23	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

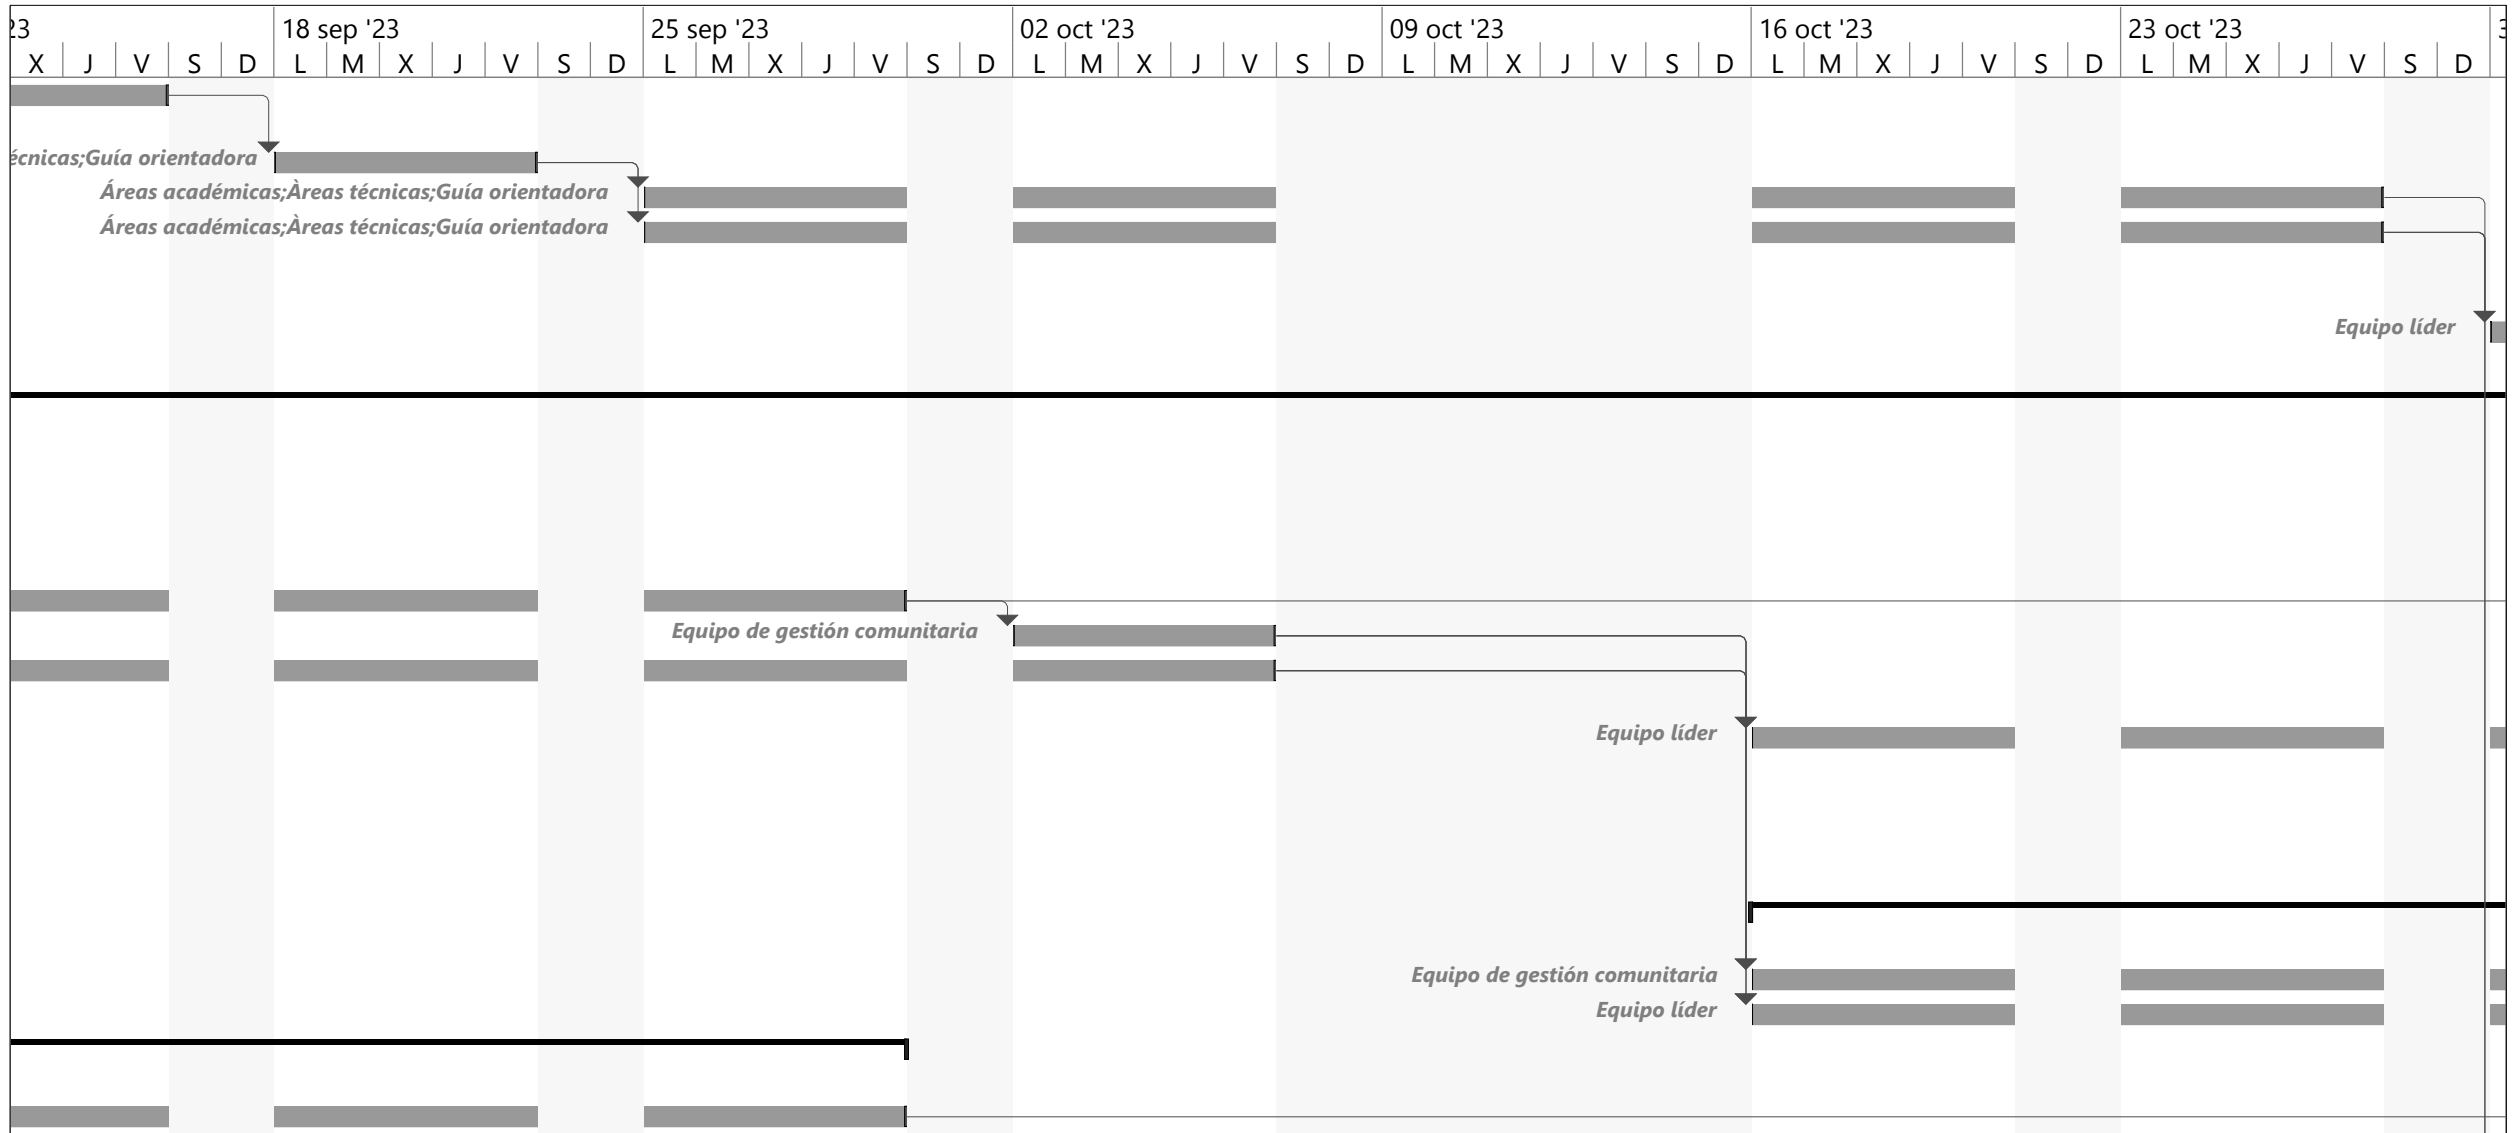

Proyecto: PROYECTO PEI Fecha: lun 27/03/23	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

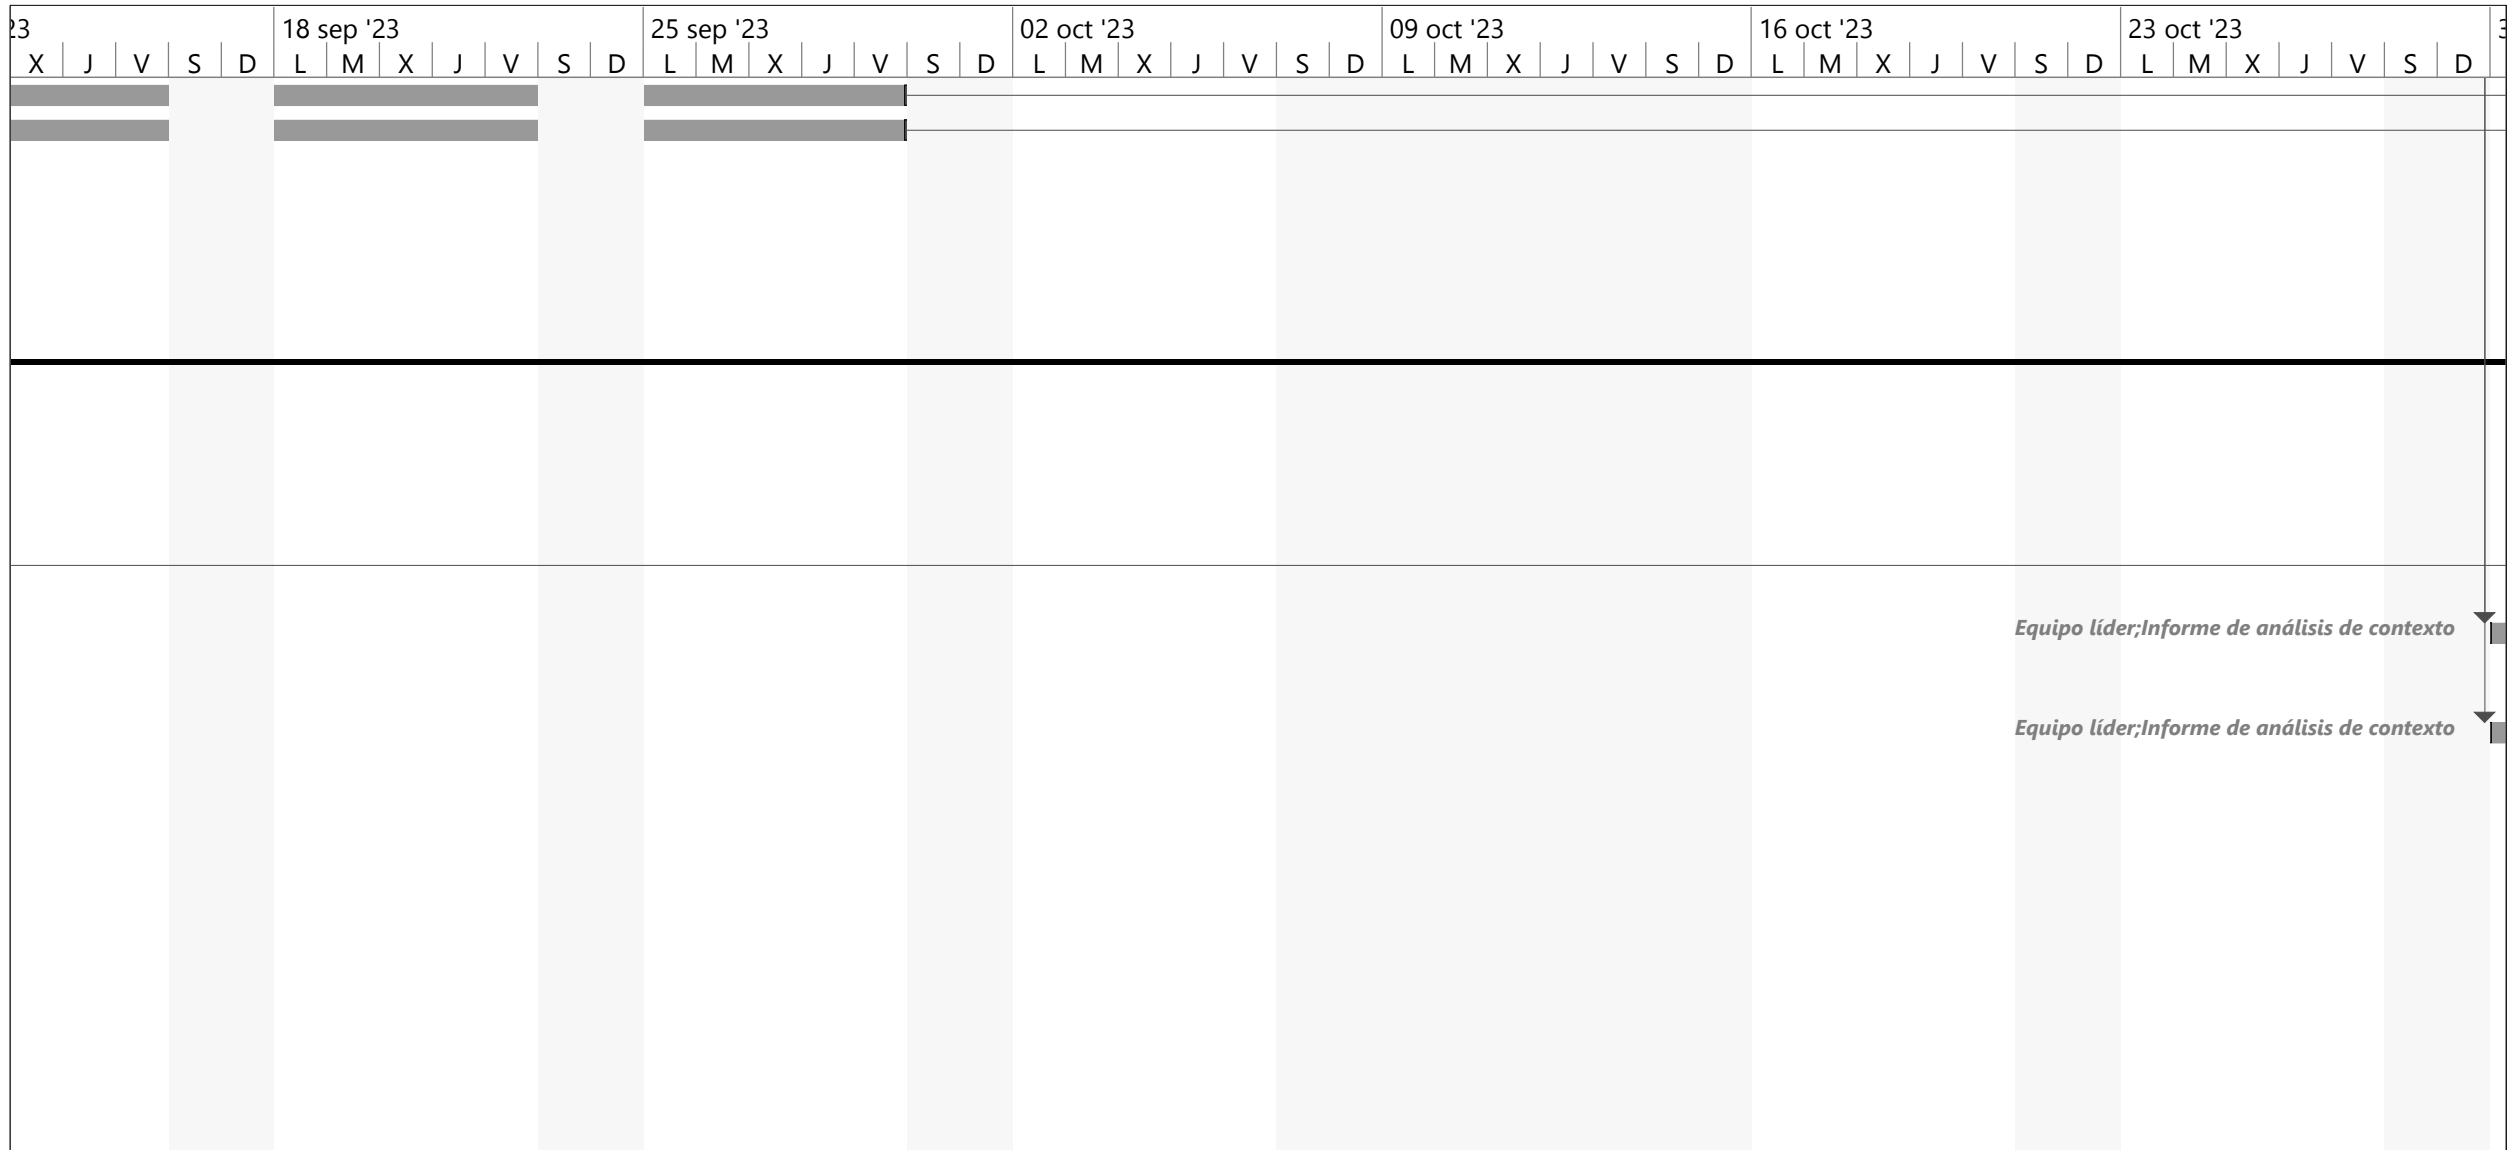


Proyecto: PROYECTO PEI Fecha: lun 27/03/23	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

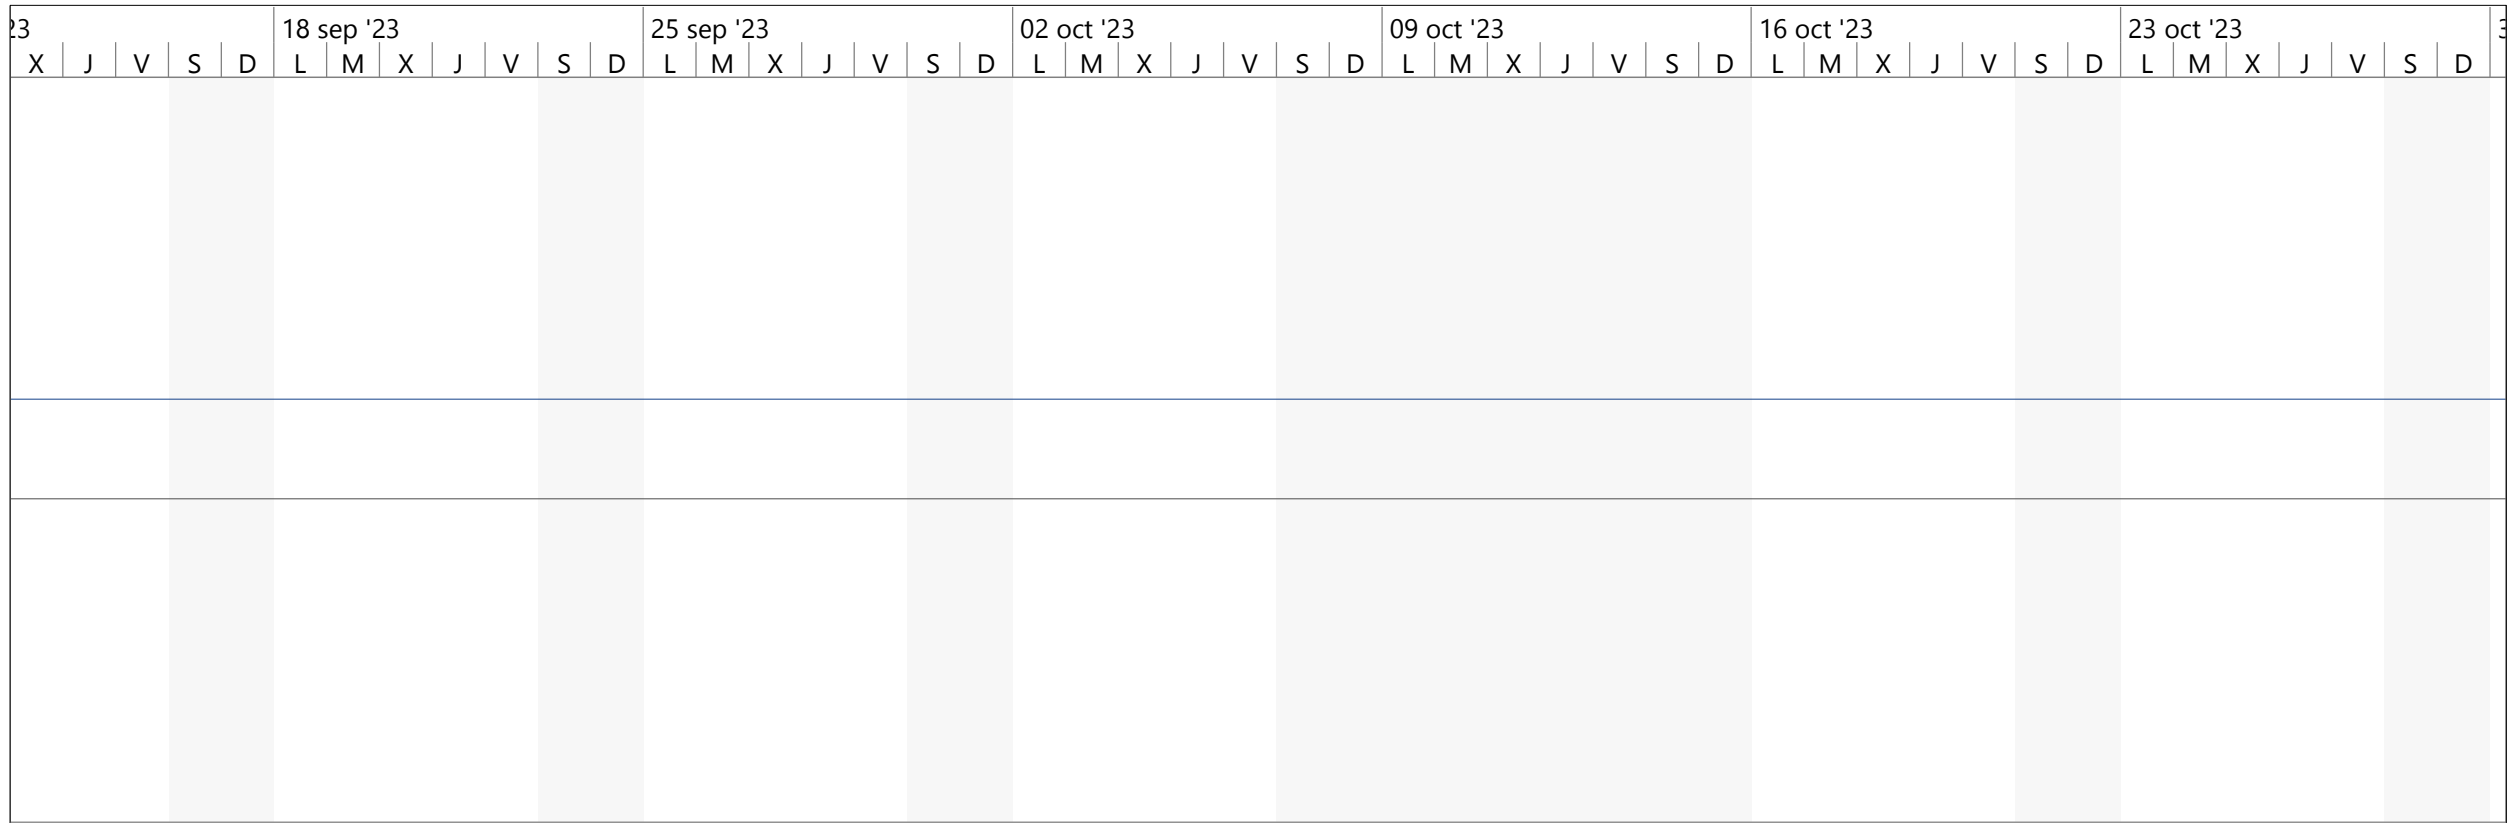

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

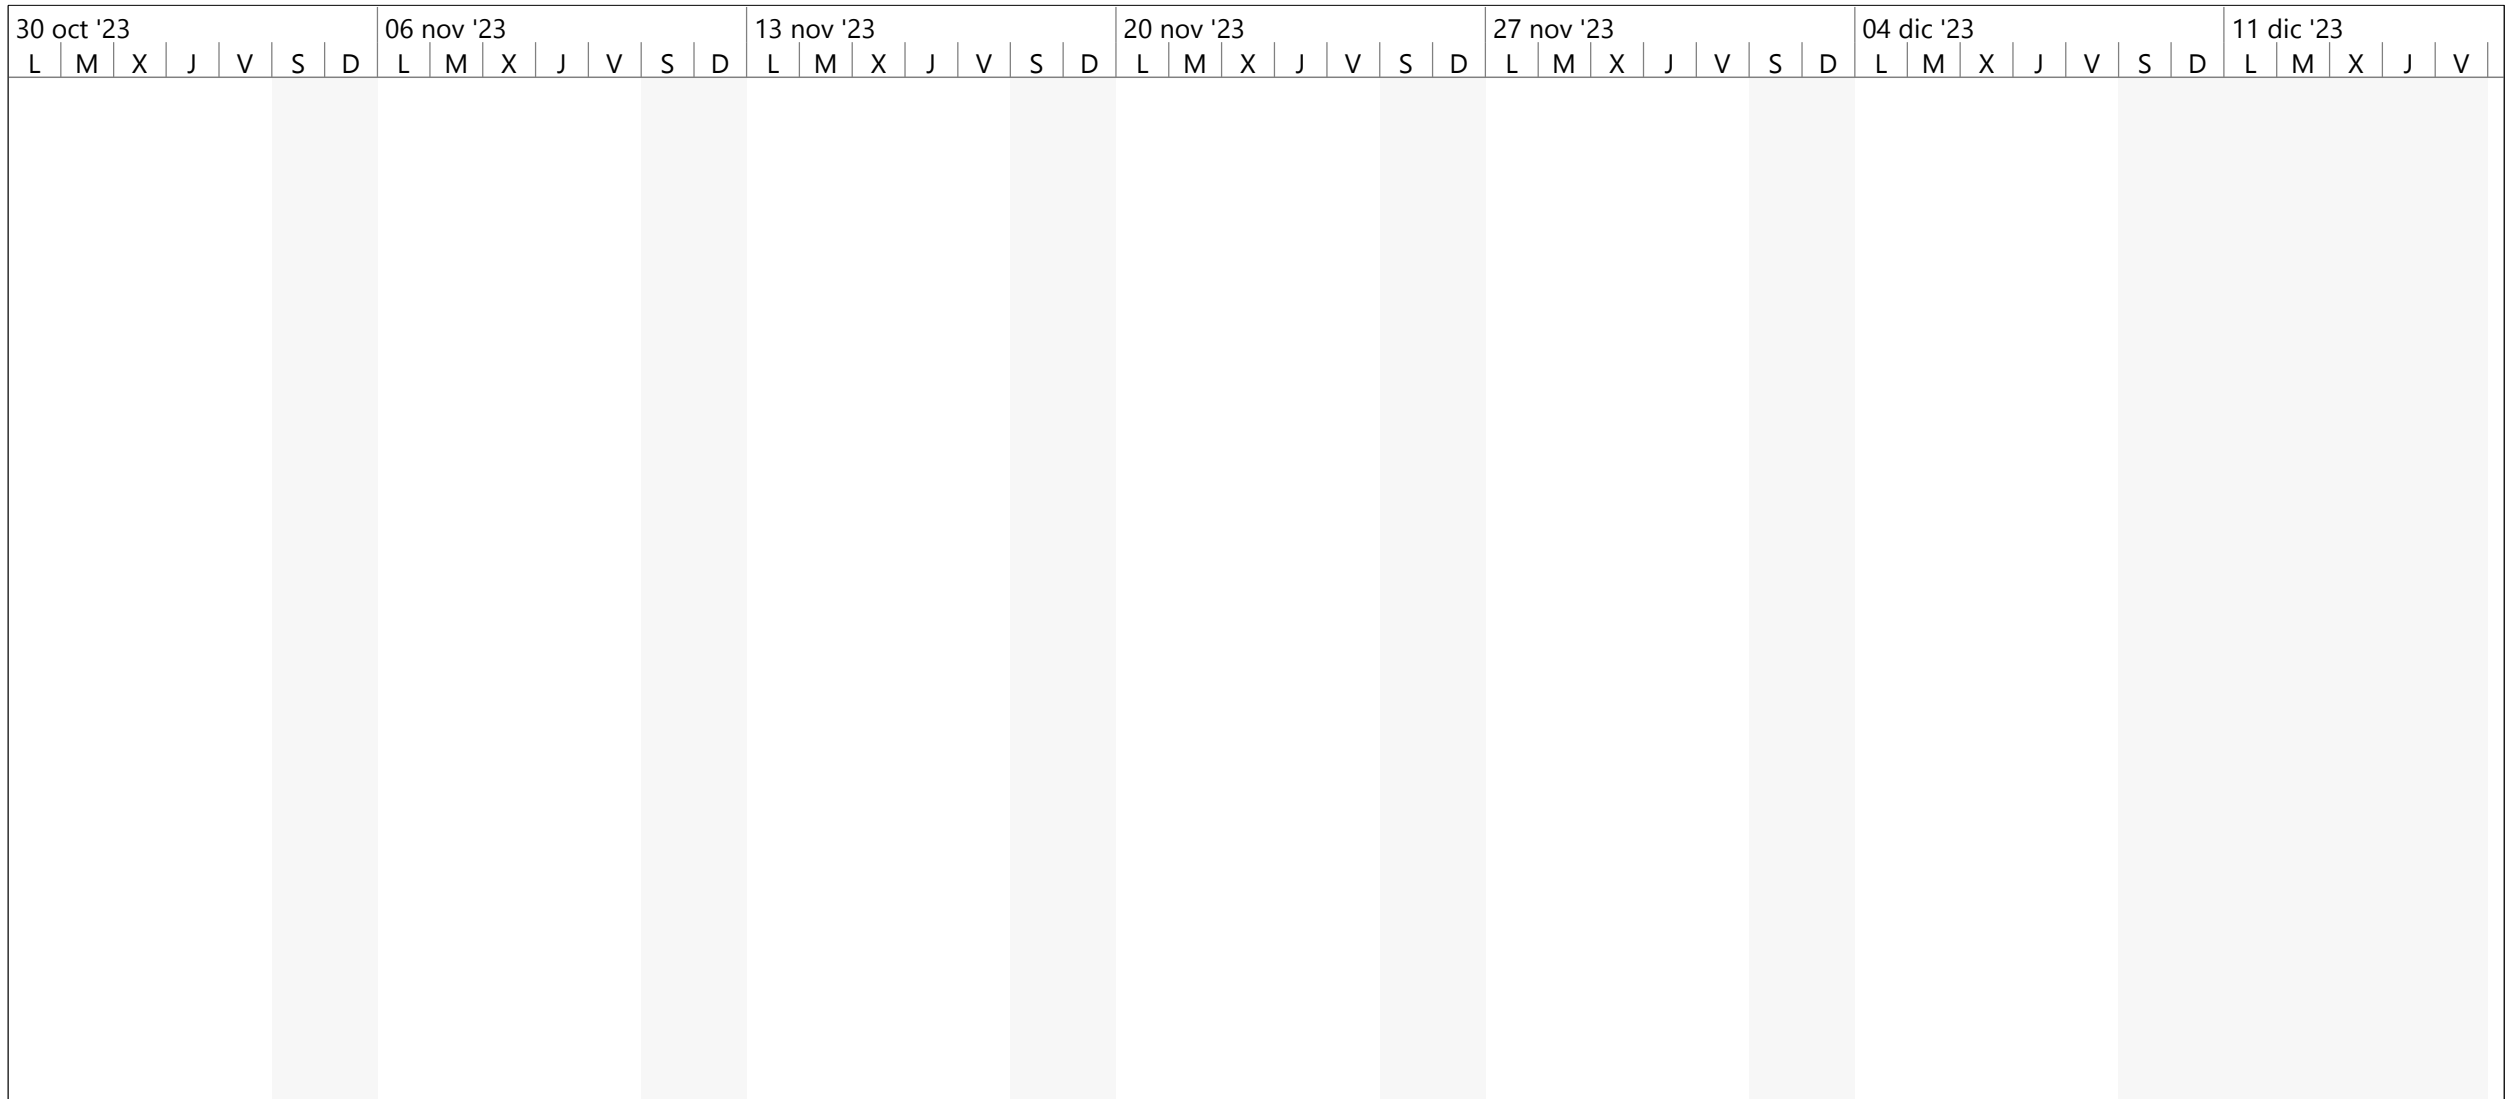


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

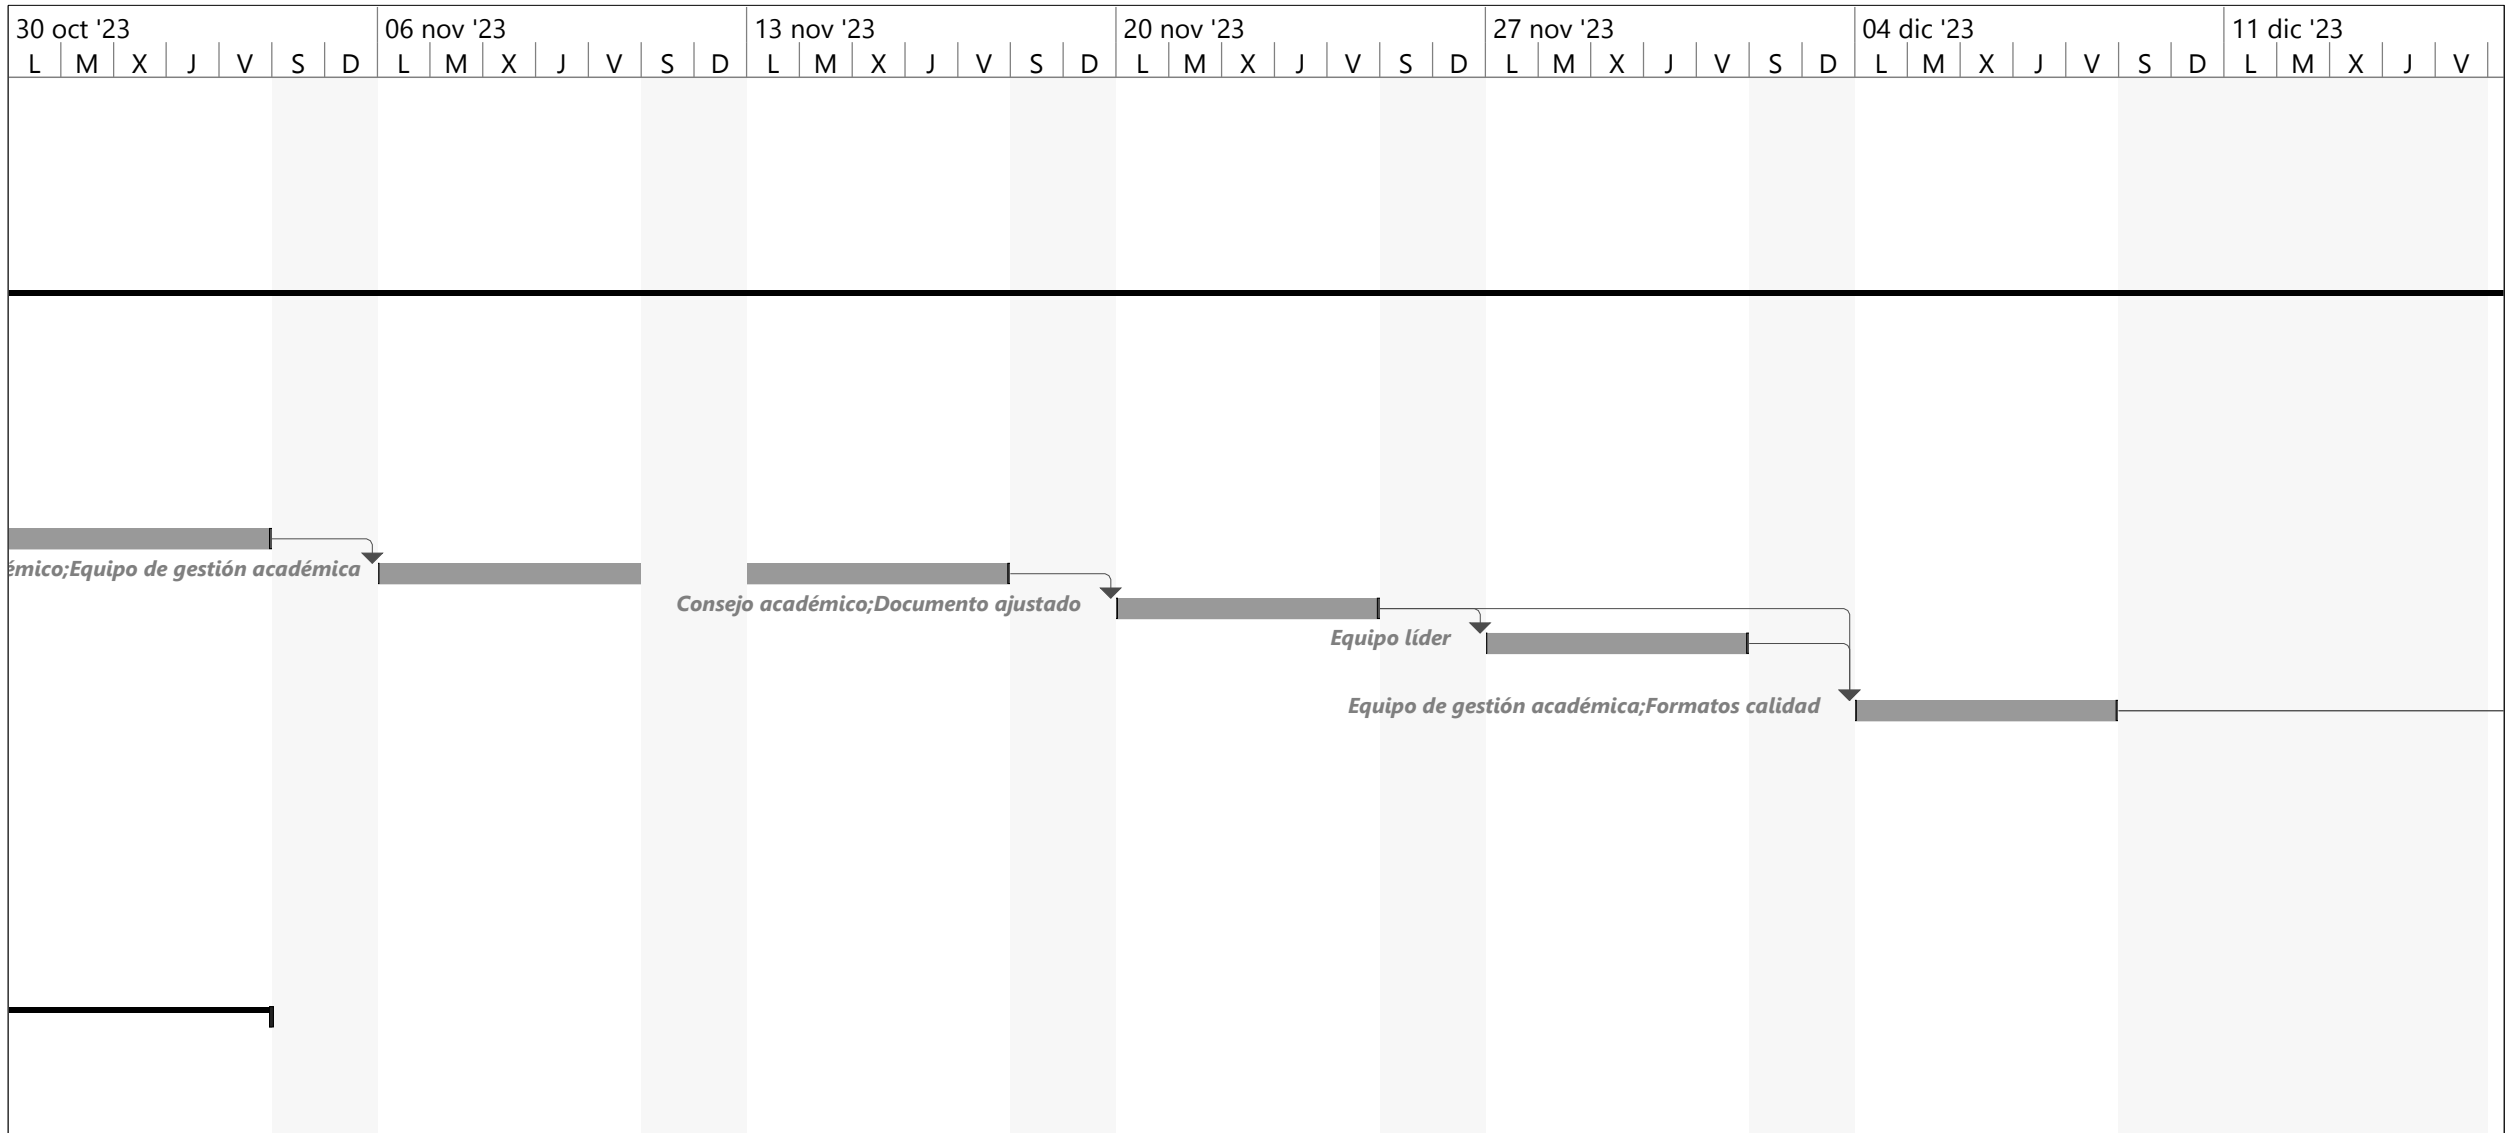


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

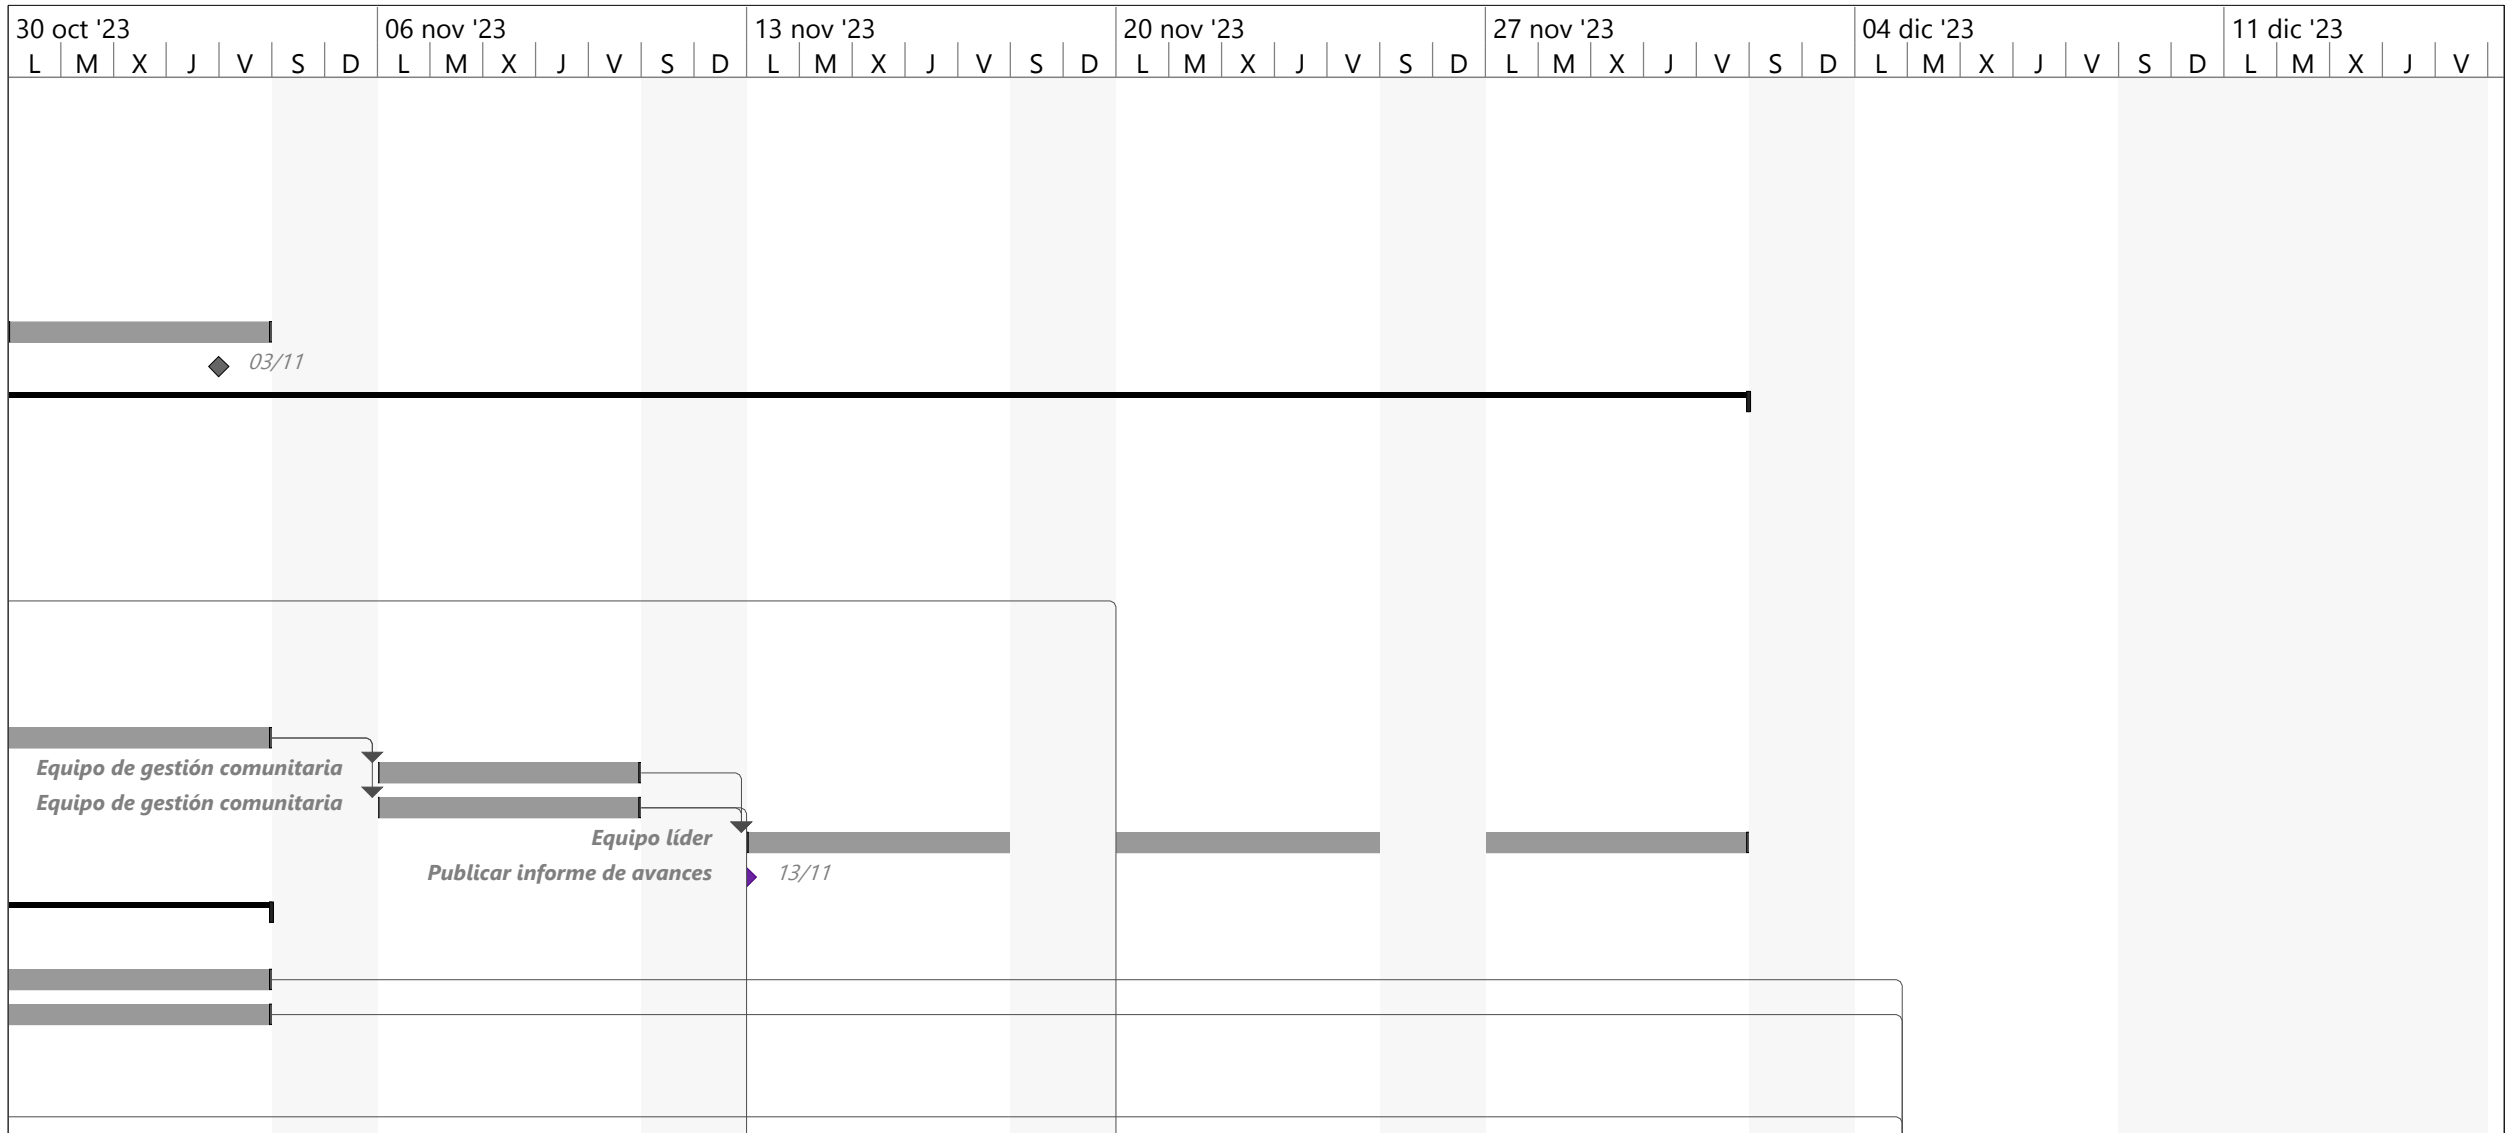


Proyecto: PROYECTO PEI Fecha: lun 27/03/23	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

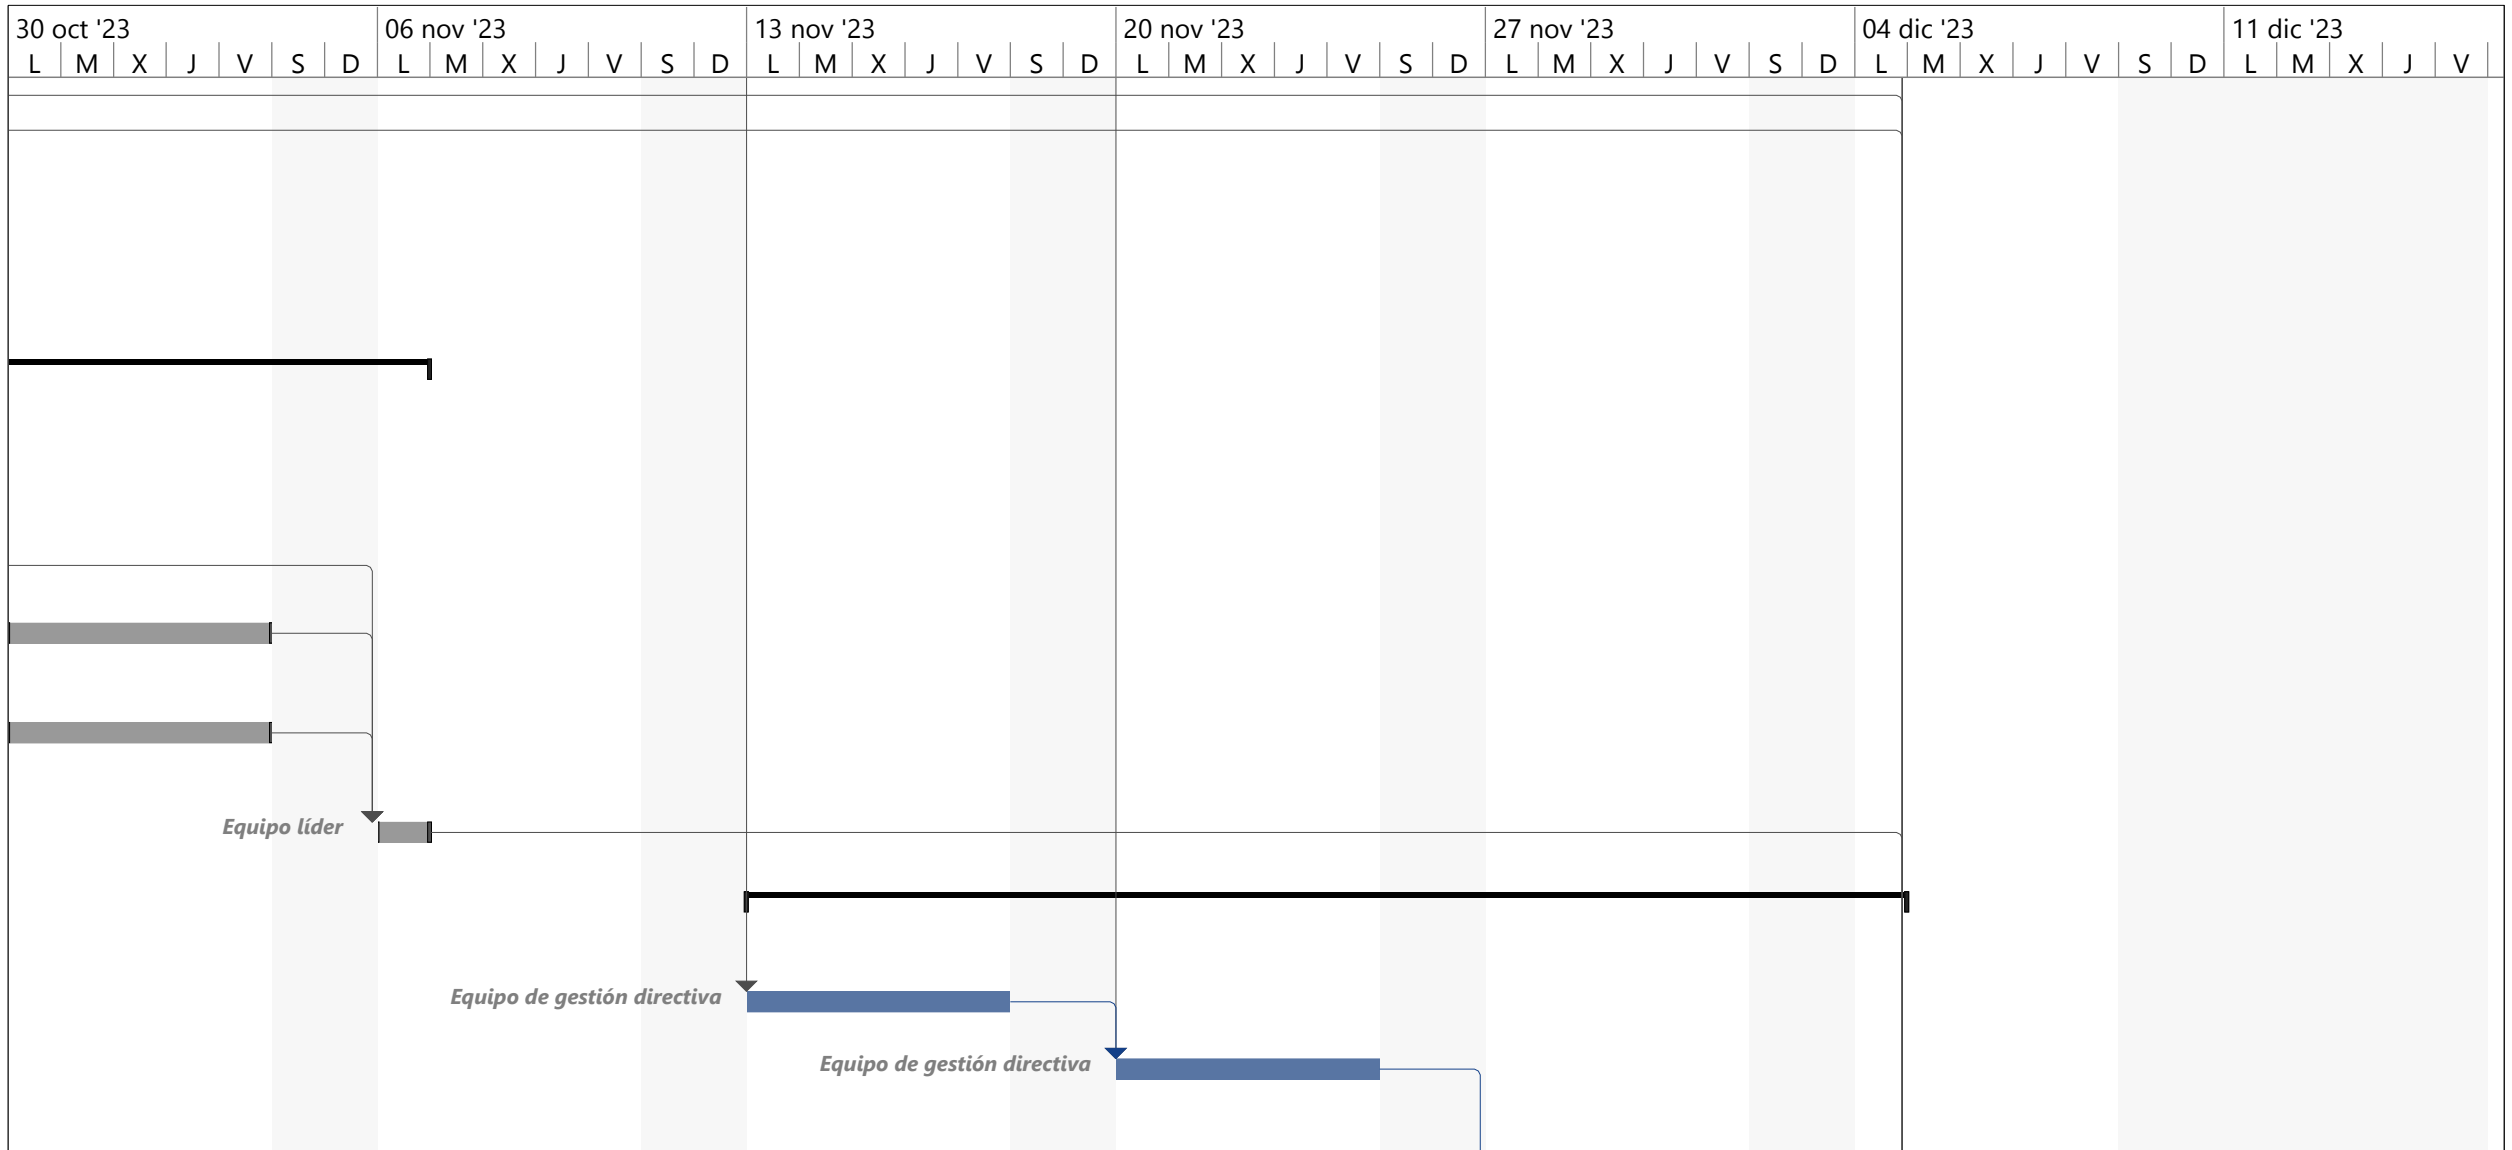

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

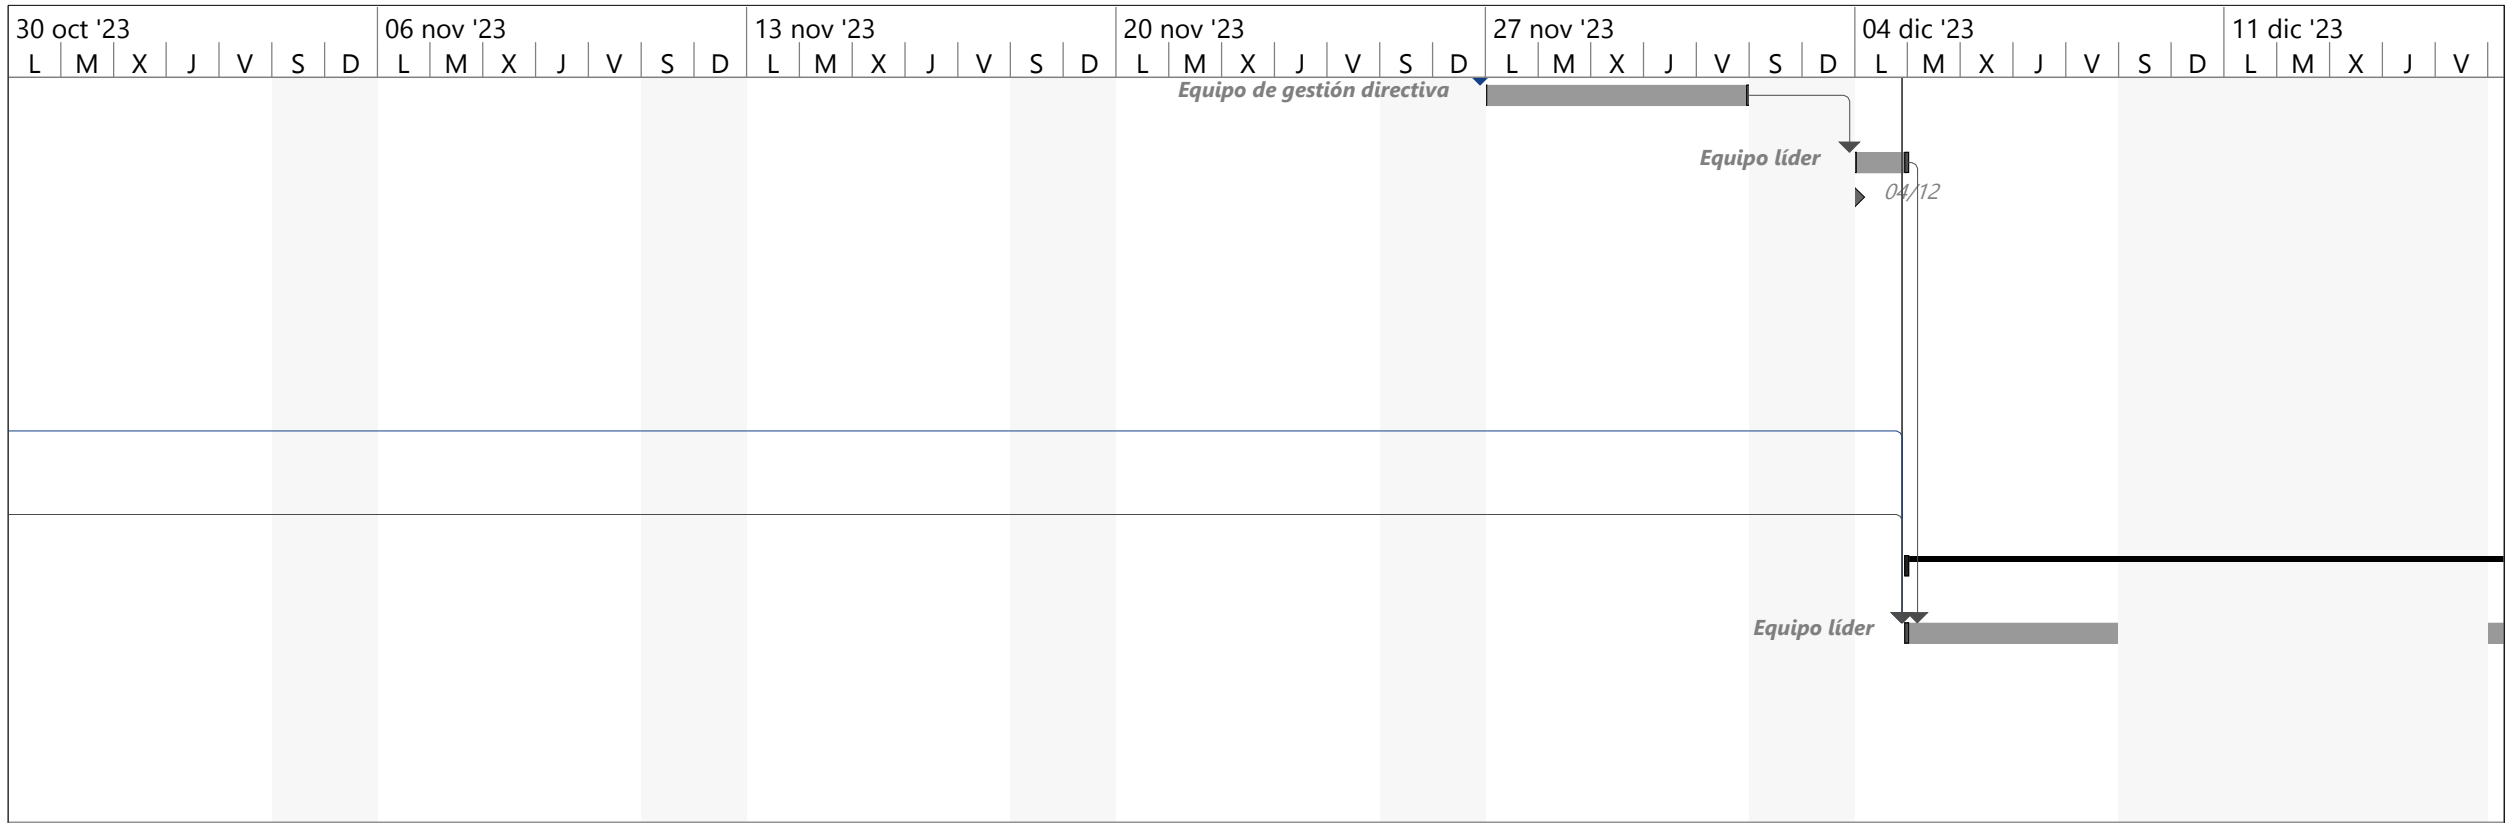

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

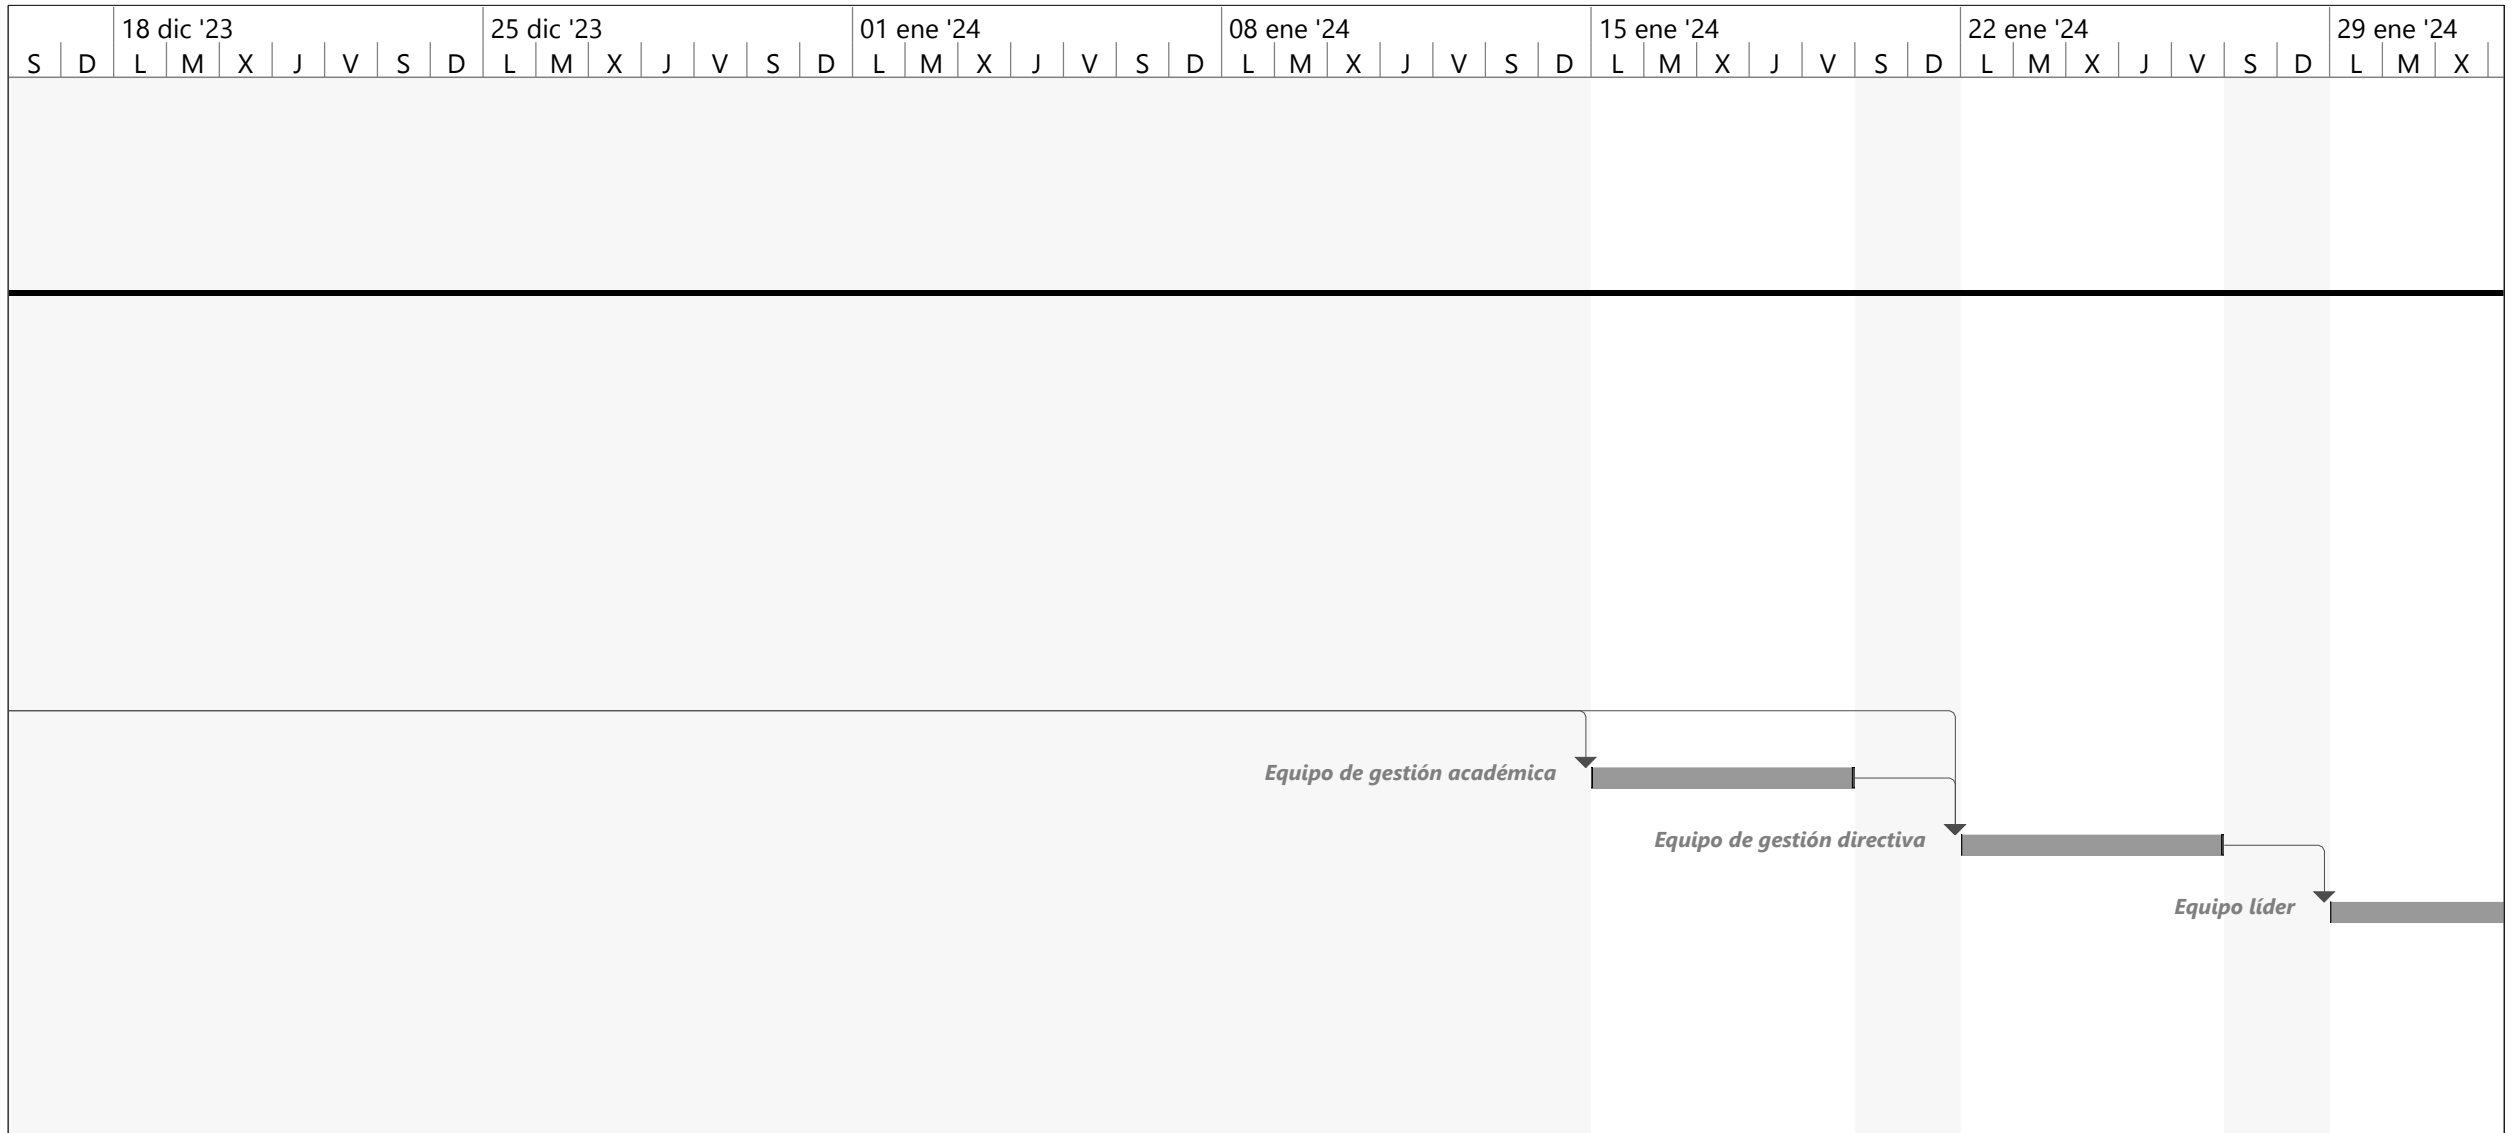


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

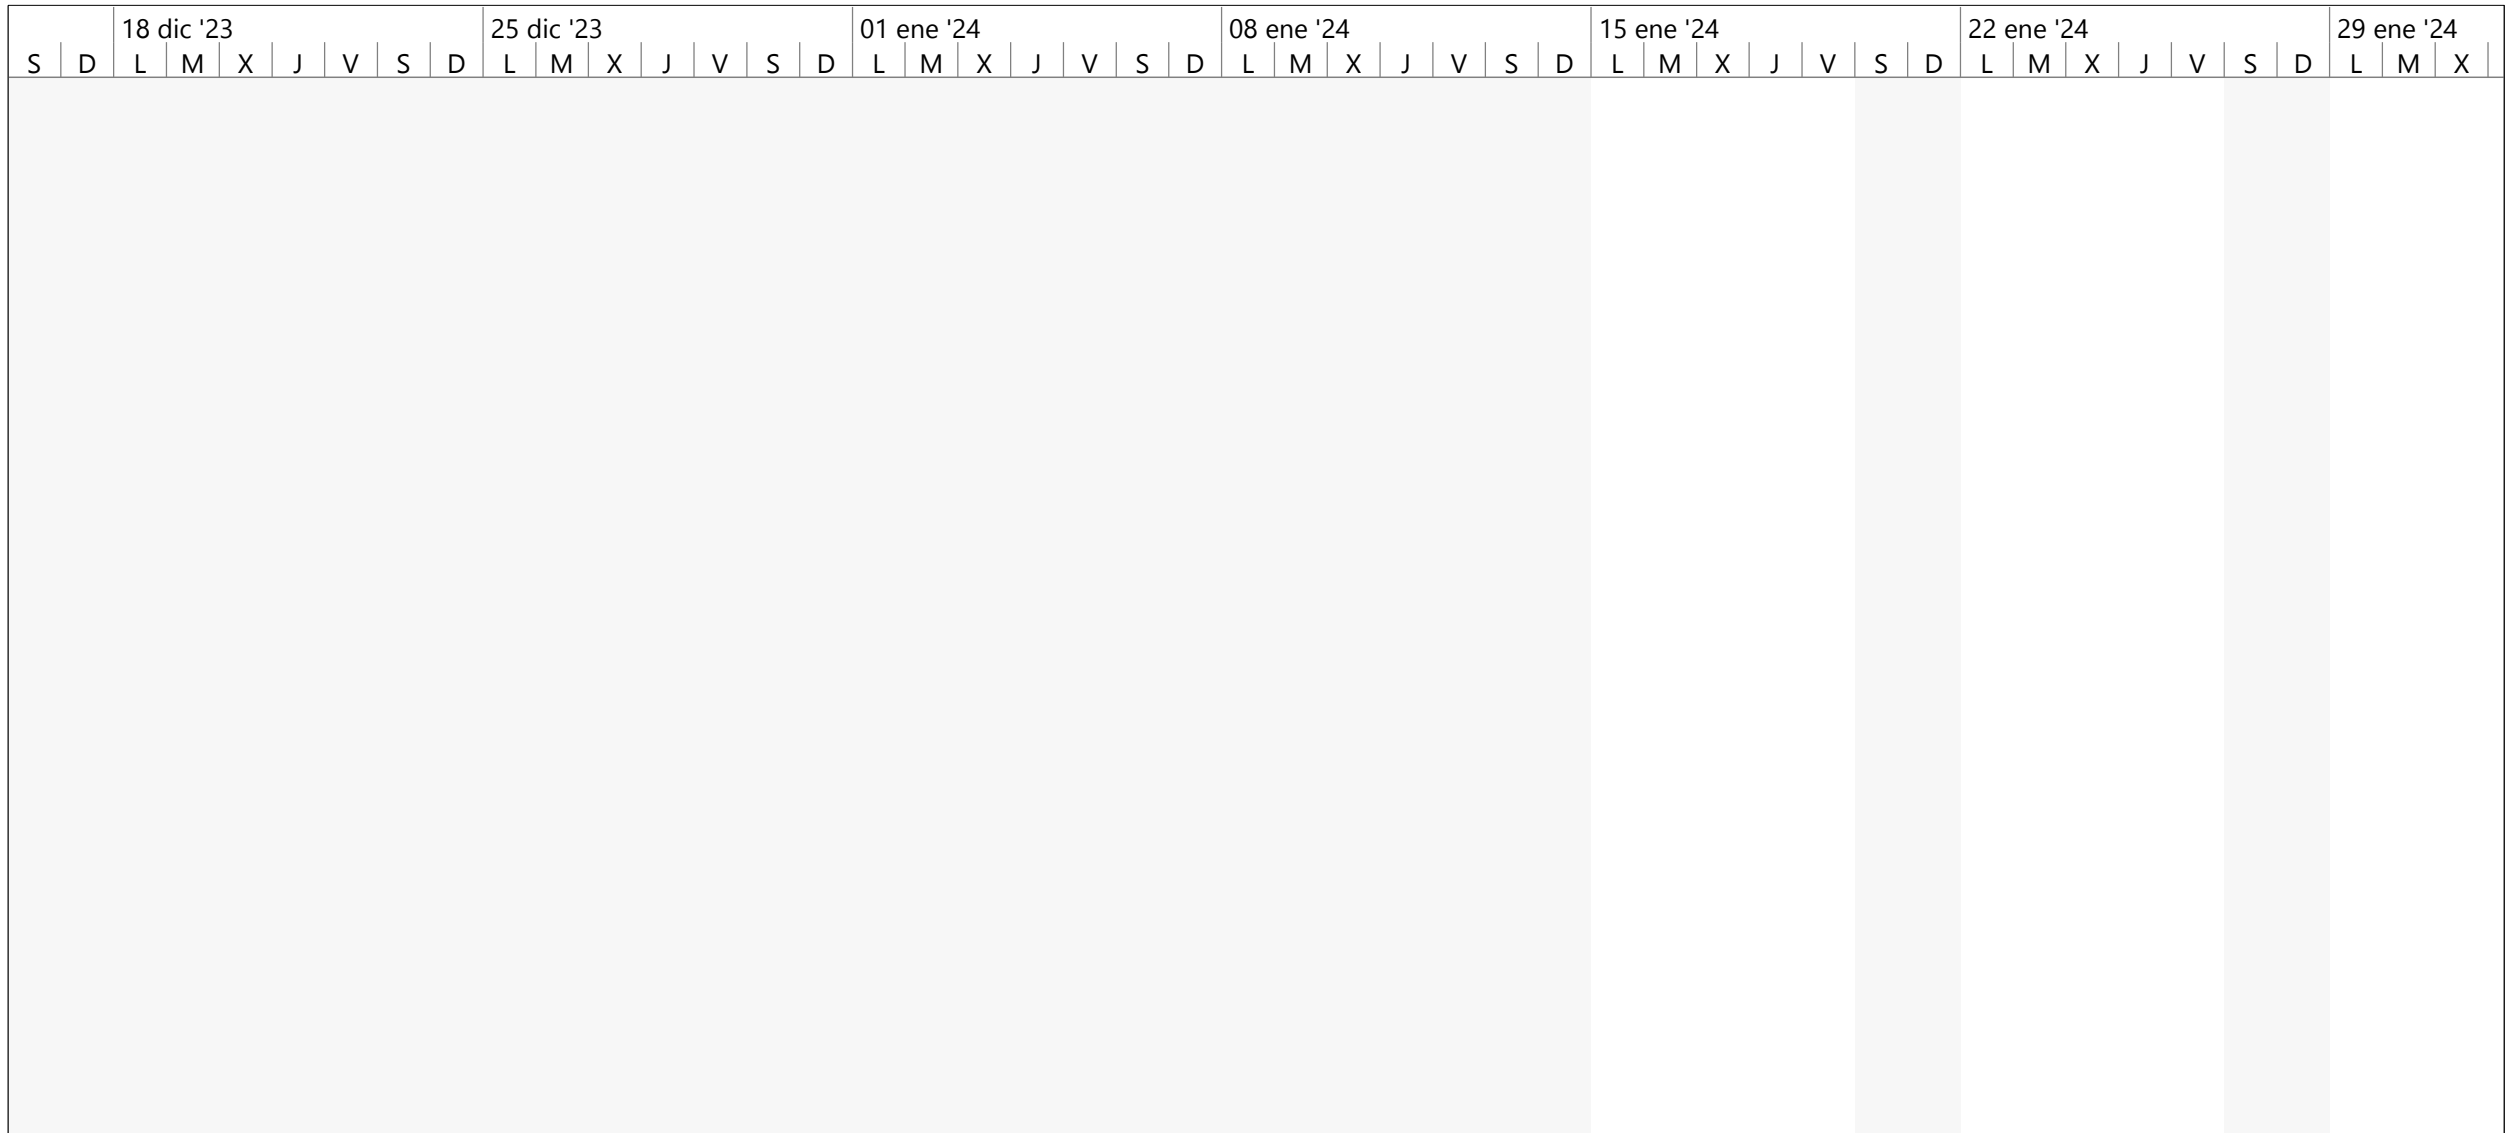


Proyecto: PROYECTO PEI Fecha: lun 27/03/23	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

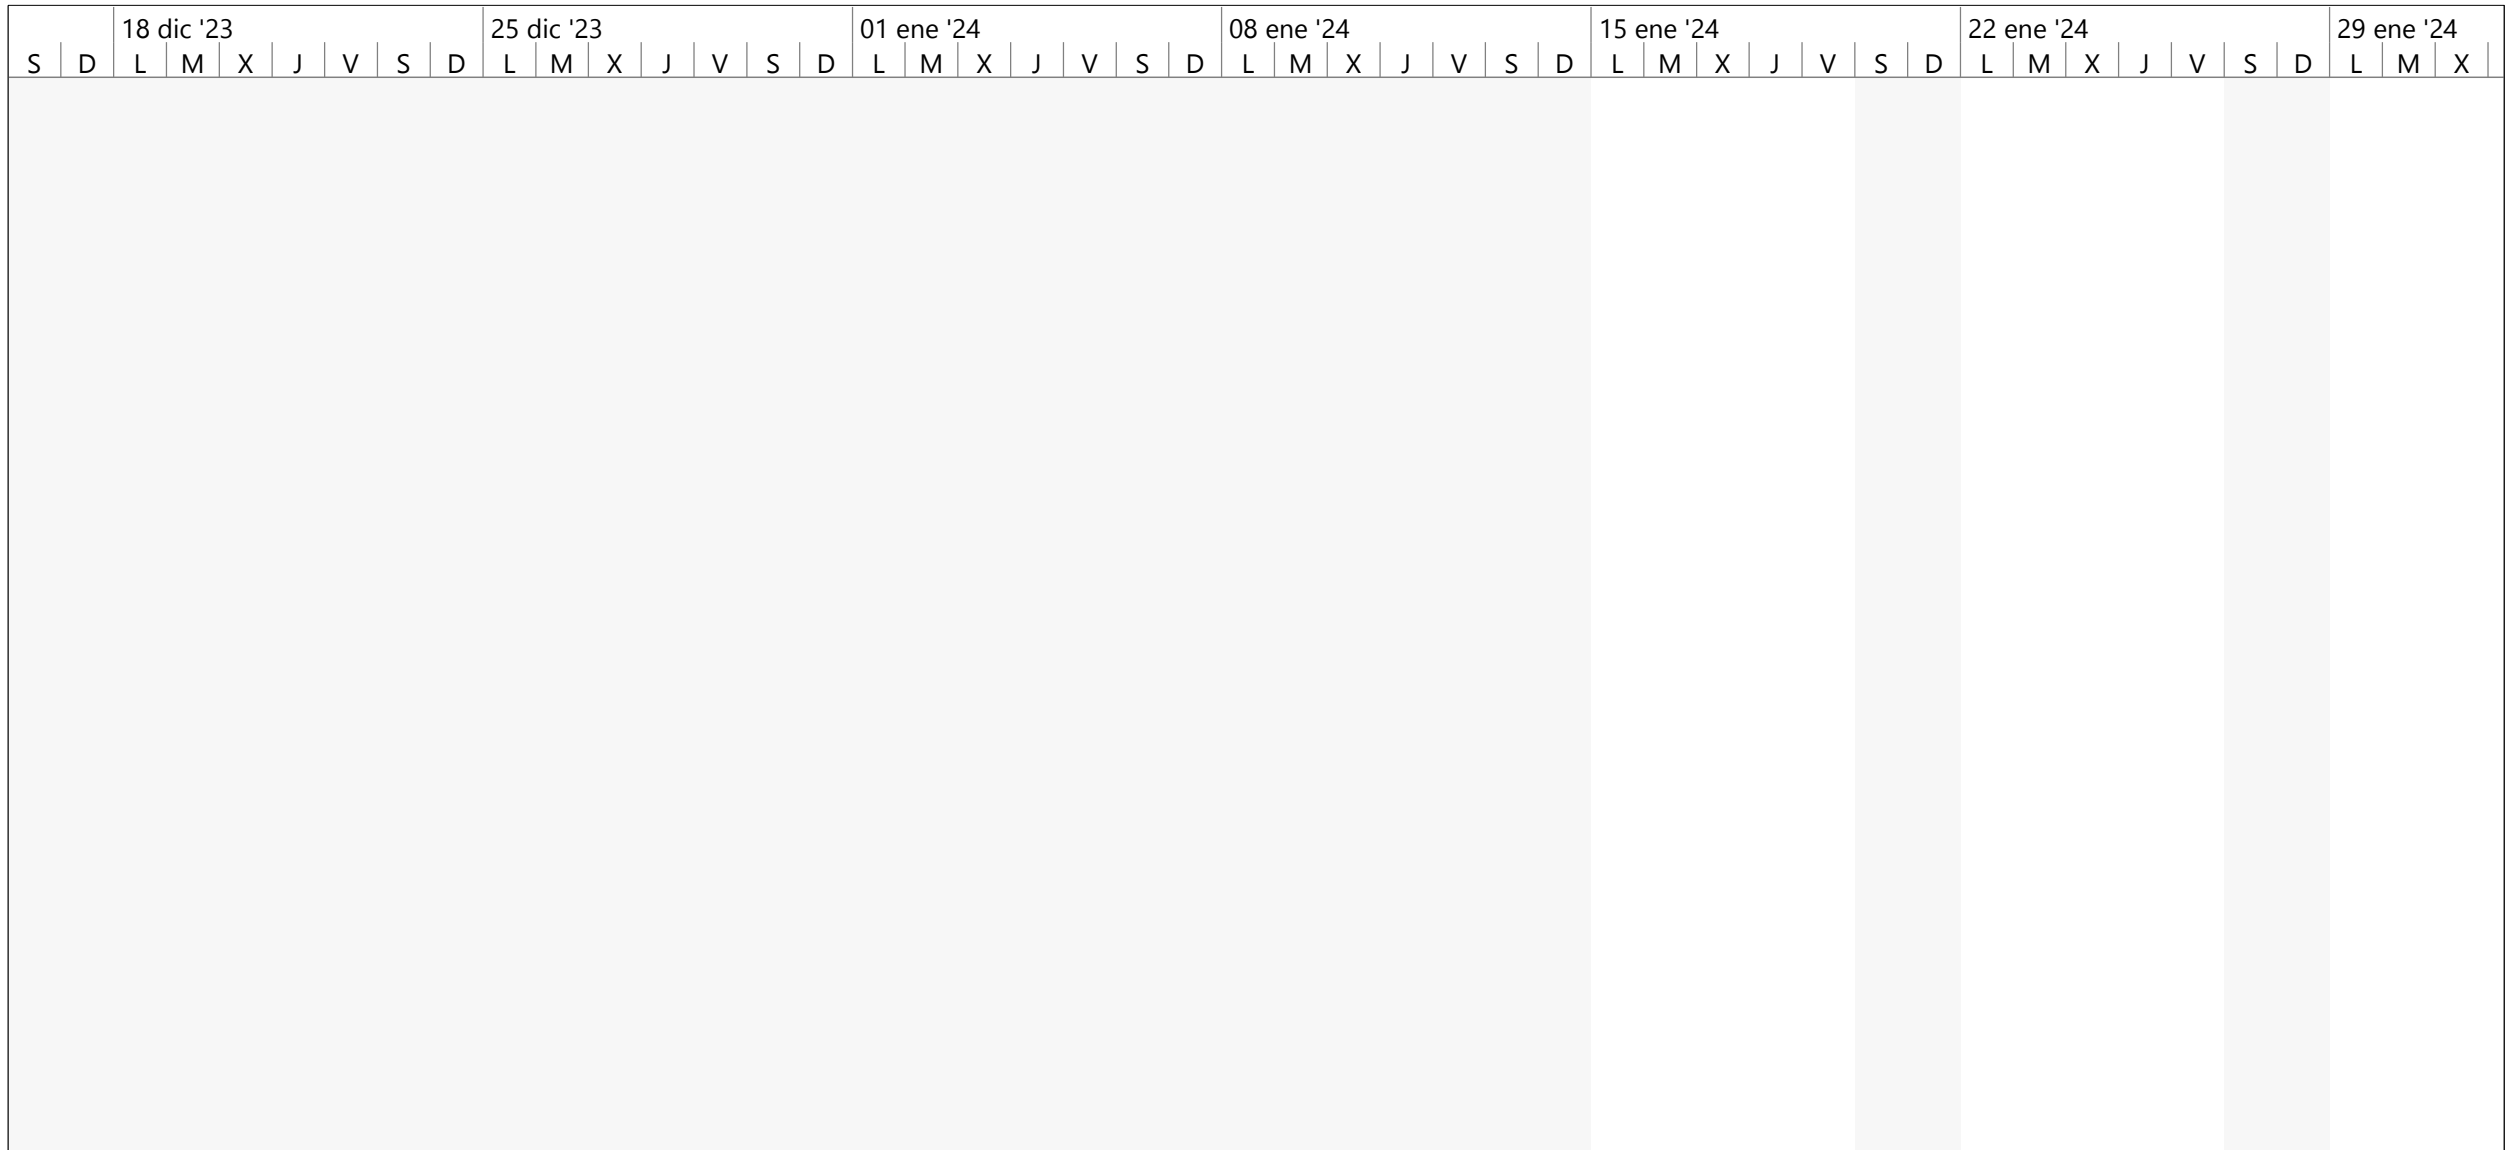


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

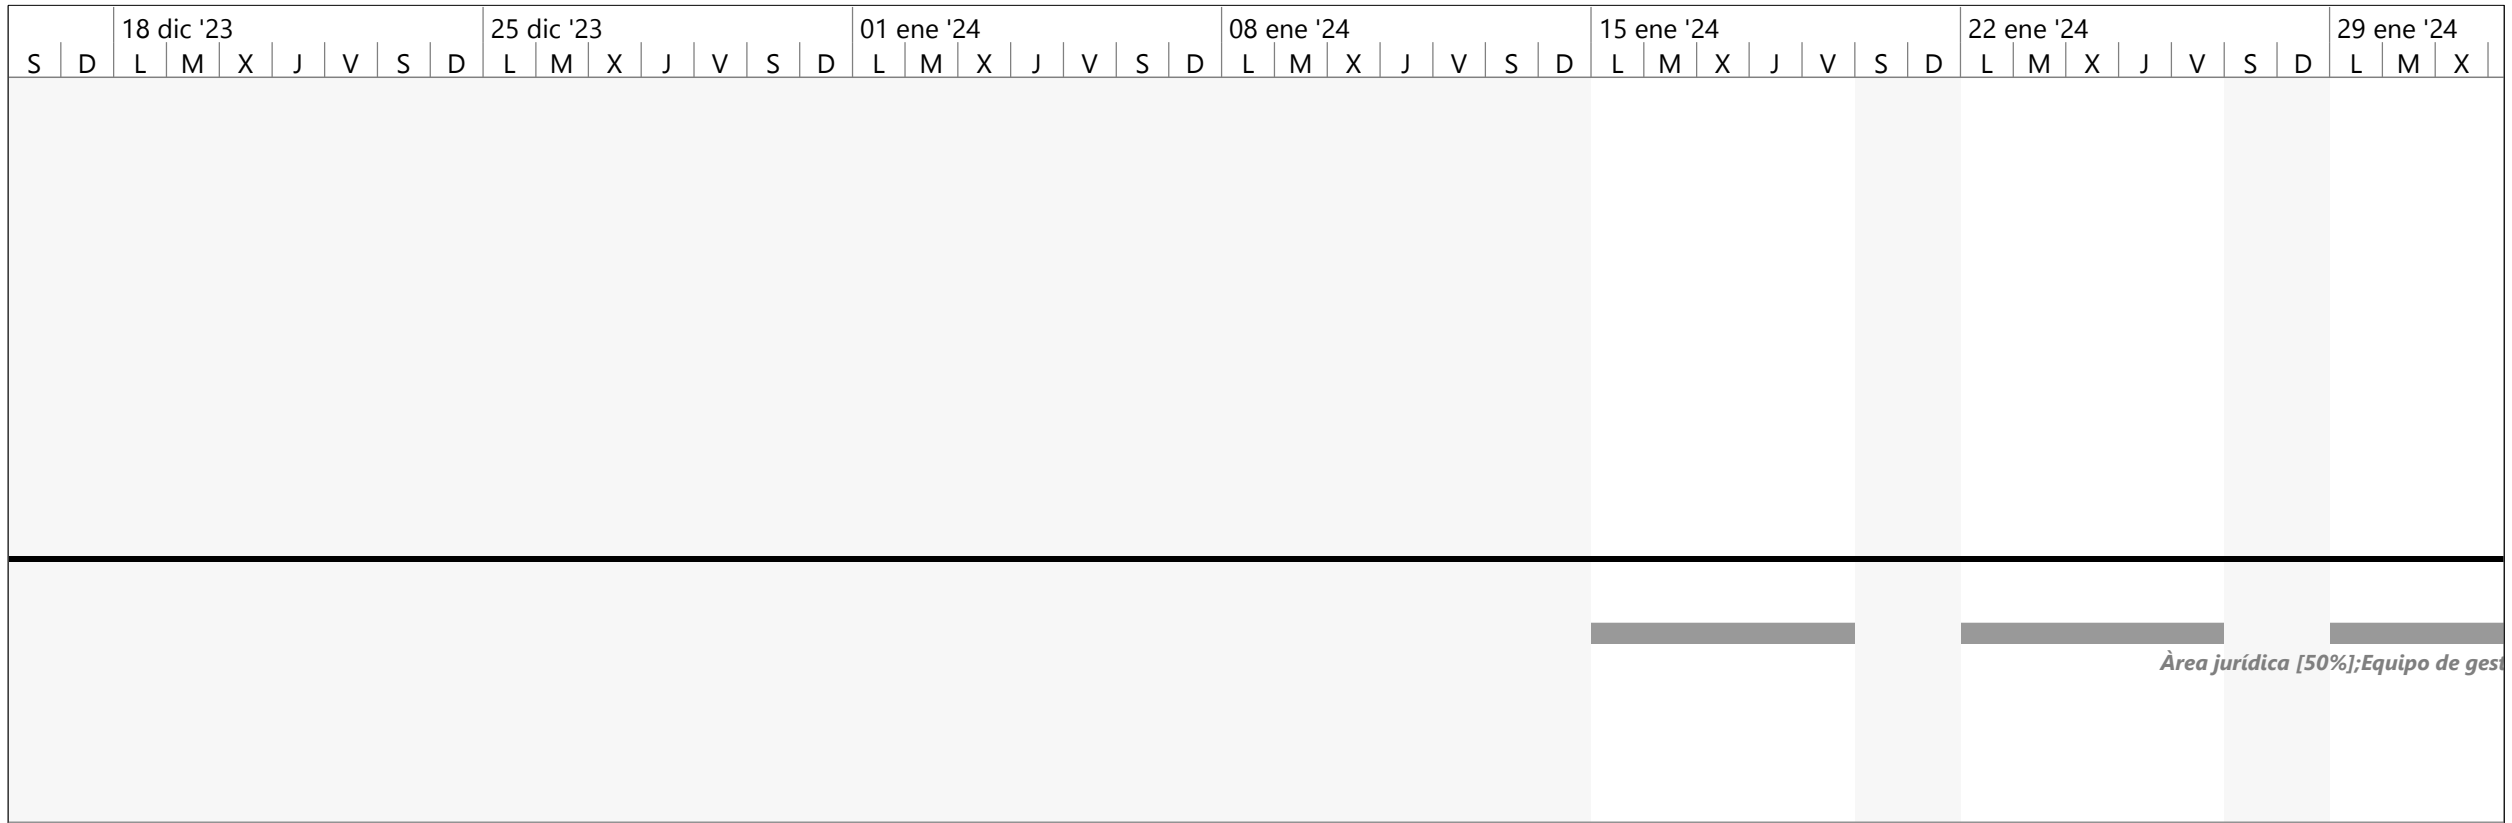


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

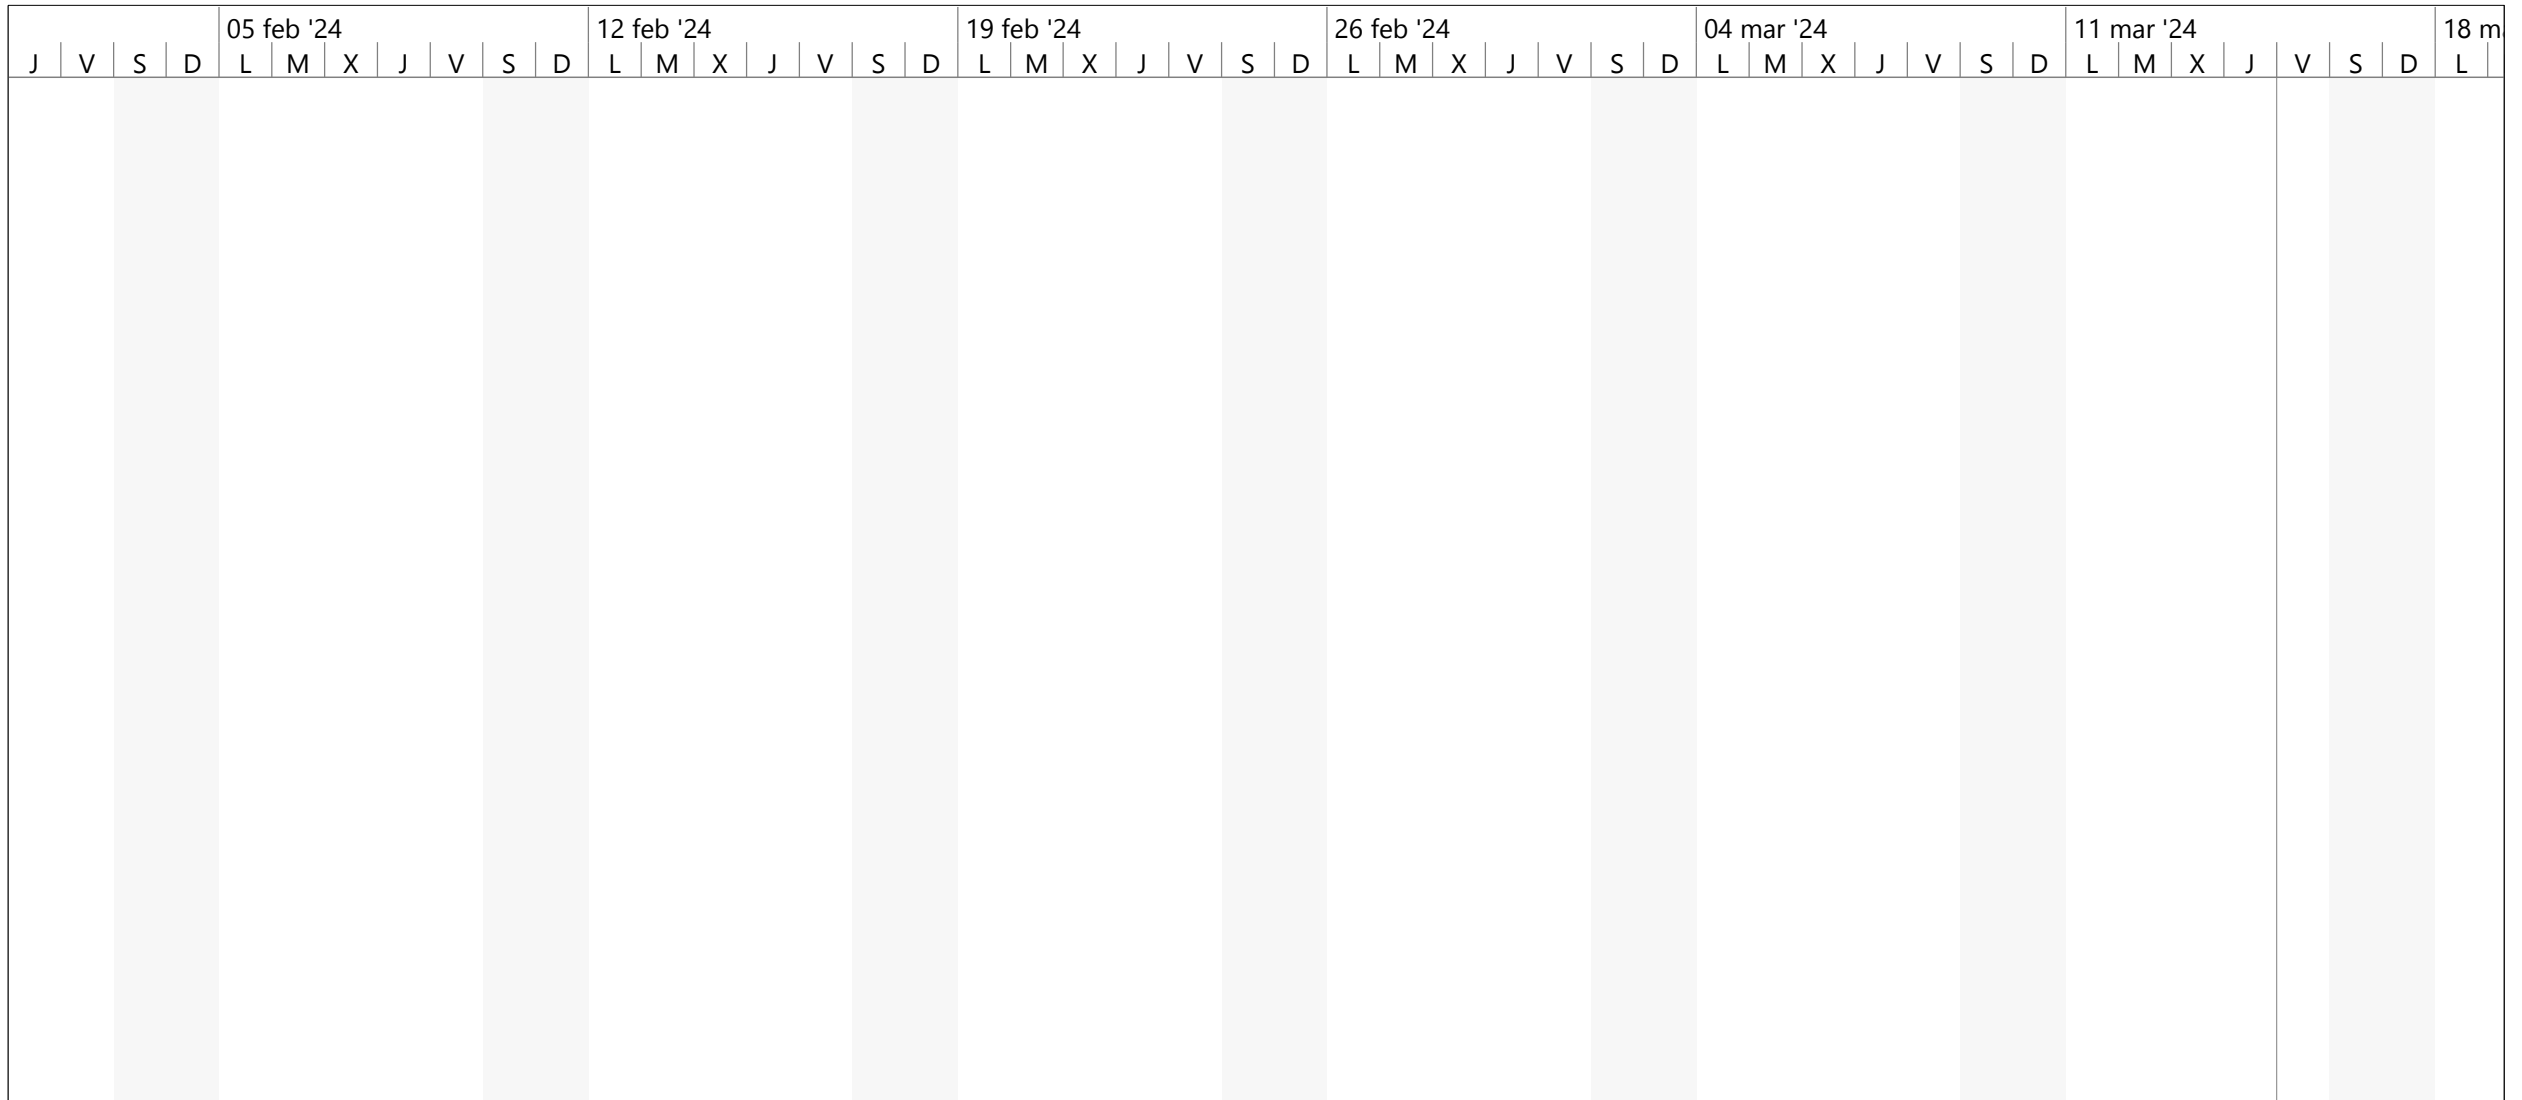


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

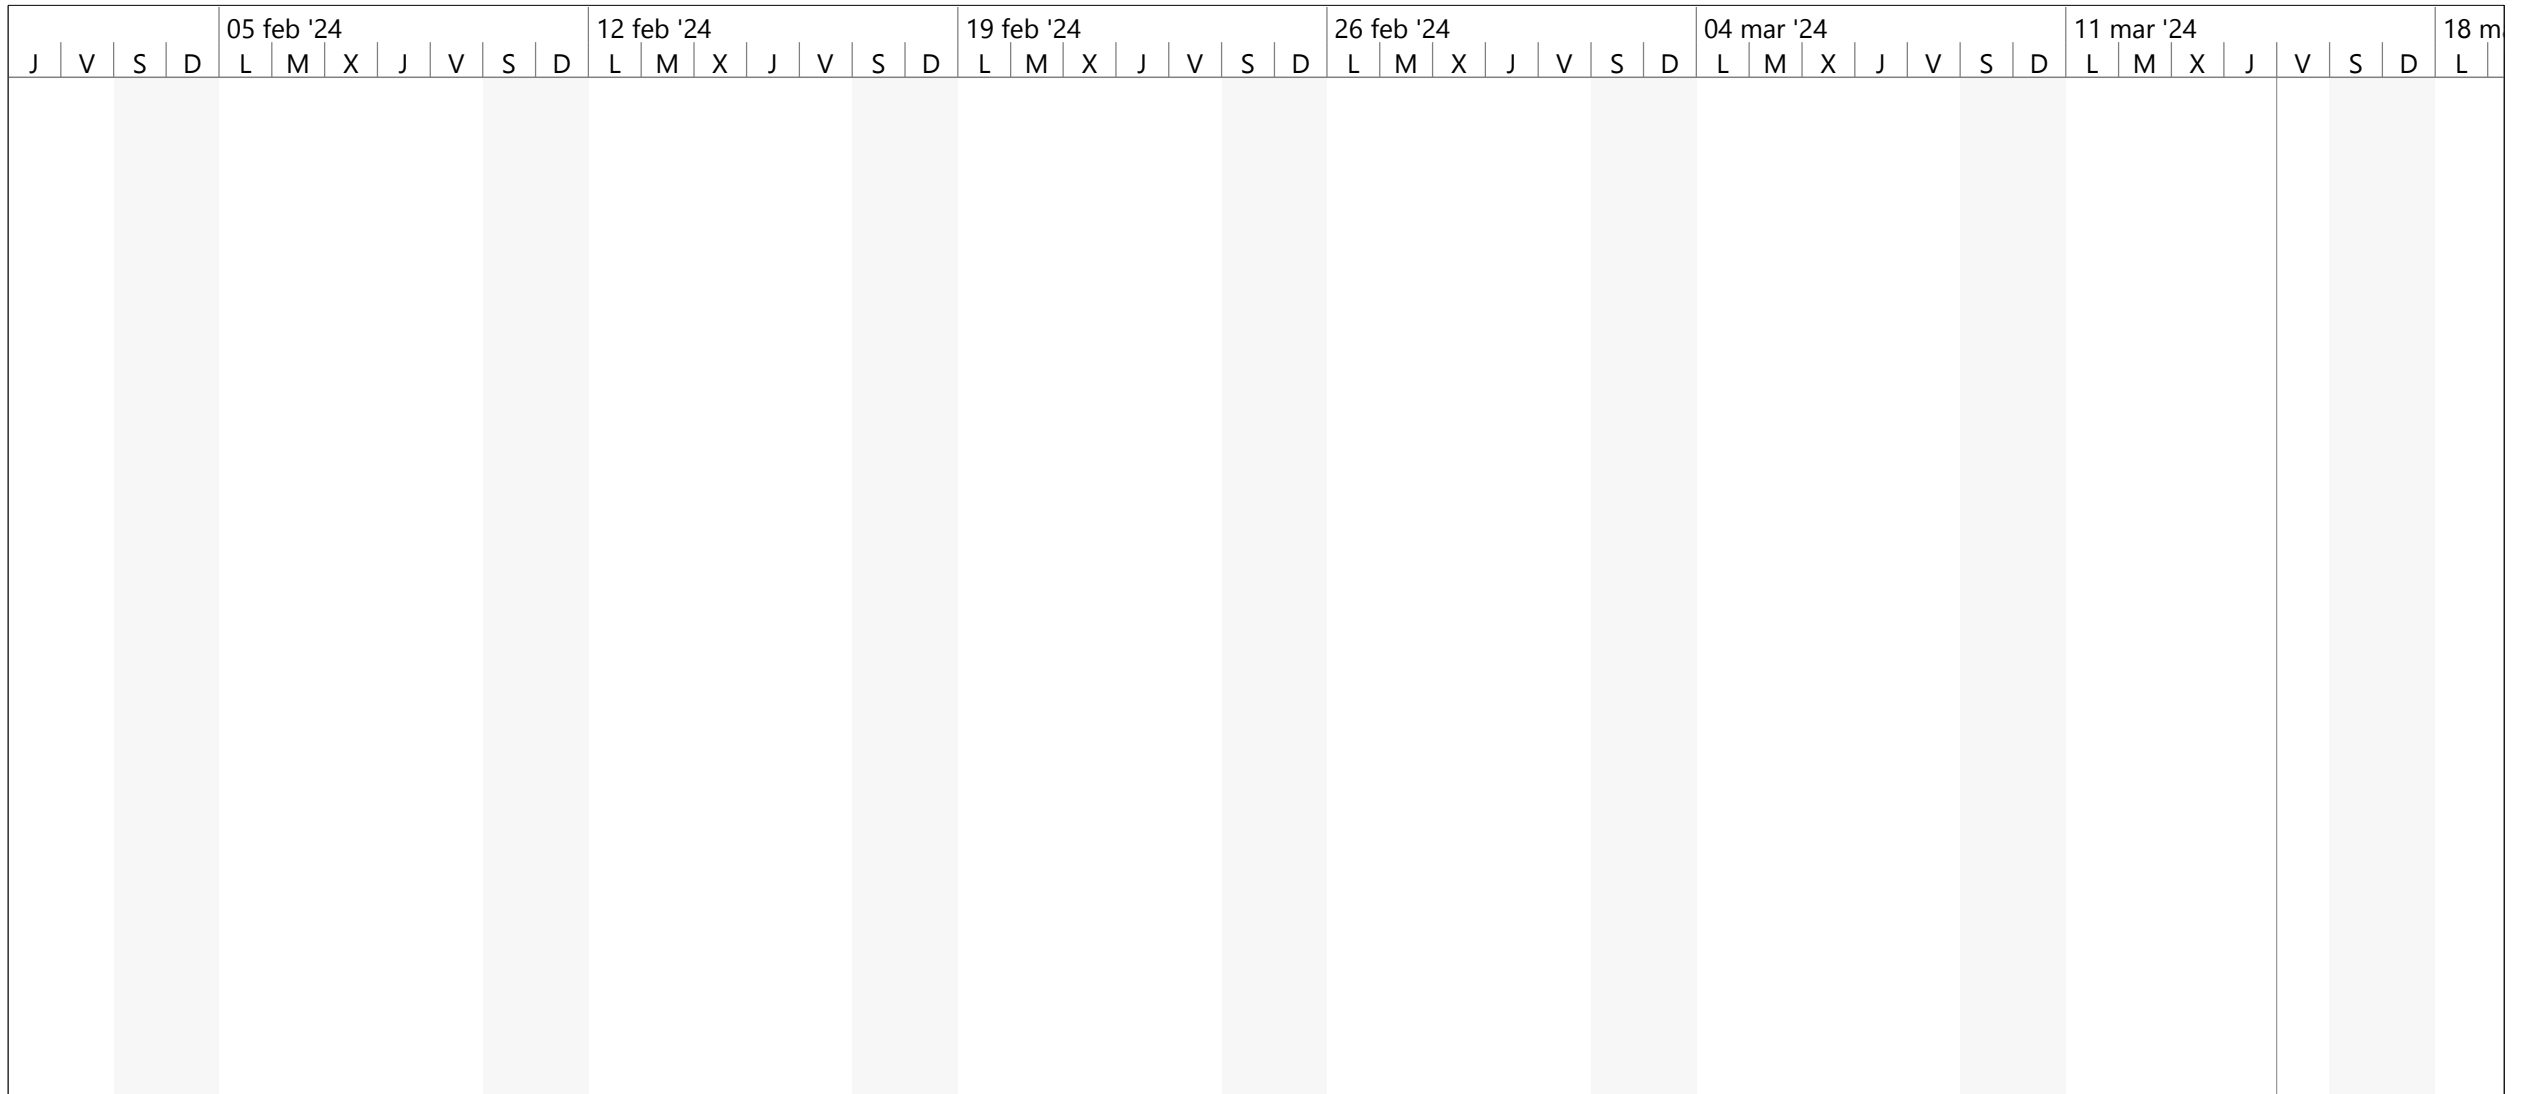


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

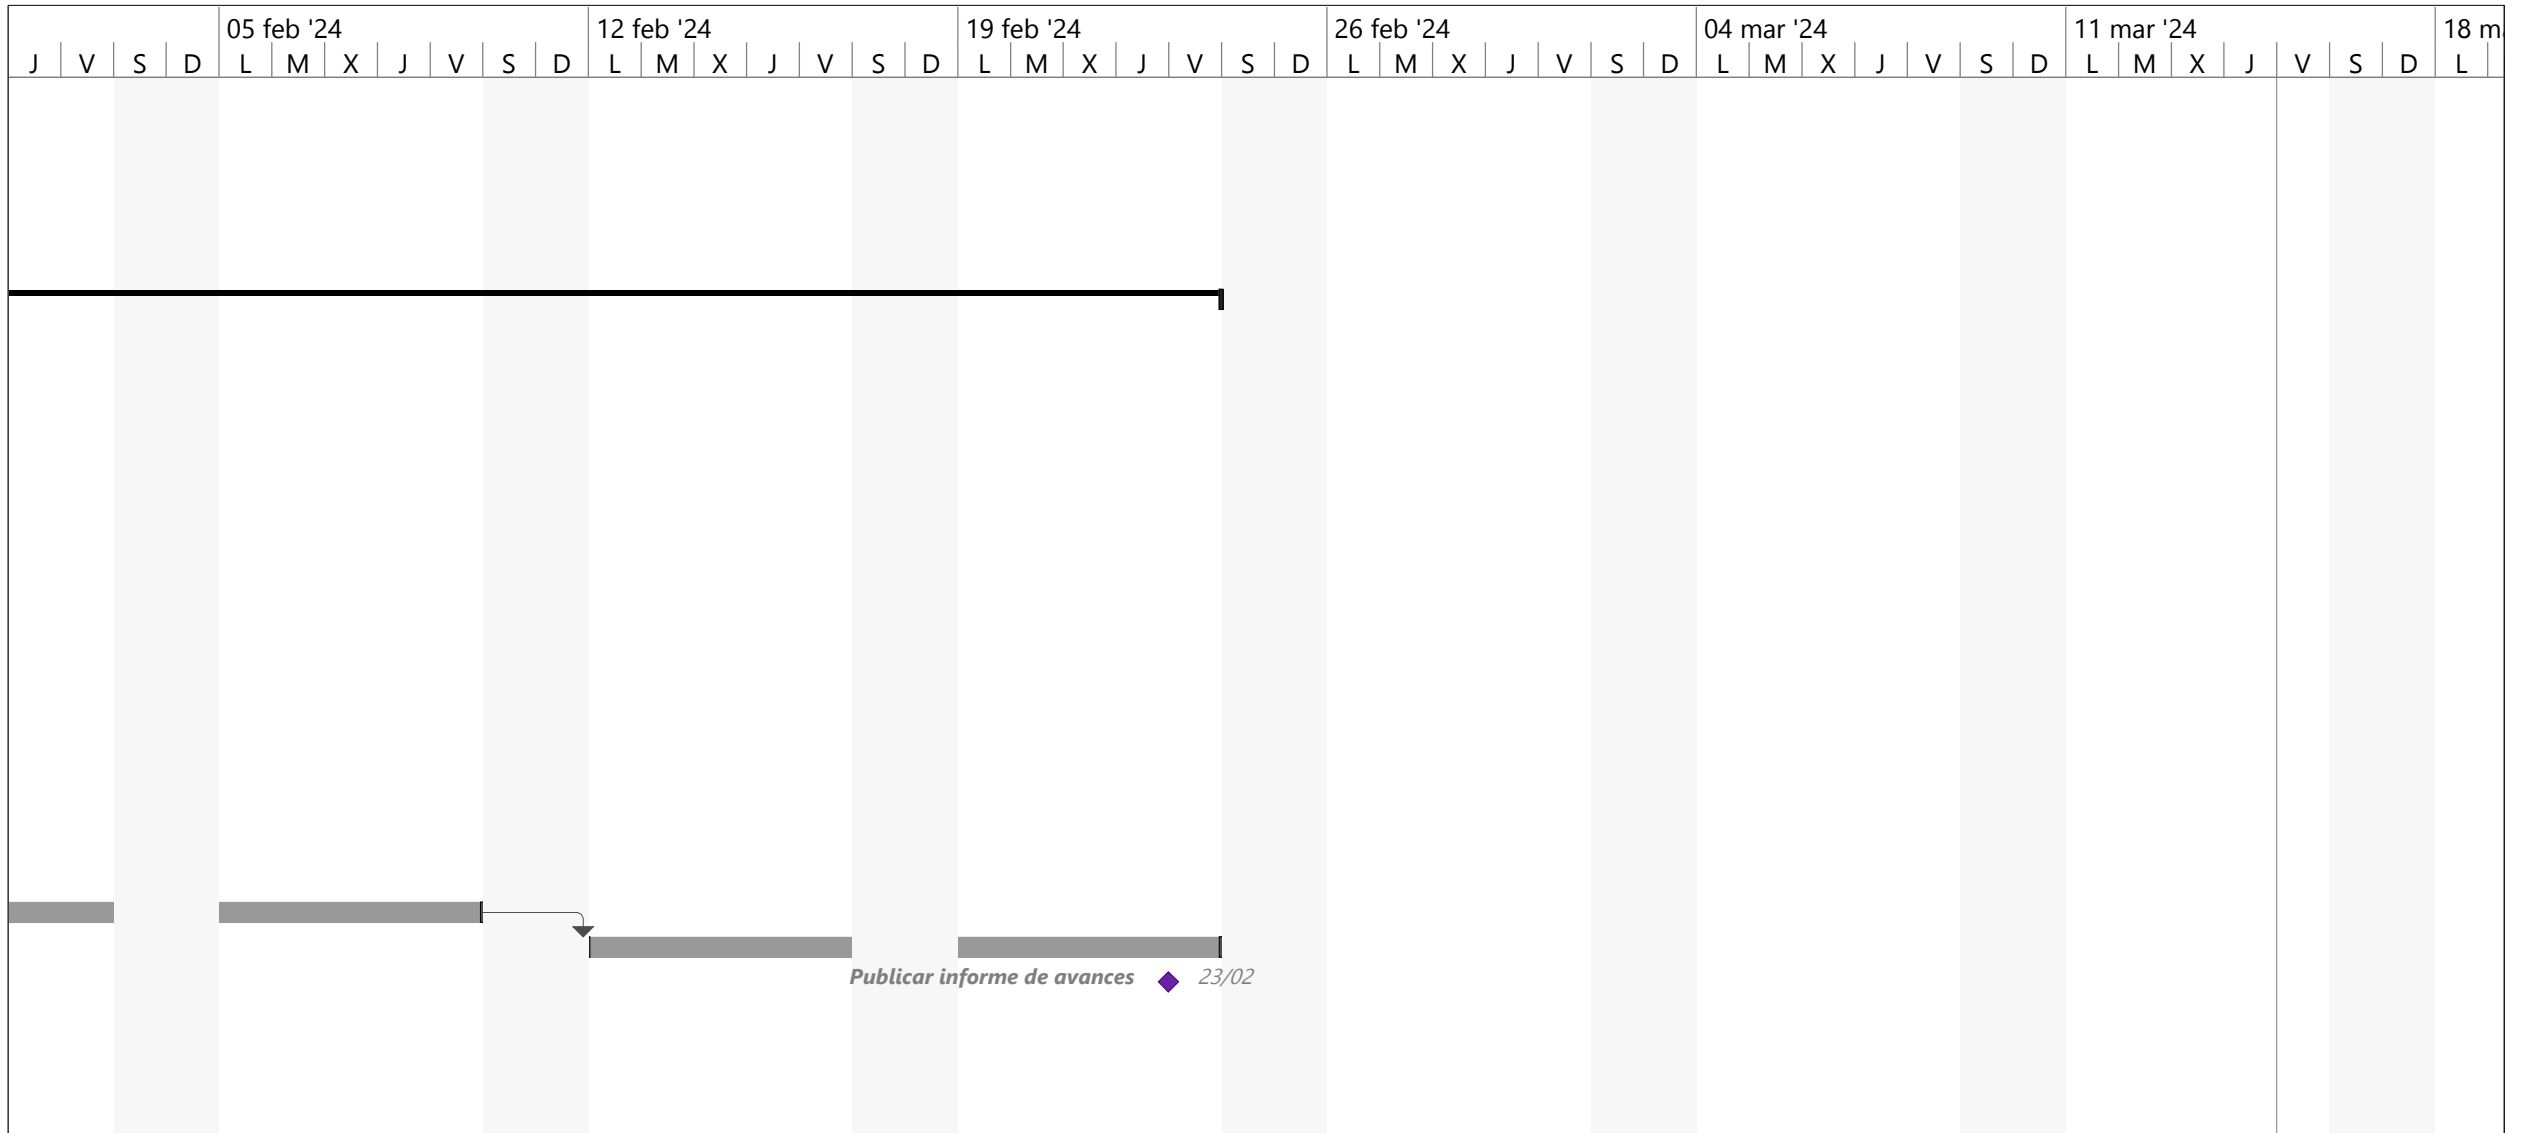

Proyecto: PROYECTO PEI Fecha: lun 27/03/23	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

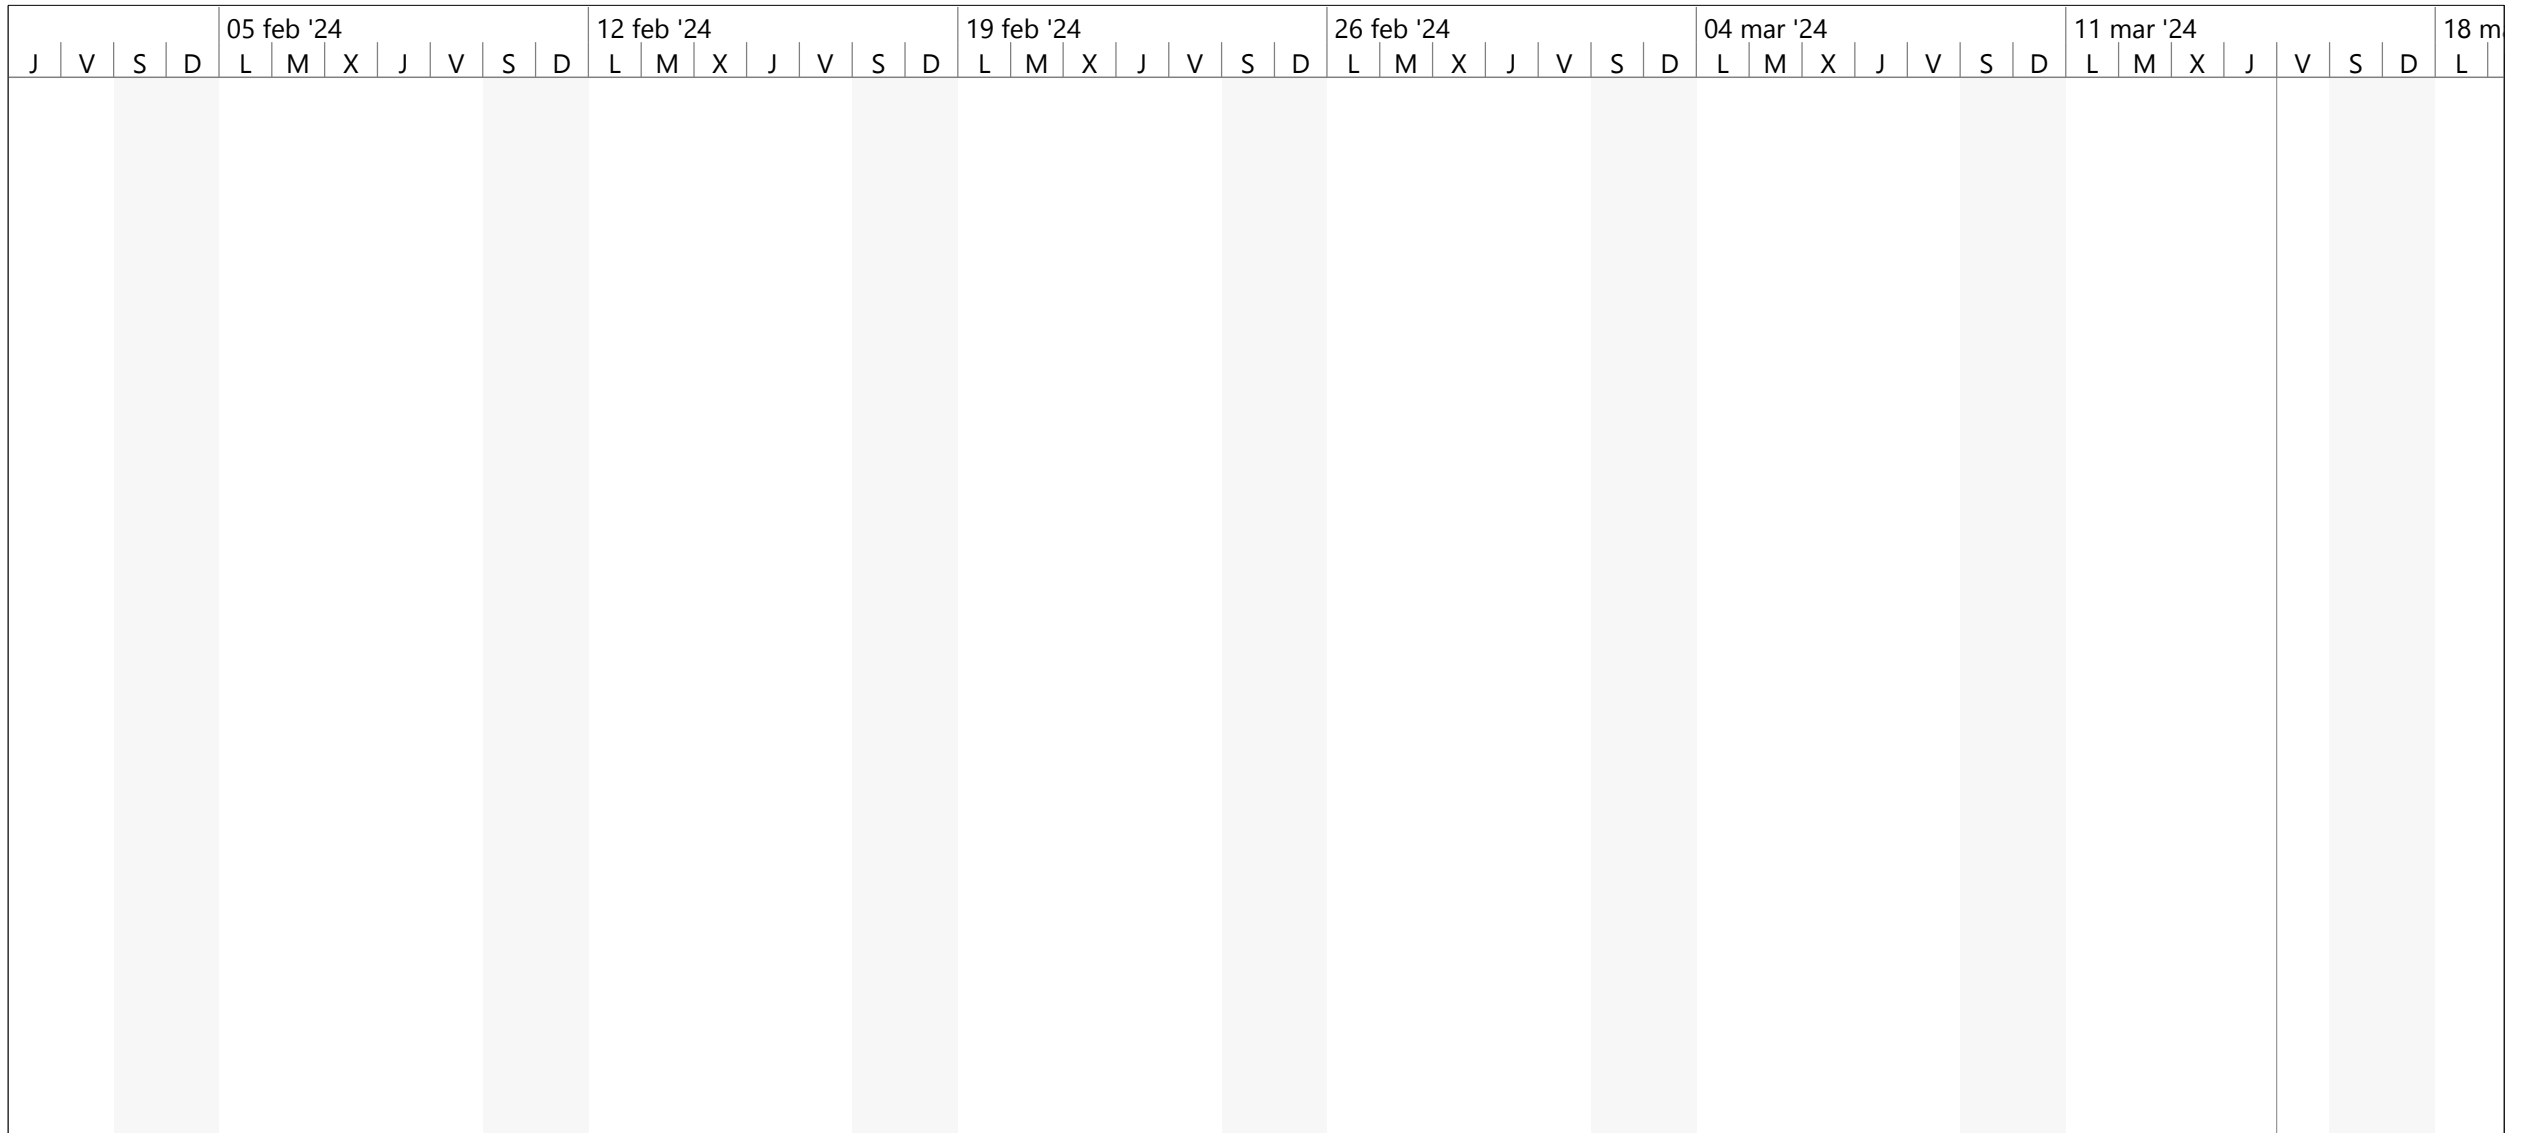


Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

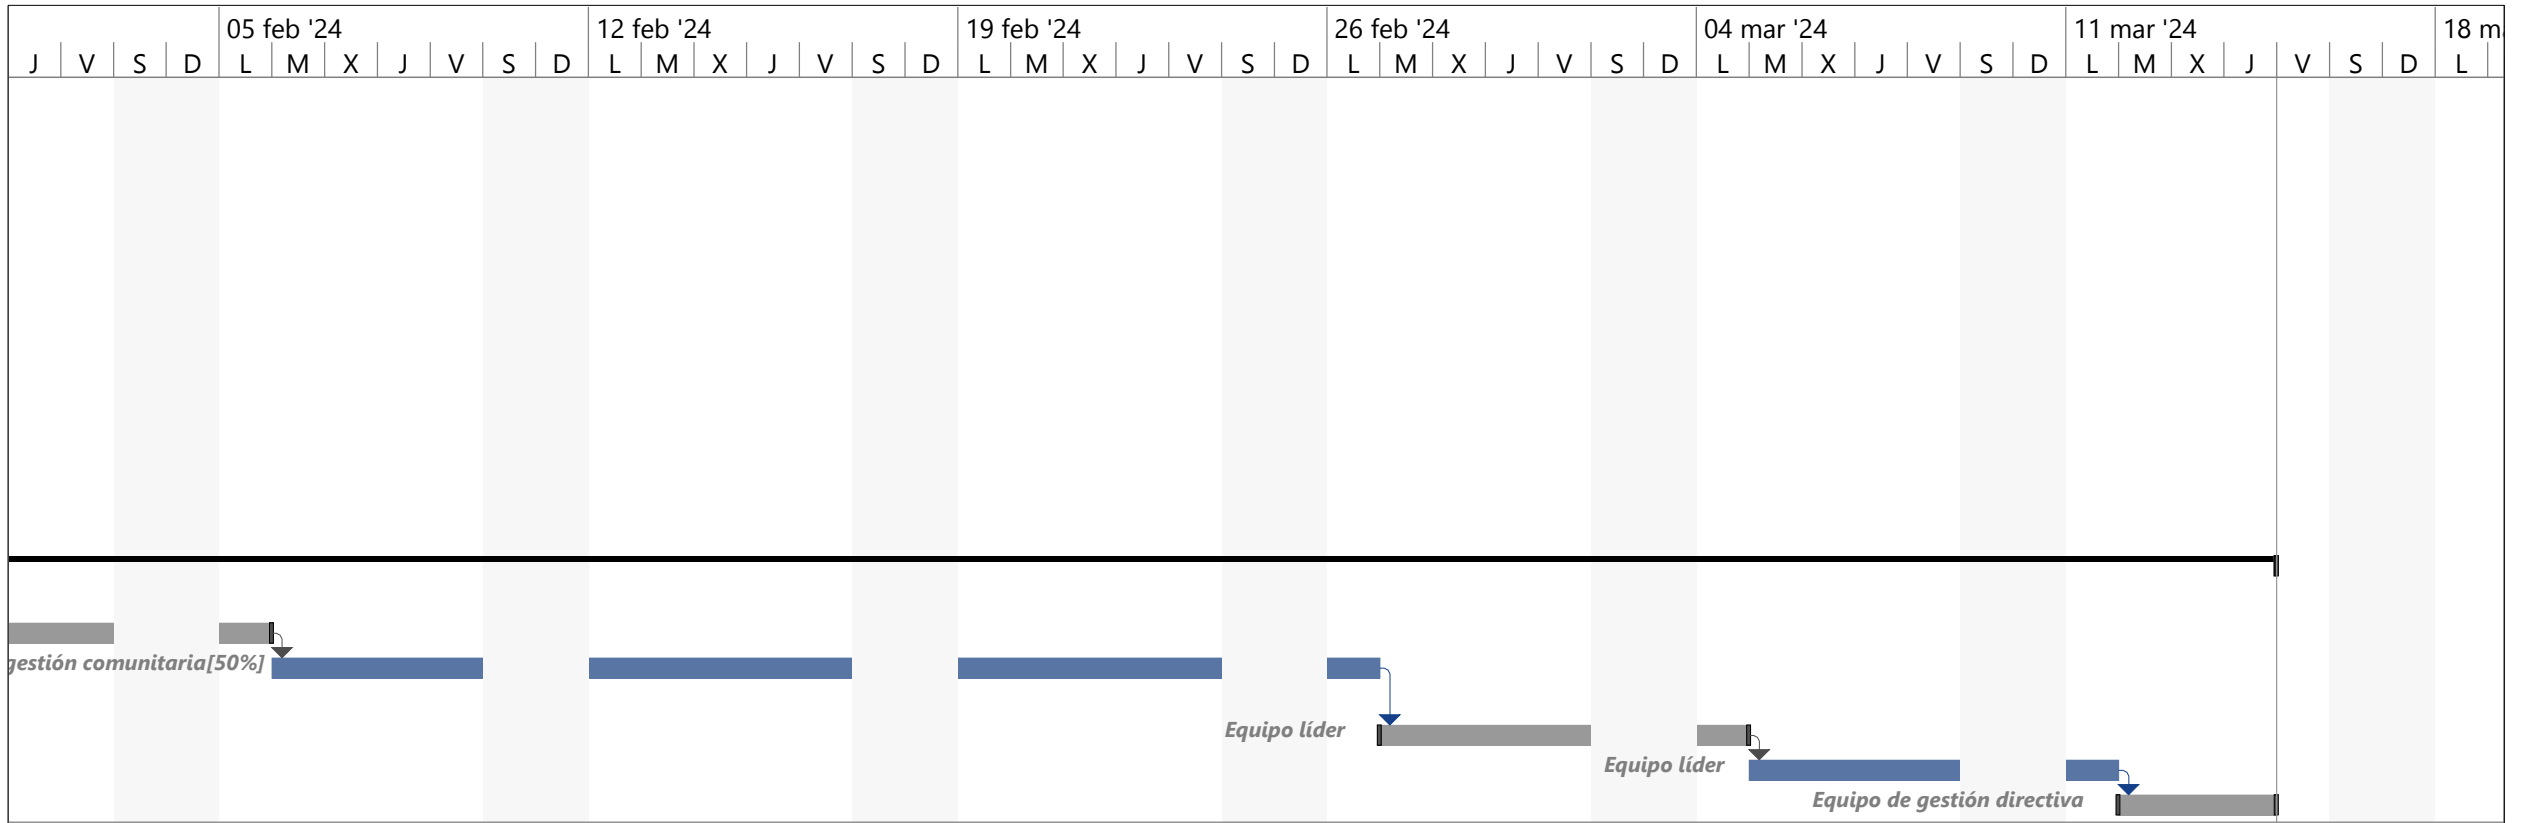

Proyecto: PROYECTO PEI
 Fecha: lun 27/03/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			
